

2025 고교학점제 학교 공간 구성 및 활용 안내서

과제책임자 이승호(한국교육개발원)

공동참여자 김평화(한국교육개발원)
신효선(한국교육개발원)
이예찬(한국교육개발원)
정윤정(한국교육개발원)

협력관 신진걸(교육부)

목차

I 고교학점제 학교 공간 조성 사업 1

1. 사업 개요 2

가. 사업 개념 및 필요성 2

나. 사업 목적 3

다. 학교 공간 조성의 교육적 효과 4

1) 학습 공간 및 지원 공간의 교육적 효과 4

2) 공용 공간의 교육적 효과 4

3) 학교 공간 질 제고의 교육적 효과 4

2. 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 방향 5

가. 학점제형 공간 조성 추진 방향 5

나. 학점제형 공간 조성 및 활용 원리 6

다. 학점제형 공간 조성 구현상 8

II 고교학점제 학교 공간 조성 사업 담당자의 시기별 역할 11

III 학점제형 공간 조성의 단계별 운영 가이드 15

1. 공간 조성 기획 16

가. 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 이해 16

1) 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 단계 16

2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 시기별 추진 내용 16

나. 고교학점제 학교 공간 조성 사업 신청 19

1) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 대상교 선정 계획 이해 19

2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 도입학교 신청서 제출 19

3) 자가진단도구 이해 및 활용 방안 20

4) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 적정성 검토 24

다. 공간 조성을 위한 기획 및 구성	25
1) 고교학점제 대비 학교 공간 조성 계획	25
2) 단위 학교 공간 조성 준비 과정	26
3) 학점제형 공간 조성 퍼실리테이터 위촉 및 운영	29
2. 자료 조사 및 방향 설정	33
가. 연수	33
1) 연수의 필요성	33
2) 연수 운영 전 준비 사항	34
3) 프로세스 기반 연수 운영	36
나. 사용자 협의회	38
1) 학교 공간 조성 사업의 목적 및 학교 시설과 구조를 고려한 방향성 설정	38
2) 사용자 협의회를 통해 학교 공간 조성의 출발점 찾기	39
3) 사용자 협의회를 통해 학교 공간 조성안 마련하기 : 공간 재구성을 위한 스케치 등을 통해 다양한 아이디어 도출	41
4) 사용자 협의회 기반 학교 공간 조성 사례	43
다. 인사이트 투어(insight tour)	44
1) 목적과 기대 효과	44
2) 시기와 대상 장소	45
3) 참여 규모	48
4) 인사이트 투어를 위한 질문 리스트 예시	48
5) 자주 묻는 질문	50
6) 제언	50
3. 구체화	52
가. 사용자 참여 설계(교육 분야)	52
1) 교육 분야에서 사용자 참여 설계의 의미	52
2) 단계별 사용자 참여 설계 및 주요 내용	52
3) 사용자 참여 설계의 시각적 구체화	56
나. 사용자 참여 설계(건축 분야)	58
1) 건축 분야에서 사용자 참여 설계의 의미	58
2) 단계별 사용자 참여 설계의 주요 내용	61
3) 성공적인 사용자 참여 설계를 위한 유의 사항	63

목차

다. 컨설팅	64
1) 컨설팅 개요	64
2) 중앙컨설팅 절차	65
3) 컨설팅 사례	68
4) 컨설팅 기대 효과	72
라. 기본설계	74
1) 일반적인 건축 설계 과정의 이해	74
2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 설계 과정	75
마. 구체화 시 유의 사항	86
1) 학점제형 학교 공간 설계 및 시공 주안점	86
2) 사업 설계 시 참고 법령	87
3) 현장 사진	88
4. 건축 설계 및 시공	89
가. 설계 용역 및 시공	89
1) 퍼실리테이터, 설계 용역 및 시공 계약의 발주 방식 비교	89
2) 수의 계약 범위	89
3) 설계자 계약	89
4) 실시설계 용역 계약	90
5) 실시설계 검토 및 완료	91
6) 공사 업체 계약(10월~11월)	91
7) 감리 용역 계약(10월~11월)	92
8) 계약 방법 결정 방법	92
9) 시설 공사 추진 시 가격 관련 용어의 개념	94
나. 기자재 구입	95
1) 기자재 구입 단계별 세부 내용	95
2) 기자재 구입 시 참고 사항	97
다. 시공 단계	100
1) 공사 시작 전 유의 사항	101
2) 공사 진행 시 유의 사항	102
3) 준공 후 유의 사항	104
4) 시공 관련 학교 담당자 설문조사 내용	106

5. 학점제형 공간의 활용 107

가. 학습 공간의 유연성	107
1) 첨단 미래 교실 및 블렌디드 러닝 교실	107
2) 미술실 및 다목적 교실	108
나. 지원 공간의 복합성	110
1) 도서실	110
2) 학습 카페 및 상담실	111
다. 공용 공간의 활용성	112
1) 홈페이지 및 복합문화공간	112
2) 현관, 로비, 복도	113
라. 동선의 효율화	115
1) 물리적 동선의 효율화	115
2) 교육과정적 동선의 효율화	116

참고 문헌 117

목차

부록	119
----------	-----

1. 고교학점제 학교 공간 조성 현황 120

가. 2019년도 학교 공간 조성 학교 명단	120
나. 2020년도 학교 공간 조성 학교 명단	121
다. 2021년도 학교 공간 조성 학교 명단	122
라. 2022년도 학교 공간 조성 학교 명단	124
마. 2023년도 학교 공간 조성 학교 명단	126
바. 2024년도 학교 공간 조성 학교 명단	129

2. 학교 공간 유형별 활용 사례 132

가. 학교 현황	133
나. 학습 공간	134
1) 융합교과실	134
2) 소인수 강의실	143
3) 대형 강의실	146
(1) 일반형 교실	146
(2) 계단식 교실	150
(3) 가변형 교실	154
4) 실험실·실습실	159
5) 디지털 교실·온라인 학습실	165
다. 지원 공간	180
1) 문화예술·체육 활동실	180
2) 소규모 활동 공간	185
3) 다목적실	188
4) 자기 주도적 학습 공간·학습카페	192
5) 강당	199

6) 도서관·복합문화공간	201
(1) 커뮤니티형	201
(2) 강연 및 행사형	212
(3) 교육 및 학습형	217
라. 공용 공간	224
1) 복도·로비	224
2) 휴게공간	232
3) 자율활동·휴식 공간	251
4) 야외 공간	260
마. 기자재 활용 사례	266
3. 용어 해설	281
4. 자료 안내	284
가. 안내서	284
나. 학교 공간 조성 사진 자료 찾아가기	285

표 목차

〈표 1〉 고교학점제 학교 공간의 조성 및 활용 5가지 원리와 내용	7
〈표 2〉 고교학점제 학교 공간 사업 시기별 추진 내용	17
〈표 3〉 고교학점제 학교 공간 사업 도입학교 선정 절차	19
〈표 4〉 도입학교 및 증설 검토 신청 자료	20
〈표 5〉 시나리오별 공간 조성 방안	20
〈표 6〉 자가진단도구(일반고)	22
〈표 7〉 자가진단도구 엑셀 시트의 구성(일반고)	23
〈표 8〉 고교학점제 학교 공간 조성 사업 신청 적정성 검토 기준	24
〈표 9〉 학점제형 공간 구분	25
〈표 10〉 학점제형 공간 조성 및 활용 원리	25
〈표 11〉 학점제형 공간 조성 배치 계획	26
〈표 12〉 학교 공간 조성 TFT 운영	29
〈표 13〉 시기별 퍼실리테이터 추진 절차와 내용	31
〈표 14〉 연수 프로세스 단계별 추진 시기 및 대상(또는 내용) 계획 예시	38
〈표 15〉 인사이트 투어 질문 리스트(사업 완료 학교를 방문하는 경우)	49
〈표 16〉 단계별 사용자 참여 설계의 내용과 방법	55
〈표 17〉 교육 기획 단계에서의 사용자 참여 설계(그린스마트스쿨의 교육기획 프로세스 예시)	58
〈표 18〉 건축기획 단계에서의 사용자 참여 설계	59
〈표 19〉 사용자 참여 설계 프로세스	59
〈표 20〉 컨설팅 대상 학교 제출 서류	67
〈표 21〉 컨설팅 진행 시간표	67
〈표 22〉 교육 분야 컨설팅 사례	68
〈표 23〉 건축 분야 컨설팅 사례	70
〈표 24〉 기타 컨설팅 사례	72
〈표 25〉 사업 설계 시 참고 법령	87
〈표 26〉 발주 방식 비교	89
〈표 27〉 추정가격에 따른 2단계 입찰 공고 기간	91
〈표 28〉 동일구조물공사와 단일공사의 개념	92
〈표 29〉 시설 공사 추진 시 가격 관련 용어	94
〈표 30〉 비품 및 기자재의 구분과 세부 예시	97
〈표 31〉 주요 물품 내용 연한	98
〈표 32〉 공사 시작 전 유의 사항 요약	101
〈표 33〉 공사 진행 시 유의 사항 요약	102
〈표 34〉 준공 후 유의 사항 요약	104

그림 목차

[그림 1] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 운영 목적	3
[그림 2] 고교학점제 학교 공간 조성의 방향	5
[그림 3] 고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 원리	6
[그림 4] 고교학점제 학교 공간 조성 구현상	8
[그림 5] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 단계	16
[그림 6] 자가진단도구 다운로드 방법	21
[그림 7] 학교 공간 조성 TFT 구성 조직도	28
[그림 8] 퍼실리테이터 추진 절차	31
[그림 9] 학점제 기반 조성을 위한 역량 강화 연수 예시	33
[그림 10] 협력적 학교 문화 조성을 위한 연수 사례(광양백운고등학교)	34
[그림 11] 사용자 참여 주체 사전 조율 예시	35
[그림 12] 사용자 참여 주체 사전 조율을 통해 기획된 연수 프로세스 예시	35
[그림 13] 사용자 협의회 진행 프로세스	39
[그림 14] 사용자 협의회 운영 사례(대전여자고등학교)	40
[그림 15] 교사 TFT 협의회 모습(부산센텀여자고등학교)	41
[그림 16] 교사 TFT 협의회 사례(부산센텀여자고등학교)	41
[그림 17] 학생 TFT 협의회 모습(부산센텀여자고등학교)	42
[그림 18] 홈페이지 구상안용 학생 TFT 협의회 회의록 예시(부산센텀여자고등학교)	42
[그림 19] 사용자 협의회 사례(방산고등학교)	43
[그림 20] 인사이트 투어 시기별 목적	46
[그림 21] 사진자료 온라인 투어	47
[그림 22] 학교 공간 재구조화를 고려한 대상 공간 선정 사례(강릉제일고등학교)	53
[그림 23] 사용자 참여 설계의 추진 과정	54
[그림 24] 사용자 참여 설계 디자인 워크숍의 결과 반영 사례(강릉제일고등학교)	57
[그림 25] 기본계획 및 설계 단계 - 디자인 워크숍 운영 사례(충남서일고등학교)	60
[그림 26] 학생 참여 디자인 워크숍 사례(대전구봉고등학교)	61
[그림 27] 인사이트 투어 보고서 사례(경남 사천 용남중학교)	62
[그림 28] 온라인 인사이트 투어 사례(세종 해밀초등학교)	62
[그림 29] 학생 참여 디자인·명칭 공모전 사례(대전구봉고등학교)	63
[그림 30] 중앙컨설팅 절차	65
[그림 31] 건축 설계 과정	74
[그림 32] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 설계 과정	75
[그림 33] 공간 재구조화 사례(충남 건양고등학교 사례)	77
[그림 34] 1차 디자인 워크숍 사례(충남 건양고등학교 러닝센터 사례)	79

그림 목차

[그림 35] 2차 디자인 워크숍 사례(충남 건양고등학교 도서관 사례)	80
[그림 36] 실시설계 디자인 워크숍 2차(사용자 협의회)(충남 건양고등학교 도서관 사례)	82
[그림 37] 실시설계 평면도/천정도(충남 건양고등학교 도서관 사례)	83
[그림 38] 실시설계 입면도/제작가구(충남 건양고등학교 도서관 사례)	84
[그림 39] 마감 재료 샘플북 사례	85
[그림 40] 시공 유의 사항 현장 사진	88
[그림 41] 국·공립학교 실시설계 용역 계약 과정	90
[그림 42] 사립학교 실시설계 용역 계약 과정	90
[그림 43] 실시설계 검토 및 완료 절차	91
[그림 44] 공사 업체 계약 절차	91
[그림 45] 감리 용역 계약 절차	92
[그림 46] 가격 관련 용어의 구분	94
[그림 47] 기자재 구입 단계	95
[그림 48] 의견 수렴 및 시연회 실시	95
[그림 49] 기자재 목록 및 예산 견적 관리 예시	96
[그림 50] 시공 단계별 수행 사항	100
[그림 51] 학습 공간 조성 및 활용 사례(부산센텀여자고등학교)	107
[그림 52] 학습 공간 조성 및 활용 사례(해운대여자고등학교)	108
[그림 53] 지원 공간 조성 및 활용 사례(대전전문고등학교)	110
[그림 54] 지원 공간 조성 및 활용 사례(광주여고, 부산브니엘고, 전남남악고, 울산신정고)	111
[그림 55] 공용 공간 조성 및 활용 사례(부산센텀여자고등학교, 우신고등학교)	112
[그림 56] 공용 공간 조성 및 활용 사례(해강고등학교)	113
[그림 57] 공용 공간 조성 및 활용 사례(한울고등학교)	113
[그림 58] 공용 공간 조성 및 활용 사례(센텀고등학교)	114
[그림 59] 공용 공간 조성 및 활용 사례(센텀고등학교, 해운대여자고등학교)	114
[그림 60] 공간 기능 연계 고려 사례(서울 방산고등학교)	115
[그림 61] 블록타임 운영 사례(대구강동고등학교)	116
[그림 62] 과학 카페 활용	134
[그림 63] 다양한 크기와 형태의 교과교실 및 활동	136
[그림 64] 층별 교과교실 배치	136
[그림 65] 공간 예약 프로그램 화면	137
[그림 66] 인문사회 강의실 활용	138
[그림 67] 교과별 꿈·끼 키움 스페이스 활용	139
[그림 68] 쉼마루 활용 사진	140

그림 목차

[그림 69] 더이음실 회의·토론 장면	141
[그림 70] 계단식 시청각 교실 활용	142
[그림 71] 그룹학습실 활용	143
[그림 72] PBL실 활용	144
[그림 73] 해오름실 내 소인수 강의실	145
[그림 74] 스카이 클래스 활용	147
[그림 75] 아고라실 활용	148
[그림 76] 대규모 강의실 활용	149
[그림 77] 멀티실(계단식·대형) 활용	150
[그림 78] 목련마루(계단식·대형) 활용	151
[그림 79] 중강의실 활용	152
[그림 80] 홈플레이스 계단형 강의실 활용	153
[그림 81] 가변형 교실의 활용	154
[그림 82] 가변형 교과교실(더불어 숲, 그린룸, 블루룸, 설렘온실)	156
[그림 83] 교육과정 박람회·대학 연계 아카데미·자기주도학습(더불어 숲, 가변형 교과교실)	156
[그림 84] 창의공작소 활용	157
[그림 85] 한누리실 활용	158
[그림 86] 지능형 과학실 활용	160
[그림 87] 상상이룸실 활용	162
[그림 88] Science Zone 활용	164
[그림 89] 멀티미디어 러닝룸	165
[그림 90] 온라인 스튜디오 활용	166
[그림 91] 온라인 학습실 활용	167
[그림 92] 디지털 PBL실 활용	169
[그림 93] AI UNIVERSE 활용	171
[그림 94] 멀티룸B 활용	172
[그림 95] 온라인 학습실 활용	173
[그림 96] 온라인 학습실 활용	174
[그림 97] 메이커스페이스	176
[그림 98] 샘틀마루 활용	177
[그림 99] 스마트 디지털 교육 환경(컴퓨터실, AI융합교육실, 디지털 교실)	178
[그림 100] 디지털 활용 수업 혁신 지원(AI기반 수업 혁신 연수, 교원학습공동체 연구 지원)	179
[그림 101] 국제교류 활동 장면(덴마크 학교 교류, 한-뉴질랜드 국제 공동 수업(코딩 수업))	179
[그림 102] 학습 스튜디오 활용	180

그림 목차

[그림 103] 동아리실 활용	181
[그림 104] 메타버스실 활용	183
[그림 105] 문화예술활동실 활용	184
[그림 106] 소규모 활동실 더해움 활용	185
[그림 107] 학생자치회실 활용	186
[그림 108] 미디어 스페이스실	187
[그림 109] 다양한 목적의 지원 공간 활용	188
[그림 110] 다목적실 활용	189
[그림 111] 진로카페 이음 활용	190
[그림 112] 켄미온실 활용	191
[그림 113] 아단301	193
[그림 114] 카공족을 위한 학습 카페	194
[그림 115] 꿈도담터 활용	195
[그림 116] 층별 스터디룸	196
[그림 117] 스터디룸 활용	198
[그림 118] 다목적 강당 활용	200
[그림 119] 도서관 배치	201
[그림 120] 복합문화공간의 도서관 활용	202
[그림 121] 북섬(BOOK-SOME) 활용	204
[그림 122] 문향 활용	206
[그림 123] 은빛 도서관 활용	208
[그림 124] 서향원 활용	210
[그림 125] 도서실 활용	211
[그림 126] 지식과 창의의 허브	212
[그림 127] 독서 인문교육 활용	213
[그림 128] 책마루 활용	214
[그림 129] 한솔지혜마루(도서관) 전경	215
[그림 130] 한솔지혜마루 활용	216
[그림 131] 힐링도서관 전경	217
[그림 132] 힐링도서관 활용	218
[그림 133] 지혜서가 활용	219
[그림 134] 아카데미아 활용	221
[그림 135] 아단208 북카페 활용	223
[그림 136] 홈베이스형 복도 활용	225

그림 목차

[그림 137] 능동장 복도 활용	226
[그림 138] 위로카페	227
[그림 139] 청심홀 로비 활용	228
[그림 140] 북카페 활용	229
[그림 141] 중앙 현관 활용	230
[그림 142] 학생 예술 감수성 함양 프로젝트 : Art wall(또랑또랑의 사계(四季))	231
[그림 143] 홈베이스 활용	232
[그림 144] 페스티벌 클래스(구조관)	234
[그림 145] 헤움터(창의관)	234
[그림 146] 예다움터(지성관)·다운터(창의관)·도담터(창의관)	235
[그림 147] 무지개 홈베이스	236
[그림 148] 가온터전, 라온터전, 이든터전 활용	238
[그림 149] 홈베이스 활용	239
[그림 150] 쉼마루 활용	241
[그림 151] 홈베이스 활용	242
[그림 152] 교육과정 박람회 진행, 교사와 학생의 소규모 미팅 가능	243
[그림 153] 홈베이스 활용	244
[그림 154] 홈베이스 내 학생 버스킹 무대와 스탠드	245
[그림 155] 포켓 공간	245
[그림 156] 학생 휴식 및 애착 공간(홈베이스)	246
[그림 157] 홈베이스 및 스터디룸 전경	247
[그림 158] 홈베이스 활용	248
[그림 159] 학년별 홈베이스	249
[그림 160] 바다, 땅, 하늘 홈베이스	250
[그림 161] 도란실록 활용	251
[그림 162] 산들마루 Cafe 활용	252
[그림 163] 러닝허브 하루 활용	254
[그림 164] 도란도란 활용	256
[그림 165] 휴스테이션 활용	257
[그림 166] G라운지 활용	258
[그림 167] 복합문화공간 활용	259
[그림 168] 아고라 야외무대 활용	260
[그림 169] 명상의 숲길 활용	261
[그림 170] 한별 아프리카 활용	262

그림 목차

[그림 171] 필로티 공간 투시도	263
[그림 172] 필로티 공간 조성 결과	264
[그림 173] 필로티 공간 활용	264
[그림 174] 초롱초롱고 '난장' 운영	265
[그림 175] 전자칠판, 모니터, 검색대, 벤치 활용	266
[그림 176] 공기 질 측정기	267
[그림 177] 케이웨더 프로그램	268
[그림 178] 에듀테크 수업	269
[그림 179] 화학 수업	270
[그림 180] 교사 역량 강화 연수	271
[그림 181] 학술제 체험활동	271
[그림 182] 전자칠판 활용	272
[그림 183] VR기기 '로' 활용 사례	273
[그림 184] 전자칠판, 크롬북 연계 활용	274
[그림 185] 전·후면 칠판 활용	275
[그림 186] 실시간 스트리밍 수업	276
[그림 187] 노트북, 스튜디오 장비 활용	277
[그림 188] 전자칠판 활용	278
[그림 189] 사이니지 활용	280
[그림 190] 안내서 다운로드 방법	284
[그림 191] 학교 공간 조성 사진 자료 접속 방법	285



2025
고교학점제 학교 공간 조성 및
활용 안내서





고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서





고교학점제 학교 공간 조성 사업



I

고교학점제 학교 공간 조성 사업



1. 사업 개요

가. 사업 개념 및 필요성

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업은 기존 교과교실제를 통해 조성된 학생·수업 중심의 학교 공간 여건과 문화를 토대로, 미래 교육 환경 변화 및 고교학점제 도입에 따라 학생 개개인의 꿈과 자기 주도적 역량을 키워내는 학교 공간 조성 지원을 목적으로 함
 - ※ 본 사업은 교과교실제를 개편하여 추진되고 있으며, 「지방교육재정교부금법」 시행령 및 시행규칙(기준재정수요액 측정항목 중 '학교 운영비'의 '교과교실 운영비', '학교 시설비'의 '교과교실 시설비')에 근거함.¹⁾
- 기존 교과교실제 사업에서는 국가 수준의 교육과정에 제시된 교과(군)별 수업 단위를 기준으로 각 교과 특성에 맞는 교실 공간 재구조화를 추진했으나, 교과교실제 시설 구축 기준 및 운영 방식에 있어 한계점이 드러남. 이에 2019년부터 교과교실제 기준을 개편하여 학생 성장 중심의 고교 교육 실현을 위한 고교학점제 공간 조성 기준을 적용하였으며, 사업의 대상 및 내용이 큰 폭으로 변화하였음
- 고교학점제 학교 공간 조성 사업은 고교학점제 기반 조성을 위해 교과교실제 사업의 대상을 중·고등학교에서 고등학교로 조정하고, 고교학점제 운영을 지원하는 학교 공간 조성 사업으로 내용이 변화하였음
- 본 사업은 2025년에 전면 시행되는 고교학점제의 교육적 특징에 부합한 학교 공간 조성을 지원하고자 함

1) 교육부(2019.3.25., 2023.2., 2024.2.)

나. 사업 목적



[그림 1] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 운영 목적

다. 학교 공간 조성의 교육적 효과²⁾

학점제형 학교 공간 조성은 노후화된 학교 시설에 대한 기능 개선을 넘어서, 혁신적 교육 및 미래지향적 삶을 위한 공간으로 학교 공간을 탈바꿈하는 혁신의 과정임

1) 학습 공간 및 지원 공간의 교육적 효과

- 고교학점제를 위해 조성한 학교 공간들이 고교학점제 교육과정의 변화를 촉진하고 가속화하고 있음(학점제형 학교 공간 조성 → 고교학점제 교육과정 변화)
- 첫째, 학교 내에 발표 수업을 위한 계단식 교실, 토론을 위한 원형 교실, 에듀테크 기기(멀티미디어 기기)가 설치된 교실 등이 마련되자, 학생 중심의 도전적 교수·학습 활동, 에듀테크 활용 수업, 온·오프라인 블렌디드 수업 등이 실제로 이루어지고 있음. 학점제형 학교 공간 조성 과정에서 이와 같은 교실의 도입을 주저하던 교사들도 혁신적 학습 공간이 조성되고 활용되는 성과를 확인 하면서 그 공간을 활용한 다양한 수업을 도입하고자 시도하고 있음
- 둘째, 연구 대상 학교에서는 중앙교무실 또는 학년교무실과 인접한 공간에 학생 상담 공간을 조성하거나, 학생 상담이 가능한 소규모 세미나실을 다수 조성한 사례들이 나타나자 그 공간을 활용한 교사들의 진로·학업 설계 상담이 활성화되었고, 학생과 교사 간 소통이 활발해짐
- 셋째, 교사협의회실(또는 교과연구실)과 같은 교사 협의를 위한 공간이 조성되며 동 교과 교사들 간의 교과협의회, 동 학년 교사들 간의 협의와 토론이 활성화됨

2) 공용 공간의 교육적 효과

- 학교 내에 머물고 활용할 수 있는 공간들이 조성된 후 학생들은 방과 후에도 학교에 남아서 학습 활동을 이어갈 수 있게 됨. 학생들이 외부의 카페나 회의 공간이 아니라, 학생들에게 친숙하고 안전한 학교 공간 내에서 보내는 시간이 늘어나는 긍정적 효과가 나타남

3) 학교 공간 질 제고의 교육적 효과

- 학점제형 학교 공간 조성을 통해 개선된 학교 공간은 학교 교육에 대한 만족도를 높임

2) 임종헌, 김정아 외(2022: 143-147)를 바탕으로 요약

2. 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 방향

가. 학점제형 공간 조성 추진 방향

- 고교학점제 도입·운영에 맞춘 다양한 선택과목 수업 운영 및 온·오프라인 연계 교수·학습 혁신을 위한 학생·교사 등 사용자 참여 기반의 학점제형 공간 조성을 지원함(교육부, 2021)



< 고교학점제 학교 공간 조성의 방향 >


- **(개방화)** AI·AR 및 IoT 등 에듀테크를 활용하여 학습의 시·공간적 제한과 가상공간과의 경계를 허무는 첨단 교수·학습 환경 구축
- **(자율화)** 교사와 학생 등 학교 구성원이 직접 공간 설계에 참여하여 사용자 참여 중심의 설계에 따른 학생 친화적 공간으로 재구조화
- **(유연화)** 미래교육 환경 변화에 대응하여 다양한 교수·학습 방법 구현과 학급 단위 수업 등 정형화된 틀을 깨기 위한 융·복합적 학습 공간 필요
- **(개별화)** 학생 참여 중심의 개별 학습을 토대로 구성원 간 협업 강화를 통해 창의성과 문제해결력을 키우는 협력적 학습 공간 마련

출처: 교육부(2021: 31).

[그림 2] 고교학점제 학교 공간 조성의 방향

나. 학점제형 공간 조성 및 활용 원리

- 기존의 고교학점제 학교 공간 조성 원리는 ‘학습 공간의 유연성’, ‘지원 공간의 복합성’, ‘공용 공간의 활용성’, ‘동선의 효율화’ 4가지로 제시되었음. 4가지 원리는 학점제 교육과정의 특성을 반영하고 있으며, 학점제 학교 공간 조성에 근간이 되는 원리로 기능함. 이후 공간과 교육과정 간의 연계성을 추가한 고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 원리를 다음의 그림과 같이 재구성하여 제시함

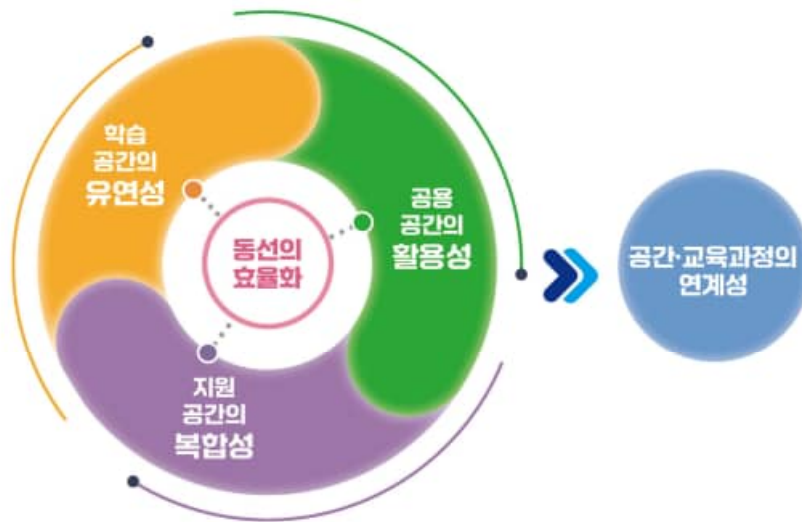

[그림 3] 고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 원리

〈표 1〉 고교학점제 학교 공간의 조성 및 활용 5가지 원리와 내용

원리	내용
학습 공간의 유연성	• 학습 공간은 교실을 가리키며, 학습 공간의 유연성은 3가지로 구분 ① 공간 크기의 유연성: 폴딩도어 등을 활용한 대형 교실, 소인수 강의실 등을 통해 학생 수, 수업 형태에 따라 공간을 조정하거나 유연하게 활용 ② 사용 주체의 유연성: 기존 교과교실제와 명확히 구분되는 지점이며, 다양한 교과교사들이 다교과교실 및 공용교실을 유연하게 사용 ③ 활용·이용의 유연성: 교사들은 차시별 수업 형태에 따라 그에 맞는 교실을 예약하여 활용할 수 있고, 학생은 공강 시간이나 점심시간, 방과 후 시간에 교실을 예약하여 자기주도 학습, 프로젝트 활동 등을 진행
지원 공간의 복합성	• 지원 공간이란 학습을 지원하는 학교 공간, 즉 도서실, 상담실, 회의실 등을 가리킴 • 지원 공간은 지정된 용도로만 활용되는 경향이 있으나 다양한 수업과 활동, 휴식, 상담 등을 위해서 복합적으로 활용되어야 함
공용 공간의 활용성	• 공용 공간이란 공용으로 활용하는 학교 공간, 즉 휴베이스, 복도, 로비 등을 가리킴 ① 휴베이스: 휴베이스는 학생의 휴식뿐만 아니라 수업, 상담, 모둠활동, 자기주도 학습 등을 할 수 있도록 활용성을 높여야 함 ② 복도와 로비: 복도와 로비는 휴식, 사물함 보관, 전시 및 공연 공간 등 학교 상황에 맞게 활용성을 높일 필요가 있음
동선의 효율화	• 고교학점제가 시행되어 학생의 이동이 활발해지므로, 학생의 동선이 효율적이어야 함 • 동선의 효율화는 물리적 동선의 효율화와 교육과정적 동선의 효율화로 구분 ① 물리적 동선의 효율화: 물리적 공간 배치를 통한 이동 거리의 최소화. 학생의 이동 거리가 최소화될 수 있도록 학습 공간, 지원 공간, 공용 공간 배치 ② 교육과정적 동선의 효율화: 교육과정을 통한 동선의 효율화. 예를 들어, 블록타임 운영을 통해 학생의 이동 횟수를 줄이고, 학생 시간표를 고려한 과목-교실 매칭을 통해 이동 동선을 줄일 수 있음
공간·교육과정의 연계성	• 학교 공간은 고교학점제 교육과정과 연계되어야 함. 공간과 교육과정의 연계성은 다음의 3가지로 구분 ① 교수·학습 방법과 학습 공간의 연계성: 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 발표 수업, 온라인 수업 등 다양한 교수·학습 방법을 잘 구현할 수 있는 공간 조성 ② 학점제의 특징과 공간과의 연계성: 1학년 공통과목 중심 및 2, 3학년 선택과목 중심으로 운영되는 고교학점제 교육과정을 반영하여 휴베이스, 진로·학업 설계 지도를 위한 상담 공간, 최소 학업성취수준 보장 지도를 위한 공간 조성 ③ 단위 학교의 특징과 공간의 연계성: 단위 학교가 갖는 특징 즉, 공동교육과정 거점학교, 교과특성화학교, 남녀 학생 구성, 교원 구성, 지역사회 자원 등을 공간 조성에 반영

임종현, 김정아 외(2022: 139)를 바탕으로 구성.

다. 학점제형 공간 조성 구현상



학습공간

- 다양한 형태의 교과수업이 가능한 학습 공간 마련
- 에듀테크 기술을 활용한 다양한 교수학습 공간 구현



PBL실



온라인수업교실



메이커교실

공용공간

- 공강 및 쉬는 시간 휴식, 소그룹 활동이 가능한 자율공간 마련
- 홈베이스, 복도 등 공용 공간의 효율성 제고



홈베이스-자율활동공간



홈베이스-휴식공간



홈베이스-휴영로버

지원공간

- 다양한 수업 및 학생자율활동이 가능한 지원공간 구축



도서실



소규모 활동실



문화예술 활동실

이동동선

- 선택과목 확대에 따른 학생이동 동선 최소화를 위한 사용자 입장 공간 배치

출처: 교육부(2024.5.22.).

[그림 4] 고교학점제 학교 공간 조성 구현상



2025
고교학점제 학교 공간 조성 및
활용 안내서





고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서





고교학점제 학교 공간 조성 사업 담당자의 시기별 역할



II

고교학점제 학교 공간 조성 사업 담당자의 시기별 역할



신청

4~6월

6~8월

3월

인식 제고
상황 분석

신청 및 선정

공간 조성
계획 수립

연차별
역할

- 사업 선정 계획 및 도입 희망학교 대상 설명회 안내

- 학교 현장 방문 실사
- 신청교 수합 및 제출
- 선정 결과 안내

- 안내서 배부/안내
- 예산 교부 및 집행 유의 사항 안내
- 조성 계획 수립 안내

- 사업 이해
- 현황 파악
- 사업 구상

- 도입 희망 학교 설명회 참석
- 도입 신청 서류 제출

- 학교 비전 설정
- TFT·실무추진단 구성

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업 방향 수립

연차별
역할

구축

4~8월

설계 및 구체화

8월~이듬해 1월

시공

2월

완공 및 점검

- 한국교육개발원 도입학교 대상 연수 실시(3월)
- 한국교육개발원 중앙컨설팅 실시(1차:4~8월/2차:9~12월)
- 교육청 컨설팅단 수시 컨설팅/연수 실시

- 학교 자체 연수
- 자료 조사
- 인사이트 투어

- 퍼실리테이터 활용 사용자 참여 설계
- 구성원 의견 조율 및 기본설계도 작성

- 1차 중앙컨설팅 실시
- 공사 구간 조정/확정

- 2차 중앙컨설팅 실시
- 기자재 비품 구입 계획 수립 및 선정
- 실시설계 작성 및 확정

- 시설 건축, 전기, 통신, 소방 시공사 선정
- 감리 계약

- 시설 공사 진행
- 기자재 물품 구입 및 설치

- 준공 검사
- 학교 청소/공간 정리
- 공간 배정

- 시설 공사 진행
- 기자재 물품 구입 및 설치

운영

3월


학점제형
공간 운영

- 운영비 교부
- 학점제형 공간 구축 상황 점검 및 수시 컨설팅

- 운영 및 예산 계획서 제출
- 학생 맞춤형 교육과정 운영



고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서





학점제형 공간 조성의 단계별 운영 가이드



III


학점제형 공간 조성의
단계별 운영 가이드

1. 공간 조성 기획

가. 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 이해

1) 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 단계

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업은 학교 구성원의 인식 제고를 통한 신청부터 구축 후 지속 운영 과정이 2년에 걸쳐 이루어짐³⁾
- 고교학점제 및 학생 맞춤형 교육과정에 대한 공감대를 형성하여 학점제형 공간을 조성하고 교육과정·수업·평가 혁신을 통해 학교를 미래지향적 삶의 공간으로 탈바꿈하는 과정임

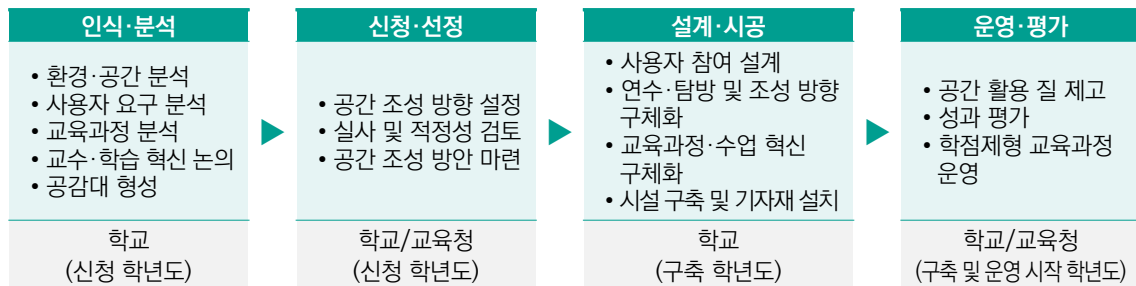

[그림 5] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 단계

2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 시기별 추진 내용

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 주요 추진 내용을 시기별로 아래의 표와 같이 제시함
- 신청 학년도는 학교가 고교학점제 학교 공간 조성 사업을 신청하는 시기이고, 구축 학년도는 학점제형 공간 조성을 계획서에 따라 진행하는 시기이며, 운영 시작 학년도는 공간 조성 후 학점제형 공간 활용을 시작하는 시기임

3) 따라서 학교에서는 신청 학년도의 담당 부장 및 교사가 신청·구축·운영의 2개 학년도에 사업을 일관성 있게 담당할 수 있도록 협의할 필요가 있음

〈표 2〉 고교학점제 학교 공간 사업 시기별 추진 내용

	구분	추진 주체	추진 내용	시기
신청 단계	인식 제고 및 상황 분석	학교	• 사업 이해(고교학점제 및 미래 교육 환경 변화에 대비한 공간 혁신) • 현황 파악(학점제 교육과정 분석, 학교 특성 및 학교 공간 현황 분석 등) • 사업 구상(학교 교육과정과 학교 공간의 연계성 분석, 교수·학습 혁신 논의 등)	4~6월
	신청 및 선정	교육청	• 선정 계획 및 도입 희망 학교 대상 설명회 안내	5~6월
		학교	• 도입 희망 학교 대상 설명회 참석 • 도입 신청 서류(신청서, 학교 배치도 및 시설 도면, 소요 교실 수 산정 결과, 교육과정 편제표 등) 제출	6~7월
		교육청	• 학교 현장 방문 실시 ⁴⁾ • 한국교육개발원: 도입 적정성 검토 • 고교학점제 학교 공간 조성 추진 위원회 심의·심사 결과 보고 • 보통교부금 기준 재정 수요액 산정·제출 및 예산 편성	7~9월
		교육청 교육부	• 예산(시설비, 기자재·비품비, 운영비) 확정 • 선정 결과 및 예산 안내	12월
구축 단계	공간 조성 계획 수립	학교	• 학교 비전 설정 및 TFT·실무추진단 구성 - Small TFT: 교장, 교감, 행정실장(행정과장), 사업 담당 부장, 담당 교사, 교육과정 담당 부장 - Big TFT: Small TFT + 교과 대표 교사 + 학생 • 고교학점제 학교 공간 조성 방향 수립 - 학교의 공사 희망 공간 예비 조사(전교사, 학생 대상 설문조사) - 공간 조성을 위한 학생 TFT 조성 (학생 설문조사 및 학생용 가구 선택 의견 제시, 공간 배치 등 학생들의 의견 제시 역할)	3월
		교육청	• 안내서 배부 및 안내 • 예산 교부 및 예산 집행 유의 사항 안내 • 도입학교 대상 연수·워크숍(학교 업무 담당자 설명회·연수) • 고교학점제 학교 공간 조성 관련 정보 공유	3~5월
	설계 및 구체화	학교	• 학교 자체 연수 및 자료 조사, 인사이트 투어 운영 - 홈페이지의 장·단점, 공사 범위 동선의 효율성 확인, 공사 후 교육과정 운영과 공간 활용의 장·단점 의견 듣기, 행정학급의 변화 정도, 예산 사용 용도, 색깔, 사업 학교에 적용 가능성 여부 • 퍼실리테이터 활용 사용자 참여 설계 - 학교 도면 위에 공사 범위 구체적 표시, 학생 동선, 공사의 예산 고려, 공사 및 공사 외 후반 작업 금액 고려한 대략의 계획에 대한 조율 • 학교 현황·특성을 고려한 공간 조성 방향 구체화(공사 범위에 대한 Big TFT 의견 조율) • 전체 구성원의 의견 조율 및 기본 설계도 작성 • 중앙컨설팅 실시(1차): 공사 범위에 대한 의견 구하기 - 학생 이동 동선 - 공간의 효율적 사용 및 공사 범위의 연계성 - 공사의 중심이 되는 부분과 부차적인 부분이 적절한 분배 여부 - 환경 개선 사업 등 기타 교육청 예산으로 공사할 수 있는 개별 단위 공간은 제외하기: (예) 컴퓨터실, 과학실, 통합반 교실, 음악실, 미술실, 교무실, 화장실 등은 다른 예산 있음 • 공사 범위 1차 조정 - Big TFT: 학생 동선을 고려, 너무 구석에 위치해서 학생만의 공간이 되지 않는지 확인, 학교 전체에서 공사 부분의 비율과 위치 적절성 확인 • 공사 범위 2차 조정 - Small TFT: 홈페이지나 소강당 등 뿐만 아니라 정비를 한 뒤 마무리 처리를 어디까지 할 것인지 결정: 예) 벽면 도색, 벽면의 액자 정리, 게시판 정리	4~8월

	구분	추진 주체	추진 내용	시기
구 축 단 계			• 공사 범위 확정 - 설계 업체 선정·계약 및 기본설계도 작성	
		교육청	• 시·도교육청 컨설팅단을 통한 수시 컨설팅 및 연수 운영 • 한국교육개발원 중앙컨설팅(1~2차) 실시	4~10월
		학교 교육청	• 학교 자체 연수(기본설계 내용 구성원 공유 및 검토·수정) - Big TFT: 회의 결과, 디자인·색깔·모양·가구 배치 확인 및 변경을 건축사에게 요청 • 중앙컨설팅 실시(2차): 기본설계에 대한 컨설팅 후 기본설계 수정 • 각 공사 범위의 실별 기자재·비품 구입 계획 수립 - 책자와 인터넷을 통한 가구 모양이나 개수 확인: 불박이 가구, 조달청 물품 구입, 제작 가구로 분류 - 건축사와 불박이 가구·전선·컴퓨터·빔프로젝터·책상·개수대 위치 등을 모두 도면에 표기하도록 요청(도면 표기가 없으면 모든 것을 담당 교사가 공사 중 직접 챙겨야 함) • 실시설계 작성 및 확정	9~12월
		학교	• 기자재·비품 구입 내용 공유 및 선정·구입 - 제작 가구/게시판 의뢰, 블라인드·교실 안내판·시트지 등 의뢰, 인테리어 업체 선정(필요시 물품구입위원회 개최), 조달청 물품 구매 협의회(Big TFT, 학생동아리, 학생회, 학부모)	11월
	시공	학교	• 시설 건축(철거, 폐기물, 시설, 인테리어, 청소 등), 전기, 통신, 소방 시공사 선정 및 감리 계약	11월
			• 시설 공사 진행, 기자재·물품 구입 및 설치	12~1월
	완공 및 점검	학교	• 준공 검사 • 학교 청소 및 공간 정리 • 신학년도 교육과정 운영을 위한 공간 배정	2월
		학교	• 시설 및 기자재 관리 및 사용 연수 실시 • 고교학점제 학교 공간 조성 사업 보고서 및 정산서 제출	2월
▼				
이 용 단 계	학점제형 공간 운영	교육청	• 운영비 교부	3월
		학교	• 학점제형 공간 운영 계획 수립 및 운영 계획서, 예산 계획서 제출 • 학생 맞춤형 교육과정 운영 및 교실 수업 혁신 추진	3월
		교육청	• 고교학점제 학교 공간 구축 상황 점검	3월
		교육청	• 학점제형 공간 운영 상황 점검 및 수시 컨설팅	5~6월
		학교 교육청	• 학점제형 공간 운영 결과 보고서 및 예산 정산서 제출 • 학점제형 공간 운영 결과 공유 및 성과 보고	12월

4) 학교 현장 방문 실사 Tip

- 학교를 방문하여 고교학점제 학교 공간 조성 사업 추진에 대한 공동체의 의사를 확인하고, 도입 신청서, 학교 배치도 및 시설 도면, 소요 교실 수 산정 결과 등 제출 서류 점검·확인
- 석면 제거 여부 및 예정 시기 등을 확인하여 도입 시기 조정 필요(석면이 제거되지 않을 시 공간 조성 범위가 제한될 수 있고, 석면 공사와 중복 시에는 반드시 석면 공사가 선행되어야 진행할 수 있음을 유의)
- 신청서에 작성된 학교 시설(교사, 식당, 체육관 등)의 준공년도 및 최근 개축년도 확인, 시설 현황의 규모 확인, 시설별 중복 사업 여부(특수 목적사업비 구축 시설 포함 등)를 검토하여 소요 교실 수 조정
- 구조 안전진단 등급 확인 및 학교 내 내진 공사 여부 확인, 시설 리모델링 과정에서의 안전성 검토 시설비, 기자재 비품비 비율 및 사용 방법은 교육청의 지침을 확인해야 함

나. 고교학점제 학교 공간 조성 사업 신청

1) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 대상교 선정 계획 이해

» 2026년 신규 도입 및 전환 학교, 증설 사업 학교 선정

- 고교학점제 전면 도입에 맞춘 다양한 형태의 수업 및 학생 중심 교육 활동 여건 조성을 위한 학점제형 공간 조성
- 다양한 선택과목 수업 운영 및 온·오프라인 연계 교수·학습 혁신 등 고교학점제 교육과정 운영을 위한 기반으로 학교 공간 조성 추진
- 학생·교사 등 사용자 참여 설계에 기반하여 학교 특성과 학교 구성원의 의견을 반영한 학점제형 공간 조성 지원

〈표 3〉 고교학점제 학교 공간 사업 도입학교 선정 절차

단계	내용	
1	• 도입 희망교 대상 온라인 연수(한국교육개발원) - 2026년 고교학점제 학교 공간 조성 사업 도입 희망교 설명회	
2	• 신청 안내(교육청→학교) - 신청 요건에 해당하는 학교	
	도입(신규·전환) 학교 신청 요건 - 학점제형 공간 미조성 고등학교 - 학점제형 공간 조성 7년 경과 고등학교	증설 희망 신청 요건 - 교과교실 사업 운영학교 - 학점제형 공간 미조성 고등학교 ※ 시설 변경 및 증설 사유서 제출
3	• 신청서 제출(학교→교육청)	
4	• 현장 실사(교육청→학교) ※ 도입(신규·전환) 희망 학교 및 증설 희망 학교에서 제출한 신청서 내용 및 소요 교실 수 등에 대한 현장 확인 ※ 증설 요청 학교의 경우 학생 과목 수요조사, 수강신청 결과 등을 통해 '학생 희망 과목 개설을 위한 소요 강의실 수 등' 확인	
5	• 도입 선정 심사 및 결과 제출(교육청→교육부·한국교육개발원) (도입 선정 심사 시, 시설과, 사학정책팀, 감사관 협력)	
6	• 도입 적정성 검토 결과 안내(한국교육개발원→교육청)	
7	• 최종 선정 심사(교육청) 및 최종 선정 결과 제출(교육청→교육부)	

2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 도입학교 신청서 제출

- 자가진단도구를 활용(소요 교실 수 산정)하여 관련 서류와 신청서 제출

〈표 4〉 도입학교 및 증설 검토 신청 자료

도입(신규·전환) 학교	증설 희망 학교
① 도입 희망 신청서 ② 학교 배치도 및 층별 평면도(변경 전·후) ③ 2025학년도 전학년 교육과정 편제표 및 편제표(안) ④ 소요 교실 수 산정 결과 엑셀 파일 ⑤ 학교운영위원회 회의록 ⑥ 기타 필요 서류(심사 시 필요 자료) 등	① 증설 희망 신청서, 시설 변경 및 증설 사유서 ② 학교 배치도 및 층별 평면도(변경 전·후) ③ 2025, 2026학년도 전학년 교육과정 편제표 및 편제표(안) ④ 소요 교실 수 산정 결과 엑셀 파일 ⑤ 학교운영위원회 회의록 ⑥ 기타 필요 서류(심사 시 필요 자료) 등


(※ 시·도교육청 상황과 여건에 따라 상이할 수 있음)

3) 자가진단도구 이해 및 활용 방안

» 자가진단도구의 이해

- 고교학점제 전면 시행('25)에 맞춘 학교 현장의 학점제형 공간 조성 지원을 위해 학교 자체적인 공간 현황 진단 지원
- 자가진단도구를 활용하여 학점제 운영을 위한 공간 소요 및 확보 현황을 진단하여 공간 재구조화 방향 설정
 - 학교의 공간 현황 진단 결과를 토대로 학교 상황에 따른 고교학점제 학교 공간 조성 사업 신청 및 공간 조성 추진


〈표 5〉 시나리오별 공간 조성 방안

			
	여유 공간 다량 발생 시나리오 A	여유 공간 발생 시나리오 B	부족 공간 발생 시나리오 C
학습 공간의 유연성	교실 내 다양한 학습 영역 조성 공용교실 추가 조성	교실 내 학습 영역 구분 조성 특별교실 + 여유 공간 → 공용교실	교실 외 영역 추가(증축), 통합 도서실 → 러닝센터 통합 활용
지원 공간의 복합성	학년별 중·소규모 PBL 공간 조성 좌식 동적 활동 공간 조성	학교 내 소규모 PBL 공간 조성 개방형 수업 연계 공간 조성	홈베이스 + 개방형 PBL 공간 조성 다기능·고기능 교실로 재구조화
공용 공간의 활용성	홈베이스 + 개방형 모임 + 개인 휴식	홈베이스 + 개방형 모임	홈베이스 설치
동선의 효율화	학년별 층 구분	공용교실 중심 배치	커뮤니티 기반 중심 공간 형성

이윤서 외(2020:101-104)를 바탕으로 재정리.

▶ 자가진단도구의 활용

- 자가진단도구는 고교학점제 공간 조성 기준을 토대로 자동으로 산출될 수 있도록 엑셀 기반으로 개발되었으며, 단위 학교의 고교학점제 운영에 필요한 공간의 소요 및 확보 현황 등을 진단할 수 있음
- 자가진단도구는 각 실별 여유 또는 부족 현황 결과를 자동 산출하며, 공간 재구조화 방향 설정을 위한 참고 자료로 활용될 수 있음
- 자가진단도구는 3개(자가진단, 전제조건, 산출조건)의 엑셀 시트로 구성되어 있으며, 이중 첫 번째 엑셀 시트인 '자가진단' 시트에 학교의 현황 정보를 입력하여 공간 진단 결과를 확인할 수 있음
- 자가진단도구는 아래의 자가진단표와 같이 엑셀 시트의 좌측은 단위 학교에서 입력 또는 확인해야 할 사항으로 구성되어 있으며, 우측은 좌측의 입력 및 확인 결과에 따라 자동으로 산출되는 진단 결과임
- 에듀넷 홈페이지에 탑재(<https://www.edunet.net/>)
 - 일반고: 에듀넷 홈페이지 > 교육정책 > 고교학점제 > 자료실 > '고교학점제 학교 공간 조성 자가진단 도구(일반고)'
 - 예체고: 에듀넷 홈페이지 > 교육정책 > 고교학점제 > 자료실 > '고교학점제 학교 공간 조성 자가진단 도구(예체고)', '고교학점제 학교 공간 조성 자가진단 도구(체육고)'

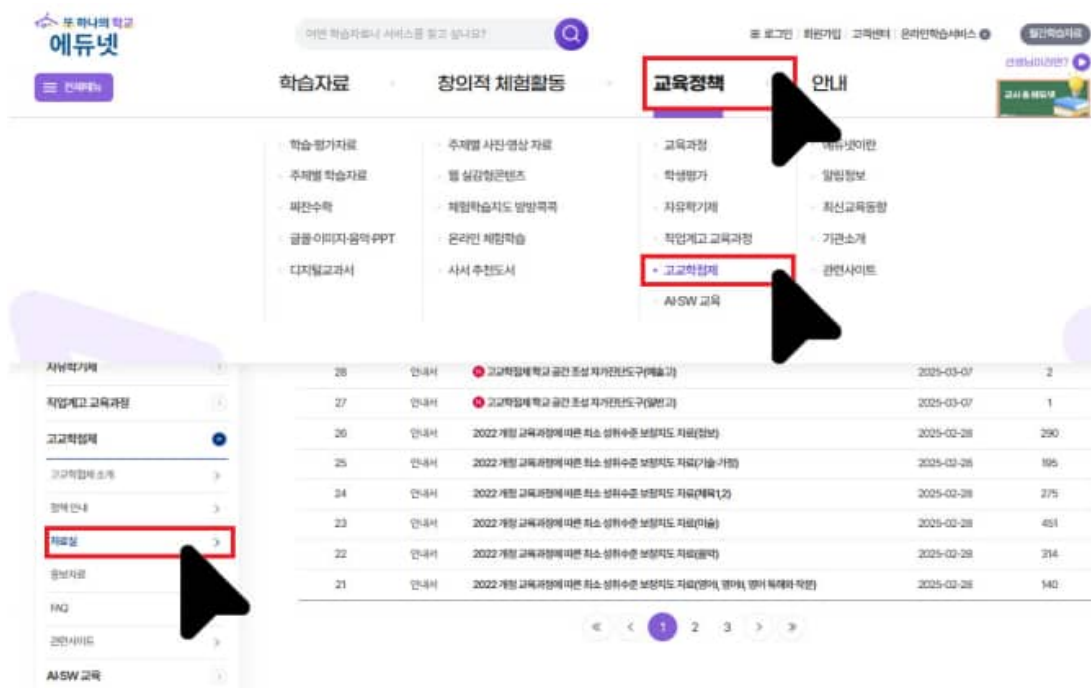

[그림 6] 자가진단도구 다운로드 방법

〈표 6〉 자가진단도구(일반고)

정보 입력

"아래의 노란색 셀 안에만 학교 정보를 입력 하시기 바랍니다."

대한 고교	26	+	1	자가진단
--------------	-----------	----------	----------	-------------

학교 현황

구분	학급수	학생수	
1학년	10	240	명
2학년	8	240	명
3학년	8	240	명
특수학급	1	6	명

아래 노란칸에는 반드시 제곱미터 단위로 기입해 주세요

건축면면적(단, 기숙사 면적은 제외)	9,900.0	m ²
일반(학급)교실 1칸의 크기(면적)	67.5	m ²
홈베이스(락커룸, 미디어스페이스 등 포함)	201.0	m ²
도서실(정보검색코너, 수업공간 등 부속공간 일체 포함)	180.0	m ²

아래 노란칸에는 반드시 면적과 상관없이 실수만 기입해 주세요

설명	총실수	
일반교실, 교과교실(교실의 1칸 정도 크기)	24	실
소규모의 일반 또는 교과교실(교실의 1칸 미만 크기)	2	실
특별교실(과학실, 기술실, 가정실, 음악실, 미술실, 컴퓨터실 등)	6	실
동아리실(문화예술활동실 등)	3	실
특수학급교실	1	실
기타교실(다목적 교실 등)	1	실
여유교실 또는 유휴교실(현재 상기의 교실 이외의 교실을 고교학점제 운영에 필요한 공간으로 리모델링하여 재사용이 가능한 교실이거나 사용하고 있지 않는 교실)	1	실

진단 결과

진단 결과

건축면면적	기준	13,850.8	m ²	결과	-3,950.8	m ²
-상기 결과 값은 미래형 고교 모델 기준 대비 참고(증감)결과임						
설명	기준	결과(증감)			결과환산(칸=교실1칸)	
일반교실, 교과교실	26	-1	실	=	-1	칸
특별교실(과학/기술/가정/음악/미술/컴퓨터실)	11	-5	실	=	-10	칸
도서실(정보검색코너 등 부속공간 일체 포함)	217.8	-37.8	m ²	=	-0.6	칸
동아리실(문화예술활동실 등)	5	-2	칸	=	-2	칸
홈베이스(락커룸, 미디어스페이스 등 포함)	435.6	-234.6	m ²	=	-3.5	칸
특수학급교실	1	0	실	=	0	칸
기타교실(다목적 교실 등)	0	1	실	=	1	칸
여유교실 또는 유휴교실	0	1	실	=	1	칸

〈표 7〉 자가진단도구 엑셀 시트의 구성(일반고)

“소요 교실 수 산정 결과(학교용)” 파일이 자가진단도구(엑셀 파일)

※ 자가진단도구(엑셀 파일)는 총 3개의 시트(sheet)로 구성되어 있음

- ① 자가진단: 학교에서 값을 입력하면 고교학점제 운영에 필요한 공간 규모를 자가 진단함
- ② 전제조건: 프로그램 개발의 전제조건임
- ③ 산출조건: 고교학점제 연구학교 데이터를 바탕으로, 고교학점제 교육과정 운영을 위한 평균값 적용

아래의 자료를 준비하여 시트 [자가진단]의 “노란색 칸”에 값을 입력함

※ 자가진단(입력) 시트에 입력해야 하는 값

- ① 학교명
- ② 학년별 학급 수와 학생 수, 특수학급 수와 학생 수
- ③ 해당 학교의 건축 연면적(m^2) 단, 모든 건물의 연면적을 합하되, 기숙사 면적은 제외
- ④ 일반(학급)교실 1칸 크기, 휴베이스, 도서실 등 각각의 면적(m^2)
- ⑤ 학습 공간의 실별(예, 교실 1칸 크기의 일반교실 또는 교과교실, 교실 1칸 이하 크기의 소규모교실, 특별교실-과학실, 음악실, 미술실, 기술실, 가정실, 컴퓨터실, 멀티미디어실, 특수학급교실, 기타 다목적 교실 등) 보유 실 수(실)
- ⑥ 동아리실(문화예술활동실 등)의 보유 실 수(실)
- ⑦ 여유교실 또는 유휴교실(현재 상기 교실 이외의 교실을 고교학점제 운영에 필요한 공간으로 리모델링하여 재사용이 가능한 교실이거나 사용하고 있지 않는 교실 등)의 보유 실 수(실)

상기대로 입력 완료되면 자동으로 시트 [자가진단]의 “진단 결과”에 값이 산출됨

- ① 각 공간 및 실의 기준 값과 보유량에 따른 증감 결괏값을 동시에 보여줌
 - ② 기준 값은 학교의 현황(학급 수, 학생 수, 교실 현황 등)에 따른 자가진단도구 결괏값임
- ※ 단, 세부적인 기준은 시도교육청 자체 기준에 따름
- ③ 증감 결괏값이 (-)의 경우 부족하다는 것을 의미함
 - ④ 항목별 결괏값을 참고하여 해당 학교가 고교학점제 운영에 필요한 공간 재구조화(증축 또는 영역간 교실 재배치 등 리모델링 등) 방향을 설정하는 데 기초자료로 활용함
- 예를 들어, 교실 수가 부족하게 나왔더라도 교과목별 선택한 학생 수를 감안하여 하나의 교실을 두 개로 나눌 수도 있음
- 해당 학교가 충분히 보유한 영역의 면적(+값)을 부족한 영역(-값)에 필요한 공간으로 전환 또는 리모델링하여 기존 공간을 우선적으로 활용함

출처: 한국교육개발원(2022b: 22).

4) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 적정성 검토

〈표 8〉 고교학점제 학교 공간 조성 사업 신청 적정성 검토 기준

(※ 시·도교육청 상황과 여건에 따라 상이할 수 있음)

구분	내용	검토 기관	
		교육청	KEDI
구성원의 동의·의지	고교학점제 학교 공간 조성 사업(교과교실) 도입에 대한 소속 교원 과반수 찬성 여부 및 학교운영위원회 심의 결과를 통해 학교 구성원의 의지를 판정	○	
교육과정 및 교수·학습 방법	고교학점제 도입에 대비하여 학생들의 선택과목 개설 수요를 반영한 선택형 교육과정 운영 현황 및 학생 맞춤형 교육 활동 운영 계획의 적정성 등을 검토 ※ 2025, 2026학년도 전학년 교육과정 편제표 및 편제표(안), 신청서 기재 내용 등 검토	○	
	고교학점제 학교 공간 조성을 통해 학생 맞춤형 교육과정 운영 및 교실 수업 혁신을 위한 구체적인 방안 및 구현 의지 등을 검토	○	
학급 수 및 학생 수	고교학점제 학교 공간 조성 소요 교실 수 산정을 위한 학급 수* 및 학생 수 현황 검토 *학급 수 : '25년 학급 수 및 '26년 예정 학급 수		○
시설 검토 기준	고교학점제 학교 공간 조성을 위한 소요 교실 수는 학습 공간, 지원 공간, 공용 공간 조성에 필요한 교실 수를 기준으로 검토 ※ '고교학점제 학교 공간 조성 자가진단 결과' 참고 ※ 소요 교실 수 검토 시 관리·행정 공간은 제외		○
	고교학점제 운영을 위해 학교가 수립한 공간 재구조화 계획 수립의 적정성 검토 ※ 사업 신청서, 층별 평면도(변경 전·후) 등 확인		○
	특수목적사업비로 구축된 기존 시설에 대해서는 도입 시점 기준으로 7년이 경과되지 않은 경우 공간 조성 소요 교실 수 검토 대상에서 제외(단, 시도 자체 기준 등에 따라 추가 지원이 필요하다고 판단하여 신청 시 검토)		○
	30년 이상 노후 건물의 개축 대상 및 구조 안전 진단 등급 확인, 석면 제거 여부 및 미완료 시 예정 시기 등 확인		○

출처: 교육부(2023.6.5.).

다. 공간 조성을 위한 기획 및 구성

1) 고교학점제 대비 학교 공간 조성 계획

» 단위 학교 학점제형 공간 구분

〈표 9〉 학점제형 공간 구분

구분	예시
학습 공간	일반 교실, 융합교과실, 소인수 강의실, 대형 교실, 계단식 강의실, 디지털 학습실(온라인 스튜디오, 컴퓨터실, 블렌디드 러닝 교실, 첨단 미래 교실 등), 실험실(과학실), 실습실, 실기실(음악실, 미술실 등), 메이커교실, PBL실 등
지원 공간	도서실, 상담실, 회의실, 자기 주도적 학습 공간, 스터디 카페(학습 카페), 동아리실, 다목적실, 시청각실, 소규모 활동실, 온라인 수업 제작실, 문화예술 활동실, 컴퓨터·프린트 이용 공간(미디어 스페이스), 준비실(실험·실기 비품 준비실) 등
공용 공간	홀베이스, 복도(사물함, 전시 공간), 로비, 계단, 야외 테라스, 야외 쉼터, 휴식공간(포켓 공간), 자율활동공간, 소형 공연 공간 등

(※ 학교별 상황과 여건에 따라 상이할 수 있음)

» 학점제형 공간 조성 및 활용 원리

〈표 10〉 학점제형 공간 조성 및 활용 원리

원리	내용
학습 공간의 유연성	• 다양한 교과 활용 • 수업 형태에 따라 활용 • 수강 인원에 따라 활용
지원 공간의 복합성	• 도서실, 다목적홀, 시청각실 등 • 교육 목적에 따라 복합적으로 공간 사용(휴식, 상담, 학생 자율활동 등)
공용 공간의 활용성	• 홀베이스, 복도, 계단, 현관, 로비, 야외공간 등 • 다양한 용도로 활용(전시, 휴식, 공연, 학습 등)
동선의 효율화	• 학생 및 교사 이동 동선 고려 • 소음 및 활용 용도 고려 • 각 공간의 사용에 따른 효율적 배치
공간·교육과정의 연계성	• 학점제의 운영과 공간과의 연계성 • 단위 학교의 특징과 공간의 연계성 • 교수·학습 방법과 학습 공간의 연계성

» 학교 여건을 고려한 학점제형 공간 조성 배치 계획

〈표 11〉 학점제형 공간 조성 배치 계획

구분	내용
학점제 특징 반영 학교 공간 조성	• 학교 공간 및 교사 수급 등 학교 여건을 고려한 과목 개설·운영으로 학생 과목 선택권 지원 공간 조성 - 과목별 수강 인원에 따른 가변형 공간 구축 - 공간에 따른 휴식 및 자기주도학습 공간 구축 - 다양한 수업 형태에 따른 학생 자율활동 지원 공간 구축 • 미래지향적 교수·학습 평가체제를 위한 디지털 공간 조성 • 학생 맞춤형 진로·학업 설계를 위한 상담 공간 조성 • 최소 성취수준 보장 지도를 위한 공간 조성
단위 학교 교육과정 특징 반영 공간 조성	• 학교 간 공동교육과정 거점학교, 교과특성화 학교, 남녀 학생 구성, 교원 구성, 지역사회 자원 등 단위 학교 특징 반영 공간 조성 • 학생 및 학부모 의견 반영, 학교·지역 특성에 따라 다양하게 편성·운영되는 학점제형 교육과정과 학교 공간 연계성 강화
학점제형 공간 배치	• 단위 학교 선택과목 개설에 따른 이동 동선 최소화를 위한 사용자 입장 공간 배치 • 고교학점제 대비 학교 교육과정 운영, 시설 구조 등을 고려하여 수업 간 연계성을 높인 공간 배치

2) 단위 학교 공간 조성 준비 과정

» 학점제형 공간 조성을 위한 방향 설정

- 학점제 적용 학교 공간 조성 필요성 교육공동체 인식 공유
 - 학생·학부모·교사·교직원 등 교육공동체 설문조사 등 의견 수렴
 - 전교직원 연수 및 대토론회, 교육과정 설명회 등 역량 강화 및 인식 공유
 - 2022 개정 교육과정 및 고교학점제 전면 시행, 단위 학교 교육과정 운영 이해
- 학교 공간 조성 우수사례 공유를 위한 선진학교 탐방
 - 학교 공간 조성 시행착오를 줄이기 위해 공간 여건이 비슷한 학교, 학교가 목표하는 특화 공간과 유사한 공간이 조성된 학교, 우수사례학교 등을 섭외 및 방문 권장(사립학교의 경우 행정실장 동행 권유)
 - 학생 사용자 참여 설계 등으로 학생들도 함께 선진학교 탐방 가능
 - 다양한 유형의 선진학교를 방문하여 적용 가능한 다양한 아이디어 구상 활용


» 학점제형 공간 조성 TFT 구성 및 운영

• 학점제형 공간 조성 TFT 구성

- 학교장을 중심으로 교사, 학생, 학부모 그룹을 다양하게 구성하며, 학생 대표 그룹을 포함하여 학생들의 의견이 잘 반영될 수 있도록 구성
- 개별 참여자가 여러 공간에 대한 아이디어를 구상하는데 한계가 있으므로 공간별로 그룹을 나누어 운영 권장(학생, 교사 포함 공간별 3인 이상 구성)
- 그룹 간 소통이 부족하면 공간 조성의 전반적인 일관성이 낮아질 수 있으므로, 일관성을 유지할 수 있도록 중심을 잡아주는 역할이나 의사소통을 촉진하는 역할의 담당자를 Small TFT에서 별도로 지정하여 운영할 수 있음
- 관련 업무의 공평한 배분과 명확한 업무 분장이 필수적이며, 고교학점제 담당 부서, 교육과정부, 학년부, 교과대표 등 전 교사들의 고른 참여를 통해 일정한 역할과 책임을 분담해야 함
- 유관 업무 담당자의 TFT 구성 시 참여가 필수적이며, 예를 들어 행정실 업무 담당자 참여를 통한 건축, 재정, 행정 관련 업무 지원 권장

※ 학교 공간 조성 TFT 구성 가이드

- 학점제 대비 학교 공간 조성 추진을 위한 실질적 협의 기구 구성
- TFT 구성 규모는 단위 학교 상황과 여건에 따라 확대 또는 축소 가능
- 학교 상황에 따라 보직교사협의회, 교과협의회, 교육과정위원회 등 활용 가능
- 학교 상황에 따라 학생 및 학부모 등 교육공동체 TFT를 구성하여 다양한 교육공동체 의견 수렴 및 전달 가능
- 학교 여건 및 상황을 고려하여 학교 공간 조성, 교육과정 운영, 공간 활용 등을 지원하는 하부 조직으로 지속적 운영 가능

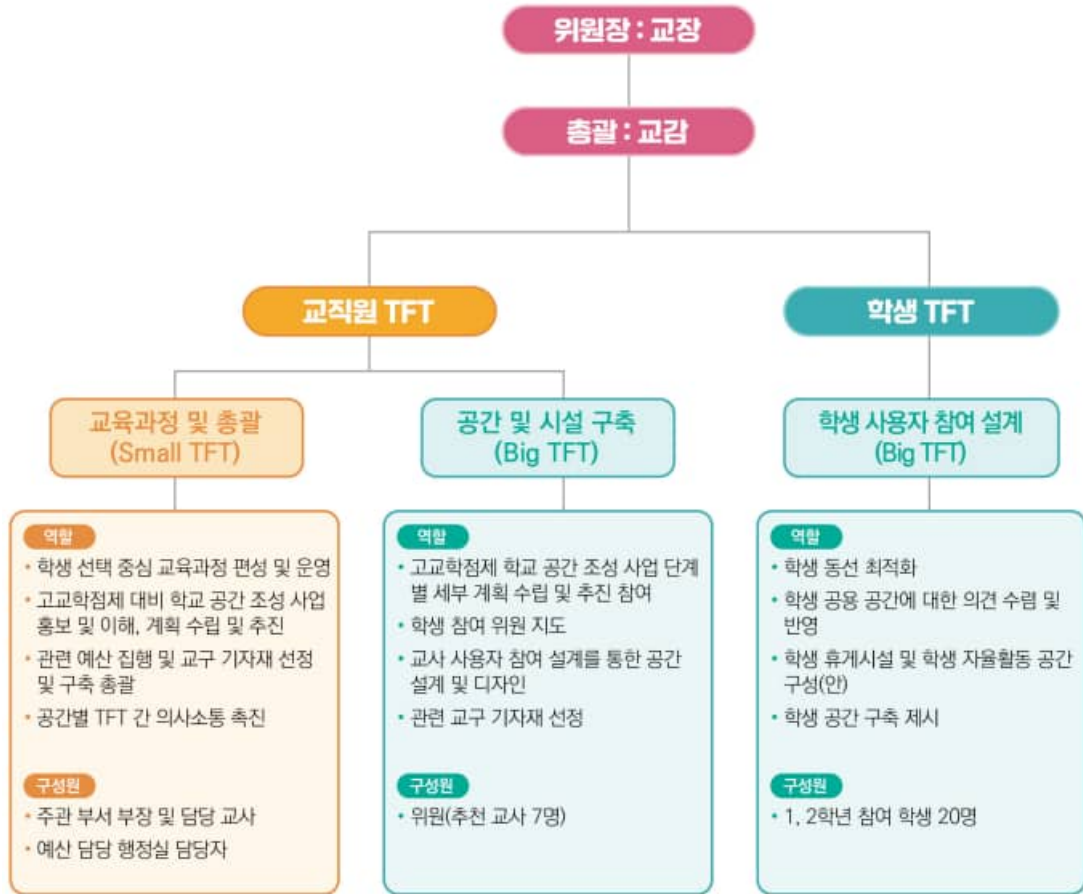

조직	구분		직급	역할	공간 배정
위원장	Big TFT	Small TFT	교장	사업 업무 지도 감독	공간 구축 총괄
총괄			교감	사업 업무 총괄	
위원			사업 담당 부장	사업 업무 계획 수립 및 시행	
			사업 담당 교사	TFT 회의록 작성 및 관련 업무	
			교육과정 담당 부장	고교학점제 연계 운영 관련 업무	
			행정실(과)장	사업 예산 집행 및 시설 구축 지원	
			교육정보부장	교구기자재 선정 및 구입 지원	
		교과 대표 교사1	공간 의견 수합 및 공간 구축	공간1, 2	
		교과 대표 교사2	공간 의견 수합 및 공간 구축	공간1, 2	
		⋮	⋮	⋮	
		교과 대표 교사7	공간 의견 수합 및 공간 구축	공간9, 10	
학생1	공간 의견 제안	공간1, 2			
학생2	공간 의견 제안	공간3, 4			
⋮	⋮	⋮			
학생20	공간 의견 제안	공간9, 10			

[그림 7] 학교 공간 조성 TFT 구성 조직도

- 학교 공간 조성 TFT 운영

〈표 12〉 학교 공간 조성 TFT 운영

구분	예시
역할	• 고교학점제 운영을 위한 학교별 방향성 정립 및 운영 계획 수립 (예: 선진학교 탐방 및 연수, 인사이트 투어 등 중점적 활동) • 사업 단계별 세부 계획 수립, 추진 상황 점검 및 추진 계획 수정 • 공간 설계 디자인 구축 및 기자재 구입 (예: 사용자 참여 설계를 통한 수업 공간 기획 및 설계, 교구 기자재 선정·구입 및 교구 기자재 불용 처리 등)
운영 방법	• 협력적인 업무 추진을 위한 협의 정례화 • 협의 시간 확보를 위한 학사 일정 조율(예: 매주 금요일 4교시) • 협력적 실무 추진을 위해 토의·토론 중심 민주적 협의 운영

※ 학교 공간 조성 TFT 운영 TIP

- 구성 시기: 새 학년도 업무 분장 전에 구성 권장
 - 신학기 준비 기간에 교과협의회 시 교과별 고교학점제 대비 학교 공간 조성사업 업무 담당자 선정 권장
- 구성 대상 범위: 예산 집행, 교구 기자재 선정, 교육과정 운영 등 관련 분야 협의가 가능하도록 유관 업무 담당자 참여 및 다양한 구성원 의견 반영할 수 있도록 구성
- 운영 횟수: TFT 협의 정례화
 - 학사 일정 조율 및 시간표 작성 시(예: 금요일 4교시) TFT 협의 시간 확보
 - 신설 업무 발생 시 비정기 협의 가능
- 운영 형태: 위원장 또는 업무 담당 부장 진행
 - TFT 위원 외에도 사업에 관심이 있어 참여를 희망하거나 공간 구축 및 설계 시 필요한 구성원의 참여를 유도하고, 소통 및 협의 유도
 - 학교 관리자를 포함한 TFT 구성원 모두가 고교학점제 개념 이해, 학교 공간 조성 방향 이해를 통한 민주적이고 협력적 분위기 유도
- 유관 업무를 주관하는 교사의 교육 활동이 저해되지 않도록 업무상 배려와 행정적 지원이 필요함

3) 학점제형 공간 조성 퍼실리테이터 위촉 및 운영

▶ 퍼실리테이터 위촉

- 퍼실리테이터란?
 - 건축가나 학교 분야 전문가가 학점제형 공간 조성 사업의 원활한 진행을 돕는 조력자
- 퍼실리테이터 위촉
 - 퍼실리테이터 위촉에 필요한 예산 배부 등 시·도교육청 및 단위 학교 상황과 여건에 따라 위촉/비 위촉을 결정할 수 있음

※ 단위 학교 퍼실리테이터 위촉 가이드

- (기간) 위촉 시기는 시·도교육청 및 단위 학교별 상황에 따라 사업 추진 초기·중기·말기 등 다양하게 운영되고 있음
- (예산) 위촉 기간 또는 과업 지시 범위에 따라 1,000~5,000만원까지 단위 학교별 상이함
- (역할) 단위 학교별 퍼실리테이터 위촉 시 용역 과업지시서에 요구하는 역할 범위를 시기와 함께 명확하게 명시하는 것을 권장함
- (선정) 학교 공간 전문가, 건축 분야 전문가, 실내디자인 관련 전문가 등 선정
 - 1순위: 건축 분야의 전문성과 교육과정 이해도가 있는 학교 공간 전문가
 - 2순위: 학교 공간 설계 경험이 있는 건축사나 인테리어 전문가
 - 3순위: 사업 추진 효율성을 위한 학교 근거리 인테리어 전문가

» 퍼실리테이터 운영

- 퍼실리테이터의 역할
 - 사용자 참여 설계⁵⁾ 추진 과정에서 워크숍 진행, 기본설계도 작성, 실시설계 및 시공 단계 자문·지원 등
 - 기본설계 단계에서 학점제 운영에 적합한 미래지향적 '기본설계 디자인'을 제안하고, 설계·시공 단계에서 기본설계 디자인이 구현될 수 있도록 컨설팅 수행
- 퍼실리테이터 주요 과업
 - 사용자 요구 분석을 위한 기초 조사 도구 마련
 - 고교학점제 구현을 위한 최적의 대상 공간 후보 제안
 - 학교 공간 재구조화 및 공간 조성 사업 목표 공유를 위한 연수
 - 인사이트 투어 진행 및 국내·외 학교 공간 조성 우수사례 조사
 - 건축 기초 교육 및 다양한 사용자 참여 설계 도구 활용 설계 워크숍
 - 사용자 의견 수렴 기반 기본계획 설계안 작성 및 사용자협의회(워크숍) 진행
 - 사용자 참여 설계 보고서 작성
 - 건축, 설비, 전기, 통신 등 다양한 분야의 재료 마감과 시공 방법 제안 및 자문
 - 실시설계와 시공 단계에서 사용자 참여 설계 내용 반영 여부 소통 및 점검

5) 사용자 참여 설계(사용자 참여 디자인)란?

: 구축하고자 하는 공간에 대해 학교 사용자(학생, 교직원, 학부모, 지역주민 등)가 주도적으로 참여하여 원하는 공간에 대한 아이디어와 요구사항을 건축디자인에 반영하는 설계 진행 과정을 의미함

▶ 퍼실리테이터 위촉 추진 방향

- 학교 사용자(학생, 교직원, 학부모, 지역주민 등) 측면에서 교육과정 및 학사 일정 분석
- 단위 학교 공간 환경과 교육과정 운영 상 문제점 및 개선 수요 파악
- 사용자가 원하는 미래학교 공간 조성과 교육과정 운영이 가능하도록 방향 제시
- 학교 내 교육 공간의 유기적 연결, 건축물 배치 계획, 사용자 요구 파악 등을 기반으로 한 학교 특화 모델 도출

▶ 퍼실리테이터 추진 주요 절차⁶⁾



[그림 8] 퍼실리테이터 추진 절차

〈표 13〉 시기별 퍼실리테이터 추진 절차와 내용

시기	과정	내용
5월	위촉	• 퍼실리테이터 위촉 및 용역 계약
6월	1 사전 조사 및 협의	• 현황 조사 - 사용자와 추진 일정, 교육과정, 현재 학교 공간 등 확인 • 현황분석 - 현황 조사한 내용을 분석·정리하여 공간별 개선사항 및 대상 공간 기획
	2 사업설명회	• 사업설명회 - 교육공동체와 함께 사업 개념 정리, 주안점, 사업 일정 계획, 사업 대상 공간 등 설명회 개최
7월	3 사용자 참여 설계	• 사용자 참여 설계 기획 - 현황 분석 및 사업설명회 시 제안된 내용을 바탕으로 사용자 참여 설계 용역 추진 방향 및 방법 기획 • 미래교육 비전 및 목표 도출 - 학교 교육과정을 바탕으로 미래 교육에 대응하는 학교 비전 및 구체적 목표 도출 • 교육과정 및 공간 워크숍(총 4회 실시) - 사용자 참여 수업(설문조사, 토론, 모형 등)과 각종 워크숍을 통해 학교 탐색, 현재 학교 공간의 문제점, 공간 디자인 방향 설정, 아이디어 도출 등 다양한 사용자 의견 수렴
8월	4 공간 조성(안) 작성	• 미래교육 비전 및 목표를 반영한 스페이스 프로그램 제작 • 공간 조성안 관련 자료 작성 - 실별·기능별 특성에 맞는 실내디자인 콘셉트, 가구, 조명, 색채 등 공간 조성 관련 자료 작성

6) 출처: 김포하성고등학교(2023)

시기	과정	내용
9월	5 특화 계획 수립	- 공간조성안 특화 계획 수립 - 학교 특색 반영 공간 조성 특화 모델을 발굴하고 학교의 공간 조성 사업 특화 계획 수립 - 공간조성안 평면 계획 수립 - 특화 계획 및 스페이스 프로그램을 바탕으로 디자인 방향에 충족하는 평면계획 수립
	6 공간 디자인(안) 도출	시각화한 최종 디자인안 도출
10월	7 최종보고회	- 최종보고회 - 사용자 참여 설계 워크숍에 참여한 주체 외 학생, 교육청 담당자(시설 및 교육과정), 실시설계자 등을 포함하여 자료 공유 및 최종 결과보고회 개최 - 최종보고서 작성

» 사용자 참여 설계 시 퍼실리테이터의 과업 수행 기본사항

- (사업 방향 제시) 사용자 관점에서 학교 비전과 목표를 달성할 수 있는 다양하고 유연한 환경 모델 제시
- (사용자 역량 강화) 학교 교육과정 기반 비전과 공간 조성 목표 설정을 위한 사용자 역량 강화를 위해 사업설명회, 워크숍, 기초 연수 등 운영
- (사용자 요구 조사) 교육공동체 대상 공간 조성에 대한 기본 개념, 방향 등을 설명하고 사용자들의 공간 구성에 대한 요구 및 디자인 요소 조사
- (법적 기준 검토 및 제반 사항 협조) 사용자 참여 설계 단계에서 관련 법적 기준을 충분히 검토하여 실시설계 연계 시 건축 협의 관련 제방 사항 검토가 이루어질 수 있도록 적극 협조
- (적절한 예산 사용 계획 수립) 예산액 범위 내 사업 물량을 준수하여 예산 사용 계획을 세우는 것을 원칙으로 함

2. 자료 조사 및 방향 설정

가. 연수

1) 연수의 필요성

» 학점제 기반 조성을 위한 출발점

고교학점제 학교 공간 조성 사업은 공간의 변화로부터 수업과 평가, 그리고 교육과정의 변화 등을 실현할 수 있는 핵심적인 사업임. 우리 학교 실정과 여건에 맞춰 특색 있는 교육과정이 운영되고, 전문적 학습공동체를 중심으로 운영 내실화를 완성할 수 있는 그 기반을 마련할 수 있어 역량 강화의 장이 됨

- 학점제 기반 조성을 위한 중점 사안
 - 변화하는 교육과정의 안정된 정착을 위한 변화된 교육 공간의 필요성 인지
 - 학생 참여형 수업과 평가 내실화를 위한 학교 공간 변화 당위성 확인
 - 교과별·교과 간 소통 기반 협업으로 학교 특색에 맞춘 학교 공간 기획

[예시1] 변화하는 교육과정 운영을 위한 공간 질문	[예시2] 학교 특색에 맞춘 공간 조성을 위한 질문
특성화교실: 리모델링 컴퓨터 활용공간(정보, AI, IT관련)을 확보하고 싶은데, 어떻게 변경하죠?  출처: 서울남영학교, 2019 출처: 평택고등학교, 2019 권원보 학교AMM 507기원관	공용공간: 리모델링 복도공간에 사물함을 놓거나, 정보검색대를 놓고 싶어요!  출처: 서울명학초, 2017 출처: 영미여고, 2020 권원보 건축법 시행령 제48조

출처: 한국교육개발원(2023a:39, 2023a:43).

[그림 9] 학점제 기반 조성을 위한 역량 강화 연수 예시

» 학교 문화 및 운영 혁신을 위한 전환점

고등학교는 교과를 중심으로 한 교육과정 운영으로 타 교과 간 갈등 및 행정 부서 간 대립이 발생할 수 있어 학교 공간 조성 사업을 통해 협력적 문화를 조성하는 기회를 마련할 수 있음. 기획 단계에서 교과별 차이점을 인지하고, 우리 학교 실정 확인으로 모두가 공감하는 학교 특색에 맞는 학교 공간 조성으로 학점제 운영을 위한 협력적 문화 조성을 가져올 수 있음

• 협력적 학교 문화 조성을 위한 중점 사안

- 교과별 이질적 모둠을 구성하여 팀별 활동 진행으로 교과 간 생각 차이를 확인
- 교과 간 다양한 입장 차를 공통점과 차이점으로 분류하여 입장 차에 대한 조율
- 학교 여건과 특색 등 우리 학교 실정에 맞는 공간 조성에 대한 고민 공유



출처: 광양백운고등학교 누리집(2022).

[그림 10] 협력적 학교 문화 조성을 위한 연수 사례(광양백운고등학교)


2) 연수 운영 전 준비 사항

▶ 사용자 참여 주체(또는 학교 공간 조성 TFT) 사전 조율

사용자 참여 설계를 중심으로 조성되는 고교학점제 학교 공간 조성은 다수가 참여하는 사업의 특성상 조성 사업의 목적 및 이념과 다른 사용자 합의에 따라 공간이 조성되는 경우가 발생할 수 있음. 이를 방지하기 위해 사용자 참여 주체 사전 조율로 관련 연수에서 고교학점제 공간 조성의 방향과 조성 및 활용 원리를 확인하고 안내할 수 있는 네비게이터(향해사) 역할을 수행할 수 있도록 함

• 사용자 참여 주체 사전 조율 시 중점 사안

- 학점제 교육과정 운영을 위한 공간 점검 및 필요 공간 확인
- 고교학점제 공간 조성 방향 인지 및 대상 학교 공간 사전 인지 및 예상
- 목표 공간과 유사하게 조성된 선진학교 및 우수사례 선정 후 자료 준비

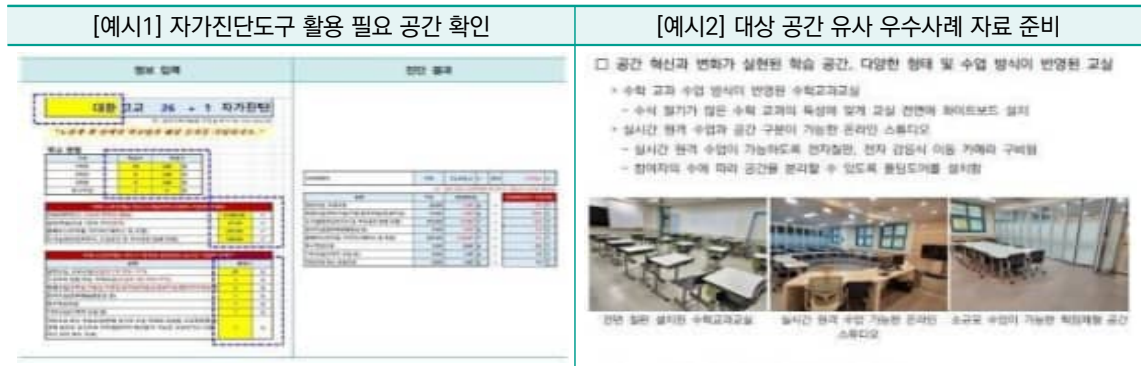

출처: 한국교육개발원(2023b:16, 2023b:200).

[그림 11] 사용자 참여 주제 사전 조율 예시

» 연수 내실화를 위한 프로세스 설계

고교학점제 학교 공간 조성은 사업 이해로 출발해서 공간 기획, 과업 과정, 준공 이후 활용 방법 등 과정과 목적에 따라 교원의 참여 및 역량 강화를 위한 준비가 요구됨. 업무 담당자는 사용자 참여 주체(또는 학교 공간 조성 TFT)와 함께 공간 조성 및 활용 내실화를 위한 체계적인 연수 프로세스를 기획하여야 하고 학교 구성원 모두의 적극적인 참여를 독려할 수 있는 방안을 모색하도록 함

- 연수 운영을 위한 프로세스 설계 시 중점 사안
 - 사용자 참여 주제 사전 조율 자료로 선택과 집중 연수 시작
 - 사업 이해 및 공간 기획, 과업 과정, 활용 방법 등 연수 진행 틀 기획
 - 연수 대상을 명확히 하여 단순한 전달 연수로 운영되지 않도록 설계



[그림 12] 사용자 참여 주제 사전 조율을 통해 기획된 연수 프로세스 예시

3) 프로세스 기반 연수 운영

▶ (1단계) 사업 이해 연수

학점제형 학교 공간 조성을 통해 학점제형 교육과정이 학교 특색에 맞춰 운영될 수 있도록 공간 조성 우수사례나 한국교육개발원에서 제시하는 프로토타입 사례를 공유하는 등 사업의 취지와 목적을 학교 구성원 모두가 공감하고 이해하는 단계

- 중점 사안

- 첨단 기술 환경으로 시·공간적 경계를 넘은 미래형 교수·학습 공간 확인
- 우수사례 공유를 통한 진로·학업 설계 지도 중요성 및 지원 공간의 필요성 인지
- 학교 특색에 맞춘 학생 선택형 교육과정 운영을 위한 공용 공간 조성 방향 논의

- 주의 사항

- 학교 환경 개선 사업이 아닌 학점제 교육과정 운영을 위한 초석임을 주지
- 학점제형 공간 조성의 방향과 ‘조성 및 활용’ 원리 실현의 중요성 충분히 안내
- 사용자 참여 주체 중심의 연수 진행으로 사업 진행의 방향성에 대한 공감대 조성

▶ (2단계) 공간 기획 연수

사용자 참여 주체를 중심으로 안내된 사업의 방향성과 학교 구성원이 선호하는 공간적, 디자인적 요소를 반영하여 수립된 계획을 중앙컨설팅에서 제공하는 교육과 건축의 최적화된 제언과 융합시켜 단위 학교의 특성에 맞는 학점제 공간 조성 방향과 콘셉트를 결정하는 단계

- 중점 사안

- 공간의 변화를 통해 수업의 변화, 교육과정의 변화가 이루어질 수 있도록 독려
- 다양한 교수·학습 방법 운영 효율화를 위한 현재 학습 환경 분석 및 대안 제시
- 중앙 컨설턴트의 컨설팅 과제가 반드시 이행될 수 있도록 이해 및 대안 공유

- 주의 사항

- 교사는 학점제 교육과정 운영을 위한 공간 조성으로 과제를 수행하도록 논의
- 학생은 적극적인 의사 개진으로 사용자 참여 설계가 잘 진행될 수 있도록 소통
- 퍼실리테이터는 중앙컨설팅 내용이 교육과 건축으로 잘 적용되도록 촉진

» (3단계) 과업 과정 연수

학교 공간 조성 사업의 방향과 ‘조성 및 활용’ 원리가 학교 시설과 구조에 반영되어 사업이 진행되고 있는지를 학교 구성원 모두가 참여하여 세부 추진 현황을 공유하고 기획자와 설계자가 사용자의 의견을 잘 구현하고 있는지를 확인하는 단계

- 중점 사안
 - 교사의 참여로 설계된 미래형 교실이 구상에서 실현이 어떻게 진행되는지 공유
 - 학생이 제시한 의견이 구현된 설계 및 과정 안내로 공간 활용에 대한 책임감 부여
 - 예산 제약 등 학점제 운영 어려움 대체 방안 제시(온라인 학교, 지역사회 연계 교육 등)
- 주의 사항
 - 사용자와 기획자, 설계자와 시공자가 다르므로 반드시 확인 절차가 필요함을 공지
 - 학생의 의견이 반영된 디자인 요소 및 공간 조성으로 공간 주권을 실현하도록 안내
 - 집합 연수 또는 교내 게시판 및 메신저 등 자료 활성화로 수시 안내 및 공유 중요

» (4단계) 활용 방법 연수

공간 활용의 질을 제고하고, 조성된 공간의 성과를 평가하며, 사업에 참여한 사용자가 학교 특색을 기반으로 공간과 교육과정 연계성을 실현하기 위한 과정으로 조성 공간 사용자들에게 공간 사용 및 이용에 대한 방법 안내로부터 지속 가능한 발전을 완성해 가는 단계

- 중점 사안
 - (참여 사용자 대상) 공간 활용 극대화를 위한 사용자 중심 학교 공개의 날 진행
 - (신규 사용자 대상) 공간 조성 과정 및 사용 방법에 대한 학점제 교육과정 연수
 - (참여·신규 모두) 예약 및 사용 권한 프로그램 연수 및 기자재 활용법 연수
- 주의 사항
 - 참여한 사용자만을 중심으로 공간이 활용되지 않도록 주의
 - 소수가 공간을 독점하고 활용하지 않도록 공용 공간을 중심으로 활용 방법 연수
 - 활용 방법 연수로 공간 활용 문제점 개선 및 추가 공간 조성을 위한 기타 사업 선정

〈표 14〉 연수 프로세스 단계별 추진 시기 및 대상(또는 내용) 계획 예시

프로세스	시기	내용	대상
1 사업 이해 연수	2월	• [새 학기 준비 기간] 고교학점제 운영 사례(학교 공간 조성 사업 포함) 연수	교사
	3월	• [새 학기 오리엔테이션] 학교 공간 조성 사업 중점 고교학점제 운영 계획 안내	학생
		• [학부모 상담 주간] 학교 공간 조성 사업 중점 고교학점제 운영 계획 안내	학부모
2 공간 기획 연수	4월-7월	• [교과 연계 수업] 미래형 학습 공간 조성을 위한 다양한 교과 수업 진행	사용자
		• [대상 동아리 운영] 사용자 아이디어 및 요구사항 확인을 위한 참여 수업 운영	촉진자, 사용자
	7월	• [수업량 유연화 주간] 공감과 소통을 위한 학교 공간 조성 설계 발표 연수(학생 참여형 수업 및 평가 혁신을 위한 기자재 시연회 등)	사용자
3 과업 과정 연수	9월-12월	• [상시] 과업 과정 안내 및 공유(학교 게시판 또는 학교 메신저 활용)	학교 구성원 전체
	12월	• [수업량 유연화 주간] 모두가 주인공 학교 공간 조성 공개의 날 운영	학교 구성원 전체
4 활용 방법 연수	12월	• [수업량 유연화 주간] 조성 공간 활용 연수 및 학생 중심 공간 주권 강화 연수	사용자
	익년 2월	• [새 학기 준비 기간] 학교 공간 조성 사업 안내 및 공간 활용 방법 연수	신규 사용자

*가상으로 작성된 예시로 학교 일정과 상황에 따라 기획하여 운영할 수 있음

나. 사용자 협의회

1) 학교 공간 조성 사업의 목적 및 학교 시설과 구조를 고려한 방향성 설정

» 학교 공간 조성 사업의 세부 추진 계획에 대한 협의

- 교과별 수업과 창의적 체험활동이 연계되고, 미래학교 모습에 대해 고민하여 온·오프라인 수업이 모두 가능한 미래교실 구축. 에듀테크 기술을 활용한 다양한 교수학습 공간 구현. 학생 선택 중심 교육과정 및 블록타임수업 등 학생들의 관심과 진로에 따라 자신의 삶을 스스로 디자인해 나가도록 다양한 교육프로그램을 운영하는 우수사례들을 벤치마킹하여 구축
- 학교 구성원들의 학점제 학교 공간 조성에 대한 다양한 의견을 수렴하여 학교 실정에 최적화된 교과교실제 모습을 구상하여 실현. 일반교실, 소강의실, 대강의실 등 다양한 크기의 수업 공간을 만들고, PBL실, 모둠학습실, 토의토론실 등 다양한 학생 참여형 수업이 가능한 공간 조성

- 하고 싶은 수업을 구상하고, 하고 싶은 수업을 위해 필요한 공간과 기자재 등에 대해 구성원들이 협의하여 다양한 수업 공간을 설계하여 구축. 교사들에게 필요한 공간(교과연구실, 협의회실)과 학생들에게 필요한 공간(모둠학습실, 홈페이지, 동아리 활동 공간 등)에 대해 의견을 적극적으로 수렴하여 다양한 공간 설계
- 학습 공간의 유연성, 지원 공간의 복합성, 공용 공간의 활용성, 동선의 효율화, 공간과 교육과정 간의 연계성 등을 고려해 학점제 학교 공간의 모습을 결정하고, 추진계획을 체계적으로 수립하여 적극적으로 실행. 새로운 교육 환경의 필요성에 대해 능동적으로 대응하고, 고교학점제의 안착과 효율적 운영의 기반이 될 수 있는 교육 환경으로 개선

» 공간의 활용도를 고려하여 다기능의 공간으로 재구조화

- 현재 보유한 교실 수, 유휴 공간, 학교 공간의 활용도 등 점검
- 현재 학교 상황에서 활용도가 높은 공간과 낮은 공간을 분류
- 필요한 학교 공간에 대한 구성원들의 의견 수렴 및 우선순위 결정(가장 필요한 공간의 우선순위를 정하는 사전 작업이 꼭 필요)
- 현 학교 상황에서 필요한 공간의 우선순위를 결정하여 공간 조성안 마련
- 활용도가 낮은 공간이 다양한 기능을 할 수 있는 활용도 높은 공간이 될 수 있도록 재구조화 방안 구상
- 변화하는 교육 환경에 대응하여 새롭게 추가되는 학습 공간의 활용도를 최대한 높일 수 있는 방안을 적극적으로 모색

2) 사용자 협의회를 통해 학교 공간 조성의 출발점 찾기

» 새로운 학교 공간에 대한 출발점 협의



[그림 13] 사용자 협의회 진행 프로세스

» 사용자 협의회 운영 사례

학교의 교육 비전 제시하기	학교 공간 조성의 의미 찾기
출발점1 학교의 교육 비전 비전 미래교육을 선도하는 행복한 잠실이 배움터 추진중점 ✓ 핵심역량을 키우는 창의융합교육 ✓ 행복 감성을 키우는 문화교양교육 ✓ 품격 있는 인성을 키우는 세계시민교육	우리의 출발점은 학교공간 바꾸기 - 학생의 학교살이를 디자인 하는 일 - 학교에서 우리가 원하는 삶 찾기
학교 공간 조성의 목표 설정하기	기존 학교 공간의 활용도 점검하기
어떤 공간을 만들 것인가 • 학교의 가치를 담은 공간 • 학교 살이 이야기를 담은 공간 • 학생과 교사의 꿈을 담은 공간 • 잠재적 교육과정을 담은 공간	
새로운 학교 공간에 대한 출발점 찾기	새로운 학교 공간의 조성안 마련하기
	새로운 학교 공간은 • 예술적 감수성과 자율성을 키우고 공동체를 생각하며 협동과 소통이 이루어 지는 학교 공간 • 미래에 확장시점을 생각할 때 추억거리가 많은 학교 살이가 이루어질 수 있는 학교 공간 • 교사와 학생들의 꿈을 담아 상상하는 모든 활동과 수업이 가능한 학교 공간 • 수업의 수혜가 되고 공간을 누리는 것 만으로도 배움이 일어나는 학교 공간 가치 이야기 꿈 교육과정

출처: 한국교육개발원(2022:36-38, 2022:40-41).

[그림 14] 사용자 협의회 운영 사례(대전여자고등학교)

3) 사용자 협의회를 통해 학교 공간 조성안 마련하기 : 공간 재구성을 위한 스케치 등을 통해 다양한 아이디어 도출

» 교사 의견 수렴을 위한 교사 TFT 협의회 운영 사례



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 15] 교사 TFT 협의회 모습(부산센텀여자고등학교)

교사 TFT 협의회 구성안(목적형 교실 및 표준형 교실)

구 분	국어과 협의회 의견	영어과 협의회 의견	수학과 협의회 의견	사회과 협의회 의견	과학과 협의회 의견	교양교과 협의회 의견
목적형 교실 (특별실)	- 유리창 제외한 3면이 화이트보드 설치하여 학생 참여 유도 - 이동과 재배치가 가능한 책상과 의자 - 스마트 수업 가능한 공간 - 학생발표무대가 있는 공간 <기자재 및 비품> 이동용이한 책상과 의자, 화이트보드 3개, 교사용 컴퓨터 및 프린터, 발표무대	- 수업의 다양한 발상성(듣기, 읽기, 말하기, 쓰기)을 지원할 수 있는 교실 - 물기: 포켓형 청학환경 - 읽기: 미러링, 판서 - 쓰기: 즉각적 피드백과 공유 환경 - 말하기: 다양한 형태와 말하기와 도의도론 가능한 공간 <기자재 및 비품> 마음식 책상·의자, 컴퓨터, 스피커, 전자칠판이나 단초점, 화이트보드(터치펜 포함), 태블릿, 발표무대	- 최대 40인 수업 가능하도록 책상과 의자 배열(와이파이 형태) - 뒷자리에서도 볼 수 있도록 계단식으로 바닥 높이 조정 - 스마트 수업가능 공간 <기자재 및 비품> 책상, 의자, 전면 칠판, 미와 하단 수납장, 전자 칠판, 컴퓨터	- 토론 및 명상 상영이 모두 가능한 복합공간 - 강의 수업, 토론 수업에 따라 구조 변형 가능한 이동식 책상(콘센트설치책상)과 의자 <기자재 및 비품> 학생전원 사용가능 와이파이 구축(중복기), 학생 물품 보관용 캐비닛, 단초점프로젝트, 법랑칠판	- 대규모강의(40인) 및 토의토론이 가능한 공간 <기자재 및 비품> 와이파이, 단초점프로젝트, 데이터, 캐비닛, 다각형 책상(개인, 책상 붙여 모듈형), 스터딩 책상, 교구장	- 계단식으로 배치, 반원형으로 책상배치하여 집중도 극대화(40인실) - 1인 1PC 배치로 학습정리 및 수행과제를 실시간에 할 수 있도록 - 운동식(좌식) 강의실 (20인실) <기자재 및 비품> 법랑칠판, 스크린, 책상, 의자, 컴퓨터
표준형 교실 (행정학급)	- 이동 및 구조 변형이 용이한 책상과 의자 - 스마트 수업 가능 교실(교사용 노트북)	- 수업의 다양한 발상성(듣기, 읽기, 말하기, 쓰기)을 지원할 수 있는 교실 <기자재 및 비품> 단초점, 법랑칠판, 와이파이, 수업용 노트북	- 어떤 과목 수업도 가능한 교실 - 스마트 수업가능교실 <기자재 및 비품> 이동식 교탁, 빔프로젝트, 컴퓨터, 넓은 학생용 책상	- 토론 수업시 모든 학생들의 정보 검색이 원활하게 진행될 수 있는 교실 <기자재 및 비품> 학생 전원 사용 가능한 와이파이 구축(중복기 포함), 단초점프로젝트, 법랑칠판, 수업용노트북	- 빔프로젝트, 화이트보드 설치 - 교실 앞뒤로 스크린 설치하여 환경 불편함 해소 - 교실바닥 교체 - 높은 교탁으로 교체 - 책상 및 의자 교체	- 넓고 밝은 교실 - 오프라인 강의와 온라인 강의가 모두 가능한 교실 <기자재 및 비품> 환풍기, 제습기 설치
사물함 배치의견	복도 배치	복도 배치	학년별 홀비치에 배치	현재대로 교실 배치	현재대로 교실 배치	현재대로 교실 배치

[그림 16] 교사 TFT 협의회 사례(부산센텀여자고등학교)


» 학생 의견 수렴을 위한 학생 TFT 협의회 운영 사례



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 17] 학생 TFT 협의회 모습(부산센텀여자고등학교)

• 의견 수렴을 위한 학생 TFT 협의회 회의록

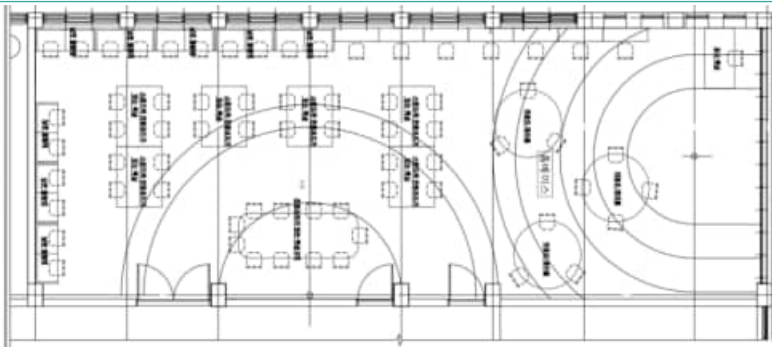홈베이스 구상안			
협의회 일시	1차 협의회: 4. 6.(수) 7교시 2차 협의회: 4. 13.(수) 7교시 3차 협의회: 4. 20.(수) 7교시 4차 협의회: 5. 4.(수) 7교시 5차 협의회: 5. 11.(수) 7교시	협의회 장소	인문사회카페
참석자 명단	학급 대표		
홈베이스 도면			
			
홈베이스 콘셉트			
- 편안하게 휴식할 수 있는 공간 - 답답하지 않고 개방감이 드는 공간 - 스터디 카페 같은 밝고 쾌적한 공간 - 팀별 과제 수행과 모둠별 활동을 지원하는 공간 - 학생들의 개성과 취향을 고려하여 다양한 형태의 책상과 의자 비치 - 노래하고 춤추며 학업 스트레스를 해소하고 기를 발산할 수 있도록 대형 거울과 음향시설 설치			

[그림 18] 홈베이스 구상안용 학생 TFT 협의회 회의록 예시(부산센텀여자고등학교)


4) 사용자 협의회 기반 학교 공간 조성 사례

» 학생, 학부모, 교직원 의견 수렴 사례

학교 구성원들의 다양한 의견 수렴 과정



학교 구성원들의 공간 조성에 대한 다양한 의견들

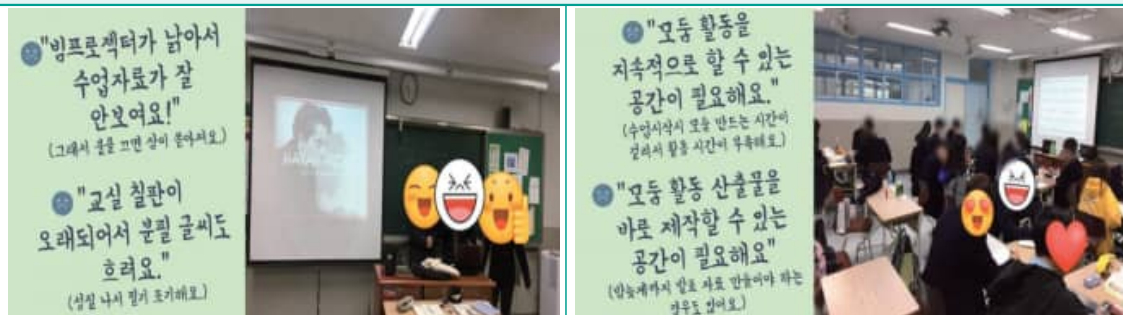

학교 구성원들의 의견을 기반으로 조성된 공간의 모습



출처: 한국교육개발원(2023a: 109-113)

[그림 19] 사용자 협의회 사례(방산고등학교)

다. 인사이트 투어(Insight tour)

1) 목적과 기대 효과

고교학점제 학교 공간 조성 사업은 고교학점제 도입에 따른 다양한 학생 선택과목 운영 및 미래 교육 환경 변화에 발맞추기 위한 필수적인 과정임. 고교학점제 학교 공간 조성 사업이 완료된 선진학교나 우수 공간을 방문함으로써 ‘고교학점제에 필요한 학교 공간의 모습과 교육과정 운영 방안’에 대한 인사이트를 얻을 수 있음. 학교가 당면하고 있는 문제에 따라 인사이트 투어를 얻을 수 있는 기대 효과는 다음과 같음

» 당면 문제에 따른 인사이트 투어의 기대 효과

● 당면 문제에 따른 인사이트 투어의 기대 효과 ●

01

문제 학교 공간 조성 사업의 목적과 방향성에 대한 학교 구성원의 이해가 부족해요.

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업을 교실 리모델링 사업이나 기존의 선진형 교과교실제 사업 등으로 잘못 이해하는 경우가 많으며, 이에 따라 담당자 한 명의 전담 업무로 오인하고 다른 교원들은 본 사업에 무관심한 경우가 자주 발생함
- 인사이트 투어를 통하여 본 사업의 목적과 취지에 대한 학교 구성원의 이해도를 향상시킬 수 있음

02

문제 본 사업을 통해 조성된 학교 공간이 실제로 어떻게 활용되는지 알고 싶어요.

- 초기에 구상했던 것과 사업 완료 이후의 실제 활용도는 차이가 많이 남. 활용도가 높은 공간과 그렇지 않은 공간에는 각각의 이유가 있으며, 이를 확인 및 분석함으로써 설계 완성도를 높일 수 있음
- 새로 조성된 공간에 대한 수요가 너무 많아 공간 예약 프로그램을 운영하거나, 다목적 공간 부족으로 교육과정 운영에 어려움을 겪는 경우, 또는 학생들의 이동 동선이 예상보다 길어지는 경우가 많이 발생함. 이와는 반대로 거의 활용되지 않는 공간도 생기기 때문에 이를 분석할 필요가 있음

03

문제 예산 사용 범위 및 유의 사항에 대한 정보가 없어요.

- 예산 집행 지침에는 일반적인 원칙만 언급되어 있는 경우가 많아 어느 곳에 어떻게 써야 하는지 실질적인 정보를 얻기 어려움. 동일 지역 학교의 사례를 참고함으로써 예산 활용 방안 및 유의 사항 등의 정보를 얻을 수 있음
- 동일한 품목이라도 어떻게 설치하느냐에 따라 예산 항목이 바뀔 수 있으므로 이에 대한 차이와 장단점을 비교 분석할 수 있음(세부 예산지침은 사·도교육청 별로 다르니 확인 필요)
- 예산 사용 시 품목 선정의 유용한 기준을 다른 학교로부터 참고할 수 있음. 단순히 가격을 최우선 기준으로 품목을 선정하는 것을 지양하는 것이 좋으며, 이에 관하여 내구성과 기능 및 원산지(국산 등)를 함께 고려하는 방안 등에 관해 의견을 구할 수 있음

04

문제 사업 진행 과정을 모르겠어요.

- 장기간에 걸쳐 단계적으로 진행되는 사업 과정에 대한 이해가 필요함. 다른 학교 사례를 참고하여 각 시기에 맞춰 우선 진행해야 할 일은 무엇인지 확인할 수 있음. 이 밖에도 사업 추진 과정에서 당면할 수 있는 각종 문제에 대한 정보를 얻게 되며, 인사이트 투어를 통해 형성된 인적 네트워크를 통해 추후 진행 과정에서 자문을 얻을 수 있음

학교가 당면한 문제가 무엇인지에 따라 인사이트의 기대 효과는 다름. 사업 진행 단계나 학교 구성원의 참여 의지 정도 등 다양한 요인에 따라 당면 문제는 다르므로, 이에 적합한 인사이트 투어 계획을 세울 필요가 있음

2) 시기와 대상 장소


인사이트 투어를 통해 얻고자 하는 바가 무엇이나에 따라 인사이트 투어 시기와 장소는 다를 수 있음. 인사이트 투어 시기와 대상 장소를 결정할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같음

» 인사이트 투어 시기에 따른 기대 효과

실시 횟수나 시기의 제한은 없으나, 공간 조성 시나리오 결정 전인 초반에 인사이트 투어를 실시하는 경우가 많음. 시나리오 결정 이후라도 실질적 노하우를 얻기 위한 TF팀 중심의 인사이트 투어가 유용함. 대상 학교와의 일정 조율이 필요하며, 시기별 기대 효과는 다음과 같음

- 학교 자가진단 전
 - 학교 공간 조성 사업의 목적과 방향성에 대한 학교 구성원의 이해도 향상
 - 학교 공간에 대한 고정관념을 깨고 다양한 아이디어를 얻을 수 있음
 - 사업 진행 과정에 대한 전반적 이해 및 업무 추진 노하우 습득
 - 학교 공간의 특징을 파악하고 자가 진단을 위한 기반 조성
- 학교 자가진단 후
 - 사업 추진 학교 공간의 특징을 바탕으로 다양한 공간 조성 시나리오를 구상
 - 자가 진단에서 발견된 문제점을 어떻게 해결하였는지 다른 학교 사례 참조
 - 공간과 교육과정의 연계성 측면에서 활용도나 효과 분석

- 공간 조성 시나리오 결정 후
 - 사업 진행 과정에서 발생하는 현안 문제의 다른 학교 해결 사례 참조
 - 담당자 면담 등을 통해 사업 추진의 노하우를 영역별로 구체화 및 체계화
 - 조성 공간에 적합한 기자재 및 비품 배치안 구상
 - 사업 우선순위 선정 사례 조사(예산 문제로 시나리오대로 추진할 수 없는 경우가 다수 발생)

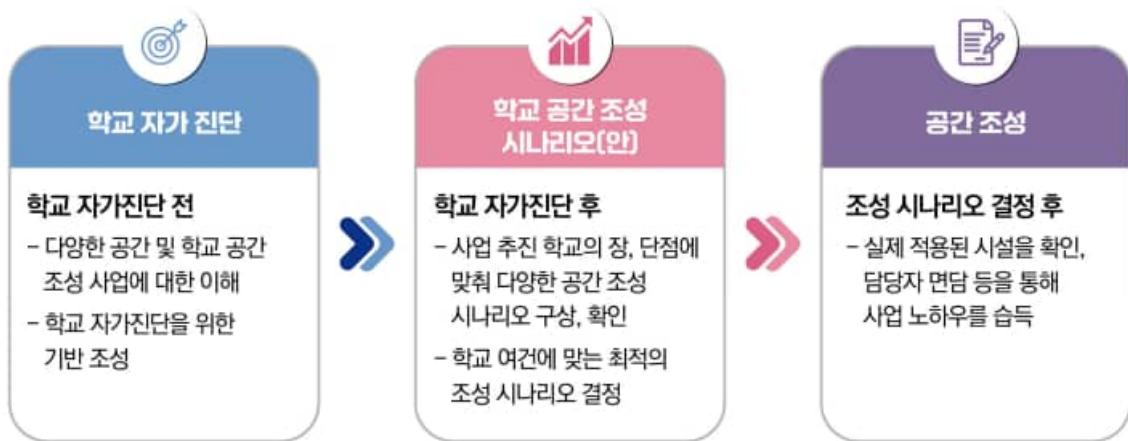

[그림 20] 인사이트 투어 시기별 목적

» 인사이트 투어 대상 장소 결정 시 고려 사항

장소는 학교로 한정 지을 필요는 없으나, 학교 공간의 목적성이나 예산 집행 조건의 특수성이 있으므로 고교학점제 학교 공간 조성 사업을 완료한 학교는 필수로 방문하는 것을 권장함. 우수학교뿐만 아니라 규모나 실질적인 도움을 얻기 위해 학교 특성이 유사한 학교도 방문하는 것을 추천함. 인사이트 투어 대상 선정 시 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같음

- 학급 수, 시설 규모, 남녀공학 유형, 교육과정 특징 등이 유사한가?
- 고교학점제 학교 공간 조성 사업 완료 후 운영 경험이 축적되어 있는가?
- 고교학점제에 맞는 교육과정을 실제 운영하고 있는가?
- 학생 선택형 교육과정, 스마트 교실, 가변형 구조, 학생 친화적 휴게공간 등 선도적 특징을 갖추고 있는가?


지역별로 사업을 완료한 학교의 단순 목록은 본 안내서의 부록 또는 고교학점제 홈페이지에서도 확인할 수 있으나, 교육청 담당 장학사로부터 목적에 맞는 자세한 정보를 얻을 수 있음. 장학사로부터

‘학교 규모가 비슷한 학교’, ‘도서관 리모델링이 잘 된 학교’, ‘홈베이스 조성이 우수한 학교’ 등을 구체적으로 추천해달라고 하는 것을 권장함. 담당 장학사는 사업 완료 학교 점검 및 컨설팅을 다녀왔으며 해당 지역 사정에 대해 잘 알고 있으므로 많은 정보를 얻을 수 있음

- 에듀넷 홈페이지(<https://www.edunet.net>) > 교육정책 > 고교학점제 > 자료실 > ‘2025년 학점제형 공간 조성 현황’

한편, 기존 학교에서 사례를 찾기 어렵거나 특화 공간을 목표로 하는 등의 특별한 요구가 있을 때는 대학, 청소년 문화시설, 국공립도서관 등의 학습 공간, 유명 건축물, 건축 박람회나 전시회 등 학교 외의 공간에서 인사이트 투어를 진행할 수 있으며, 고교학점제 홈페이지나 유튜브 등 SNS를 활용한 온라인 투어도 가능함

- 사진자료 온라인 투어: 에듀넷 홈페이지(<https://www.edunet.net>) > 교육정책 > 정책 안내 > 학교 공간 조성·활용(자세한 접속 방법은 부록 참고)
- 영상자료 온라인 투어: 유튜브 ‘고교학점제TV’ 검색

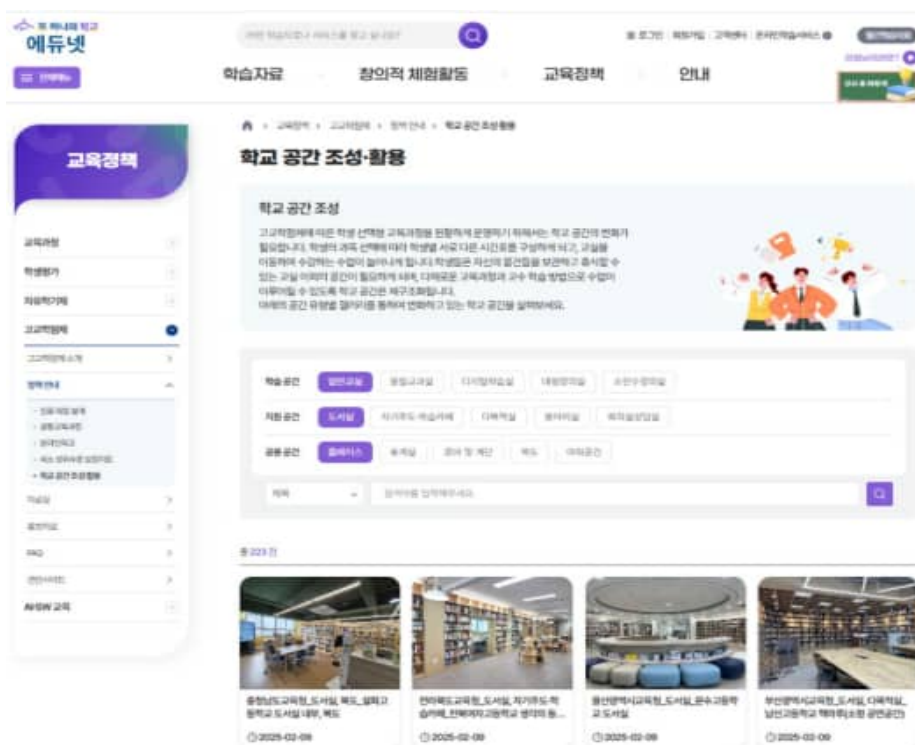

[그림 21] 사진자료 온라인 투어

3) 참여 규모

사업 추진 단계 초반에는 학교구성원의 사업 이해도 향상을 위한 대규모 인사이트 투어가 적합하나, 학사 운영 일정 등으로 구성원 대부분이 참여하는 인사이트 투어를 매번 실시하기는 어려움. 사업 후반 단계로 갈수록 당면 과제에 초점을 맞춘 워킹 그룹(TFT 등) 중심의 인사이트 투어가 효율적이며, 인사이트 투어 추진 자체가 또 하나의 업무 가중이 되지 않도록 학교 상황을 고려해 유연하게 실시할 필요가 있음. 참여 규모에 따른 주요 장점은 다음과 같으며, 각각의 장점을 고려하여 중규모로 참여단을 구성하는 것도 가능함

» 대규모 참여단 구성

- 학교 구성원 다수 참여(사용자 참여 유형에 따라 학생, 학부모도 참여 가능)
- 학교 공간 조성에 대한 교직원의 전반적인 인식 전환이나 비전 공유에 용이
- 일정을 맞추기 어렵고 단순 견학 위주의 인사이트 투어가 될 수 있음 → 사전 교육을 통해 투어의 목적과 개별 역할을 구체적으로 부여해야 함
- 소규모 그룹(부서 또는 교과)으로 나누어 그룹별 인사이트 투어를 실시하고, 결과를 워크숍 등에서 공유하는 사례도 있음(인사이트 투어 주간 운영)

» 소규모 참여단 구성

- 워킹 그룹(TFT 등)을 중심으로 사전 답사 및 전문적인 인사이트 투어를 진행
- 학교 공간 조성 추진을 위한 실질적인 정보나 행정 절차 등을 문의하기가 용이 → 대상 공간 담당 교사에게 질문할 사항을 미리 정리해 두면 많은 도움이 됨
(아래의 표 ‘인사이트 투어 질문 리스트’ 활용)
- 공간을 직접 활용해 보는 체험 중심의 인사이트 투어 권장
- 일정 조율 용이성 및 이동 편의성 좋음(하루에 다수 학교 방문도 가능)

4) 인사이트 투어를 위한 질문 리스트 예시

단순 견학 위주의 인사이트 투어가 되지 않기 위해서는 앞서 살펴본 바와 같이 학교의 당면 과제를 잘 파악하고 인사이트 투어의 목표를 구체화하는 것이 좋음. 인사이트 투어 시 이 부분을 구체적으로 질문한다면 실질적인 정보를 얻는 데 도움이 되니, 학교 상황에 맞는 질문 리스트를 사전에 준비하기를 권장함

〈표 15〉 인사이트 투어 질문 리스트(사업 완료 학교를 방문하는 경우)

	질문 내용	비고
1	사업 추진 시 무엇을 중점적으로 개선하고자 하셨습니까?	
2	기존 공간의 통폐합 시 어려웠던 점은 무엇입니까?	
3	초기에 구상했던 안과 달라진 부분은 무엇입니까?	
4	학생 이동 수업이나 확대 학급 수업은 얼마나 많이 이루어지나요?	
5	해당 공간을 실제 사용하시면서 느꼈던 문제점이 있습니까?	
6	공간 활용률이 많이 변화된 공간은 어디입니까?	
7	예상외로 예산이 많이 투입된 공간은 어디입니까?	
8	기타 실무적인 질의(업무 분장, 기자재 추천 등)	

» 질문에 대한 의도

- 사업 추진 시 무엇을 중점적으로 개선하고자 하셨습니까?
→ 학교마다 사업의 주안점이나 해결해야 하는 주요 과제가 다르므로 이를 확인
- 기존 공간의 통폐합 시 어려웠던 점은 무엇입니까?
→ 고교학점제 운영에 맞는 학교 공간을 조성하려면 기존 공간을 통폐합해야 하는 경우가 자주 발생하므로 이에 대한 조언 요청
- 초기에 구상했던 안과 달라진 부분은 무엇입니까?
→ 소방법, 건물 구조 등으로 인하여 구상대로 구현할 수 없었던 경우를 확인
- 학생 이동 수업이나 확대 학급 수업은 얼마나 많이 이루어지나요?
→ 고교학점제 학교 공간 조성은 교육과정 운영과 맞물려 있으므로 이에 대한 질의 필요(이동 동선의 용이성 등도 함께 확인)
- 해당 공간을 실제 사용하시면서 느꼈던 문제점이 있습니까?
→ 사업 완료 이후의 운영 경험, 문제점이나 개선할 점 등을 확인
- 공간 활용률이 많이 변화된 공간은 어디입니까?
→ 실질적으로 활용을 많이 하는 공간과 그렇지 않은 공간과 이유에 대해 질의

- 예상외로 예산이 많이 투입된 공간은 어디입니까?
→ 천장 공사, 방염 처리, 방음 공사 등 눈에 잘 띄지 않는 곳에 많은 예산이 투입되는 경우가 있음. 이외에도 생각하지 못했던 부분까지 함께 공사를 해야 하는 경우가 많이 발생하므로 방문 학교의 사례를 확인
- 기타 실무적인 질의(업무 분장, 기자재 추천 등)
→ 고민하고 있던 부분을 방문 학교는 어떻게 해결하였는지 질의

5) 자주 묻는 질문

Q 대규모 참여단 형식의 인사이트 투어를 반드시 실시해야 하는가요?

A 아닙니다. 학교 여건에 따라 참여 규모를 축소하여 실무자 중심으로 인사이트 투어를 실시해도 됩니다. 단, 학교 공간 조성 사업은 현재와 미래의 학교 구성원 모두에게 영향을 미치는 일이기 때문에 소규모 참여단 형식으로 실시하더라도 자체 워크숍 등을 통해 인사이트 투어 결과를 공유할 필요가 있습니다.

Q 방문 대상 기관을 위한 선물을 구입해야 하나요?

A 방문 대상 기관의 업무 담당교사(인사이트 투어 인솔 교사) 등을 협의회 또는 간담회 참석 대상으로 포함하여 업무추진비 예산 범위 내에서 간식 등을 구입할 수 있습니다. 예산 사용 지침은 시·도교육청별로 다르니, 컨설턴트 및 담당 장학사에게 문의하여 예산 집행 가능 여부를 미리 확인하시는 것이 필요합니다.

Q 방문 대상 기관 연락 절차는?

A 표준화된 절차가 있는 것은 아니나, 인사이트 투어가 가능한 일정을 확인하신 후 대상 학교에 방문 가능 여부를 유선으로 먼저 연락하는 경우가 대부분입니다. 일정을 확정하고 나면 방문 대상 기관에 협조 공문을 발송합니다.

6) 제언

- 인사이트 투어의 목적은 단순히 공간을 바라보는 것을 넘어서 해당 공간을 체험 해 보며, 공간을 적극적으로 이해하는 것에 목적이 있음. 따라서 짧은 시간 동안 공간을 순회하는 형태의 전통적인 견학 프로그램은 지양하고, 직접 공간을 사용하는 '체험 중심 인사이트 투어'를 권장

- 질의/응답 시간을 갖는 등 능동적인 활동이 되도록 추진 → 개별 역할 부여, 학교 실정에 맞는 질문 리스트 준비, 질문 시간 마련 등
- 방문 공간의 디자인을 무조건 수렴하기보다는 적극적으로 해당 공간에 대해 평가하고, 이를 통해 미래지향적인 교육과정과 공간 디자인을 이끌어 냄
- 방문 학교의 담당자를 통하여 ① 사업 추진 프로세스, ② 단계별 핵심 고려사항, ③ 공간 활용 실태, ④ 활용 측면의 공간 디자인 개선 사항 등 향후 사업 추진에 유용한 정보를 습득
- 방문 학교의 공간 조성 사업에 참여한 퍼실리테이터 또는 실시설계 건축사의 건축적인 설명을 함께 듣는 것을 통해 더 깊이 있는 인사이트 투어가 가능
- 학교 이외의 다양한 공간에 대한 정보 수집도 필요
- 인사이트 투어 후 공간 조성에 참여하는 각 구성원에게 정보수집 성과 및 도출된 평가에 관한 정보를 공유할 수 있는 장을 마련하도록 권장

3. 구체화

가. 사용자 참여 설계(교육 분야)

1) 교육 분야에서 사용자 참여 설계의 의미

- 사용자 참여 설계란 설계 단계의 전(全) 과정에 사용자가 참여하여 자신들의 의견을 충분히 반영함으로써 사용자에게 적합한 공간을 설계하는 것을 의미함
- ‘사용자’는 공간을 직접 이용하는 주체로서, 학교 공간을 대상으로 하는 경우에는 교육서비스 제공자(교장, 교감, 행정실, 교육청 관계자, 교사 등)와 교육서비스 수혜자(학생, 학부모, 지역주민)를 포함함⁷⁾
- 공간 조성 사업 목표 및 학교 공간 특성 이해, 인사이트 투어, 구성원의 요구 분석 등을 통해 얻은 기초 자료를 토대로 공간 조성의 방향을 설정하고 구체적인 시각적 결과물(사용자 참여 설계 보고서)을 산출하는 과정
- 2011년 처음 학교 건축에 사용자 참여 설계를 시도교육청 학교 공간 혁신 사업, 고교학점제 학교 공간 조성 지원 사업, 그린스마트 미래학교 등에서 적극 도입⁸⁾함에 따라 학교 공간 사용자의 만족도와 활용도를 제고함
- ‘사용자 참여 설계’는 ‘사용자 참여 디자인’이라는 용어와 함께 사용되고 있으며, 학교 공간 조성 사업은 학교 공간의 시각적 환경 개선에서 더 나아가 변화하는 교육과정을 담기 위한 새로운 개념의 공간을 디자인하는 것이 목적인 만큼 ‘사용자 참여 설계’는 학교 공간 조성 사업의 핵심적인 장치

2) 단계별 사용자 참여 설계 및 주요 내용

» 사업 목표의 이해

- 환경 개선을 위한 단순 리모델링 공사가 아니므로 학교의 교육활동 재구조화(ex. 업무부서 재조직, 관리실 재배치, 특별실 및 학급 교실의 재배치 등) 논의를 바탕으로 공간 조성의 방향을 설정
- 고교학점제를 구현하기 위한 공간 조성의 원리를 숙지

7) 임종헌, 김정아 외(2022: 20)

8) 임종헌, 김정아 외(2022: 21)

» 최적의 대상 공간 선정

- 대상 공간 선정 시 편의상의 이유로 유휴 공간(기존의 유휴 공간은 접근성이 떨어져서 유휴 공간이었을 가능성이 큼)을 대상 공간으로 선정하지 않도록 하며 반드시 고교학점제 운영을 위한 교육과정 편제 및 사용자의 동선을 확인하여 접근성이 높은 위치를 대상 공간으로 선정
- 가능한 많은 학급 교실에서 평등하게 접근할 수 있는 위치 선정
- 홈베이스, 도서관, 자습실 등의 지원 공간과의 연계가 유리한 위치 선정




[그림 22] 학교 공간 재구조화를 고려한 대상 공간 선정 사례(강릉제일고등학교)

» 사용자 그룹별 의견 수렴과 공유

- 교육기획 단계에서 활용하였던 사용자 그룹별 의견 수렴 방식을 건축기획 단계에서도 활용할 수 있음(한국교육시설안전원(2022) 활용)
- 다만, 교육기획 단계에서와 달리 사용자 그룹이 확대되므로 학생, 교직원, 학부모, 이해관계자, 지역주민 등 그룹별 적절한 방법론을 적용하는 것이 중요함(Y차트, 면담, 설문조사, 스티커 부착(포스트잇)을 활용한 선호도조사, 워크숍, 토론, 토의 등)
- 특히, 설문조사와 면담은 온·오프라인 방식을 다양하게 활용하되, 객관식과 주관식 항목에 대한 목적을 명확히 하여 시행하여야 하며, 그룹별 의견을 상호교차 분석해야 함
- 집단 아이디어 회의는 다양한 툴킷을 활용할 수 있으며, 해당 학교의 구성원들이 적극 참여할 수 있는 방법을 모색하여 시행
- 또한 수차례 의견 수렴을 하는 과정에서 통일된 방향으로 의견을 취합해 가는 것이 매우 중요함. 이를 위해 의견 수렴 단계에서 퍼실리테이터(사전기획가, 건축가 등)가 주축이 되어 우선순위에 따른 의견을 조율할 필요가 있음

» 사용자 참여 설계 운영 시 고려 사항

- 사용자 참여 설계 TFT(전담팀) 구성
 - 사업 기간 지속적인 참여가 가능한 그룹으로 구성
 - 학교장을 중심으로 교사, 학생, 학부모 그룹을 다양하게 구성하며 고등학교 운영 특징을 고려할 때 교사 그룹이 핵심적인 역할을 수행할 가능성이 높으므로 교사 그룹 구성에 집중(교과별, 학년별, 부서별 교사가 골고루 참여하도록 구성)
 - 개별 참여자가 여러 개의 공간에 대한 아이디어 구상에 한계가 있으므로 공간별로 그룹을 나누어 운영(학생, 교사 포함 공간별 3인 이상 구성)하되, 그룹 간 조성의 일관성을 유지할 수 있도록 중심을 잡아주는 역할이나 의사소통을 촉진하는 역할의 담당자를 별도로 지정할 수 있음
- 퍼실리테이터 위촉
 - 교육과정 및 학교 공간, 건축, 디자인 분야의 전문가 선정
 - 효율적인 사용자 참여 설계를 위해서는 참여 설계의 일정 관리와 워크숍 진행, 사용자의 참여 유도 및 의견 조정 등을 담당하는 퍼실리테이터의 역할이 매우 중요하므로 퍼실리테이터의 업무가 가능한 전문가 확보
 - 시·도교육청에 따라 실시설계 건축사가 퍼실리테이터 역할까지 과업에 포함하여 운영하는 경우도 있음
- 실시설계 건축사 선정
 - 디자인 워크숍은 아이디어의 실현 가능성을 점검하고 사용자가 희망하는 공간 개념을 객관적으로 표현하여 기본설계안을 도출하는 과정이므로, 실시 설계를 담당하는 건축사와 워크숍 내용을 공유하여 설계과정의 단절이나 중복을 예방



[그림 23] 사용자 참여 설계의 추진 과정

» 단계별 사용자 참여 설계의 내용과 방법

〈표 16〉 단계별 사용자 참여 설계의 내용과 방법

단계(시기)	내용	방법
사업 선정	사업 목표 및 필요성에 대한 이해	전체 구성원 대상 설명회
	사업 신청	전체 구성원 대상 찬반 설문
계획 (3~4월)	단위 학교의 공간 조성 사업 계획	계획 수립
사용자 참여 설계를 위한 준비 (4~5월)	학생, 학부모, 교사(교과별, 학년별, 부서별), 지역주민 등 사용자 대표 협의체 및 워킹 그룹 구성	대표 협의체 및 사용자 참여 설계 전담팀 구성
	고교학점제 공간 조성을 위한 교육 및 건축 분야 전문가 선정	퍼실리테이터 위촉 및 계약
	고교학점제 운영과 공간 조성의 원리, 건축 설계 관련 용어와 설계의 기초 이해	사용자 참여 설계 전담팀 대상 강의 및 연수
	우수 디자인 건축 공간 체험 및 타 학교의 공간 조성 성과 활용 사례 인사이트 투어	체험 중심의 현장 견학 (전문가의 안내 권장)
	대상 공간 선정	설문조사, 대표 협의체 회의
	교육과정과 학교 공간의 특징, 전체 구성원의 요구 분석	Y차트, 면담조사, 설문조사, 스티커(포스트잇) 부착을 활용한 선호도 조사, 워크숍, 토론, 토의 등
구성원 참여 유도 및 디자인 워크숍 (5~7월)	구조 및 동선, 활용 방안, 실 명칭 선정에 사용자의 참여 유도	실 명칭 및 디자인 공모전 등 교내 행사 기획
	조사 및 분석 단계의 정보를 종합·정리하여 대상 공간의 디자인 원칙과 방향 설정	사용자 참여 설계 전담팀 및 대표 협의체 회의
	교과별, 학년별, 주제별 프로젝트 활동으로 민주 시민 의식 및 융합적 사고 역량을 강화할 수 있는 연계 교육	교과 및 비교과 연계 활동
	사용자 참여 설계 전담팀 중심의 디자인 워크숍을 통한 시각적 구체화 작업	설문조사, 아이디어 스케치, 모형 제작, 디자인 워크숍, 기본설계도 완성
실시설계 (7~10월)	기본설계를 반영한 실시설계	건축사 선정, 기본설계 반영 여부 검토
시공 (11~이듬해 2월)	공사 현장 감리, 마감재 및 가구 선정	퍼실리테이터, 실시설계 건축사, 시공사, 업무담당자의 현장 미팅
활용과 성찰 (이듬해 3월~)	결과 및 활용에 대한 만족도 조사와 보완	설문조사, 평가 및 피드백

3) 사용자 참여 설계의 시각적 구체화

» 1차 디자인 워크숍

- 학교 공간 재구조화를 위한 대상 공간의 적합성 검토
- 건축 평면도, 단면도, 축척의 개념을 이해할 수 있는 기초적인 건축 교육 및 다양한 참여 설계 도구를 통해 사용자의 아이디어를 객관적으로 표현하는 과정
- 퍼실리테이터는 대상 공간의 레이아웃 도면 및 학교 공간 조성의 다양한 예시 자료를 제시하고, 공간 설계의 기초적인 원칙과 방법을 안내하는 등 사용자의 아이디어가 시각적으로 구체화 될 수 있도록 유도

» 2차 디자인 워크숍

- 1차 디자인 워크숍 결과에 대한 의견 수렴 결과를 반영한 수정·보완
- 평면 또는 입체도면, 입체모형 제작을 통한 디자인 워크숍 결과 공유
- 공간의 사용 목적과 수용 인원 최종 결정, 각종 설비(소방, 전기, 냉난방, 음향 시스템 등), 교육 기자재 설치 등 세부적인 사항 반영
- 공간별 디자인 요소(마감 방식 및 마감재, 조명, 가구, 비품 등), 흡음 및 방음, 조도, 안전에 관한 사항 결정

» 디자인 워크숍 결과의 활용

- 모델링을 통한 공간 예상
 - 디자인 워크숍의 결과를 입체도면(스케치업)으로 제작하면 공간을 실제와 가깝게 예상할 수 있으며, 시행착오를 줄임
- 의사소통의 도구
 - 학교 전체 구성원 대상의 설명 및 의견 수렴, 보완을 위한 수단
 - 실시설계 요구를 위한 수단
- 기본설계의 완성
 - 공간 구조 및 주요 마감 자재, 조명, 가구 배치 등 공간 디자인의 세부적인 사항이 명확하게 제시된 도면으로 작성하며, 기본설계로서 의미를 지님



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 24] 사용자 참여 설계 디자인 워크숍의 결과 반영 사례(강릉제일고등학교)

나. 사용자 참여 설계(건축 분야)

1) 건축 분야에서 사용자 참여 설계의 의미

- 교육기획이 어느 정도 진행되어 교육 방향성을 고려한 공간에 대한 요구사항이 정리된 단계에서 순차적으로 공간기획이 시작되는 것이 바람직함. 상황에 따라 일부 같은 시기에 진행되기도 함
- 교육기획 전문가, 공간기획 전문가(건축사 등) 등의 전문가 참여를 주축으로 사용자 참여가 진행되 기보다는 모든 단계에서 연계성 있게 사용자가 참여할 수 있도록 유도되는 것이 매우 중요함
- 교육기획 단계에서의 사용자 참여 단계는 교육 분야의 전문가와 사용자 그룹 중 교사를 중심으로 진행되나, 건축기획(공간계획) 단계에서의 사용자 그룹은 학생, 교사, 학부모, 지역주민, 관계자 등 다양한 그룹이 참여하게 됨
- 교육기획의 방향성에 따라 요구하는 공간의 규모와 특징이 정리되는 것이 매우 중요하므로 교육기 획 단계에도 공간기획 전문가(건축가, 건축사, 관련 분야 교수 등)를 비롯한 주 사용자들이 TFT에 참여하는 것이 바람직함
- 사용자 참여 설계 단계에 참여하는 공간기획 전문가는 필요하지만 눈에는 잘 드러나지 않는 기술 적 정보를 사용자 그룹에 되도록 쉬운 용어로 미리 전달하여 기획 단계에서의 구상이 실현될 수 있도록 하는 것이 바람직함

〈표 17〉 교육 기획 단계에서의 사용자 참여 설계(그린스마트스쿨의 교육기획 프로세스 예시)

교육 현황 분석	학교 교육 분야 전문가 협의체 구성, 운영	사전 기획 전반에 참여할 교육 분야 전문가 협의체 구성 인원의 적정성 검토
	교육 및 운영 현황 분석	학교 현황에 대한 전반적인 검토
	교육과정 현황 분석	교육 현황 파악에 대해 교육 중점 과제, 교육 특화 과제의 분석
	교수학습법 현황 분석	교육 프로그램별 교수학습방법, 교육 프로그램별 활동 형태 파악
사용자 참여 (교육 분야)	학교 사용자의 교육과정 및 교수학습 방법에 대한 요구사항 정리 및 분석	다양한 방법을 통해 사용자 참여 교육 기획 의견이 수렴되었는지 검토
교육 비전 및 목표 설정		학교의 교육 비전, 교육 목표, 중점 추진 과제의 수립 및 검토
교육과정 및 교수학습 방법에 따른 공간 조성 방향 설정	학습 공간 재구조화	학교 현황 및 교육과정과 연계한 학습 공간 재구조화 검토
	교육 환경에 따른 학습 공간 설정	교육 환경에 따른 학습 공간 조성 사항 검토

〈표 18〉 건축기획 단계에서의 사용자 참여 설계

현황 분석	시설 현황 조사	기존 시설에 대해 동별 구체적인 현황 분석 검토
	법규 검토	세부 계획 기준 설정을 위한 법규 검토
사용자 참여 (건축 분야)	사용자 참여 교육기획에 근거한 건축기획	사용자 참여 교육기획에 근거한 건축기획 준비
	학교 사용자의 공간에 대한 요구사항 정리 및 분석	다양한 방법(수법)을 통해 사용자 참여 건축기획 의견이 수렴되었는지 검토
건축물의 공간 계획	배치 계획	개략적인 배치, 외부 공간 계획, 규모에 대한 기준 검토
	공간 계획	평면, 단면, 특화 계획, 감염병 예방 계획, 범죄 예방 계획, 동선 계획, 기존 시설 연계, 지역사회 연계, 향후 증축 계획 등의 고려 방안, 수립 방안에 대한 기준에 따라 검토
	에너지 효율화 계획	녹색건축 인증, 건축물 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증 등 인증 대상 여부 검토 에너지 계획의 주안점 설정 검토
	수목 및 생태환경 계획	학교 교육과정과의 연계 및 지역주민의 생활환경을 고려한 생태환경 조성 검토와 관리 방안 고려
	학생 안전 등의 계획	학생 안전 등 기준 사항에 따른 적정성 검토
	그 밖에 필요한 사항	사업 특성에 따라 발생하는 문제 및 기타 사항에 대한 기준 검토
위해 요소 예측 및 최소화 방안	공사 중 위해 요소 예측 및 최소화 방안	학습권 침해 요소와 시설 환경에 대한 위해 요소 등에 대한 예측 및 대책 검토
규모 계획	학교 스페이스 프로그램	스페이스 프로그램 산정 방향 및 원칙에 따라 스페이스 프로그램 산정 적정성 검토
주요 설계 지침 작성		설계지침서 및 과업지시서, 설계 의도 구현 수행 방식 등에 대한 적정성 검토

〈표 19〉 사용자 참여 설계 프로세스

단계	내용	방법
1단계 이해하기	주변 상황과 기존의 문제를 파악하는 단계. 사용상 문제와 사용자를 둘러싼 주변 맥락을 이해하고 분석하는 단계	교사TFT, 대표학생 및 학생동아리 구성 등
2단계 관찰하기	직접적이고 실제적인 조사 단계로 사용상 문제 및 반영되지 않은 요구에 대한 인사이트(관찰하면서 발견된 흥미로운 점)를 얻는 단계	설문조사, 관찰기법, 학교 탐험 등
3단계 분석하기	이전 조사 단계에서 발견된 데이터를 종합, 정리하여 분석하는 과정으로, 분석 과정에서 중요한 패턴, 인사이트를 발견하여 주요사항들을 디자인 개념으로 발전시키기 위해 디자인 원칙과 영역을 제공하는 단계	토론 등
4단계 발상하기	도출된 인사이트, 디자인 원칙, 영역을 기반으로 실제적인 아이디어 도출 및 평가하는 단계	모형 제작, 실시간 피드백 등
5단계 제작하기	공사를 통해 설계한 것을 실현하는 단계	-
6단계 성장하기	사용자들의 공간 사용 빈도(전, 후 비교), 만족도 등을 통하여 개선 보완하는 단계	설문조사, 관찰 등

출처: 이광수, 류수훈(2019).



출처: 한국교육개발원(2023b: 62).

[그림 25] 기본계획 및 설계 단계 - 디자인 워크숍 운영 사례(충남서일고등학교)

» 사용자 참여 주체 선정

- 사용자 참여는 학생, 학부모, 교직원을 주축으로 진행되며, 사전기획 전문가는 교육 기획 및 공간 기획을 진행하는 퍼실리테이터 역할을 함. 미래학교 교육혁신 및 공간 혁신에 관심 있는 학생, 교직원, 학부모를 모집하고 지속적인 참여가 가능한 인원으로 구성(학점제형 공간 조성 TFT 구성 및 운영, p. 28 참고)
- 교직원들의 다양한 측면에서의 의견 수렴이 매우 중요하므로, 교직원 TFT는 특정 교과 또는 관련 업무 담당 교직원만이 참여하지 않도록 해야 함. 가능한 전체 교직원들의 의견이 수렴되고, 진행 과정을 확인할 수 있도록 계획이 수립되어야 함
- 학생들의 참여를 독려하기 위해서는 건축 동아리 및 관련 진로 교과 개설 등을 활용할 수 있음. 다만, 특정 학생들의 의견만이 반영되지 않도록, 전체 학생 의견 수렴은 설문조사 등의 방법을 활용할 수 있음



출처: 한국교육개발원(2023c: 12).

[그림 26] 학생 참여 디자인 워크숍 사례(대전구봉고등학교)

2) 단계별 사용자 참여 설계의 주요 내용

» 인사이트 투어를 통한 학교 공간의 이해

- 인사이트 투어는 해당 학교에 대해 충분히 분석하고, 문제점과 개선 방향에 대해 논의한 후에 실시하는 것이 효율성이 높음
- 인사이트 투어를 위한 대상 학교를 계획할 시에는 단순히 우수사례의 학교를 방문하기보다는 해당 학교가 개선하고자 하는 방향성과 유사 또는 동일하게 개선하여, 참고할 수 있는 학교로 선정하고, 리모델링 등을 통한 인테리어(가구)의 변화보다는 참여 조직, 운영 방안, 설계 및 시공 등에 대해 참고할 수 있는 사례가 유의미함
- 오프라인 인사이트 진행 시에는 전문가(사전기획자, 퍼실리테이터, 건축사 등)와 함께 동행하여, 주요 부분에 대한 이해를 도모해야 함
- 온라인 인사이트 투어를 통해 물리적 거리에 따른 접근의 어려움을 해소할 수 있음

카페형 교무실		-카페와 같은 편안한 분위기 -노출 천장으로 높은 층고 -자동문으로 출입 편리 -힘이 있는 휴게 공간	외부 공간에 3개의 입이 마련되어 있음	모용학술실 출자실로 활용 -유익실 수업, 휴먼 캠퍼스 장소로 활용 -김춘서 열 3D프린터, 레이저 프린터 등 다양한 기기 사용 공간 -자 구조로 폭력 배치				
개방형 교실		-복도 넓고 연유리 채광 좋음 -교실 후유리로 탁 트인 개방감 -노출 천장처럼 넓어서 시원함 -교실 외부의 공간이 넓어 넓음	모용학술실 출자실 한유서 열	김아람, 미나리, 미나리, 영재관 공간을 위한 다의 공간 및 유아에 학생들이 할 수 있는 공간 이 다양한 형태로 배치되어 있음 나유미 미나리관 중 힐링방 장소 배치				
외부 도서관		-복합형 구조 높은 층고, 통창으로 개방감 -외부에 있어 접근성 용이 -교과수업, 외부 강의 등 다용도로 활용	4) 구성원들의 마인드	동남동은 하나의 공간을 다양한 용도로 활용할 형태를 공간이 아닌 주시로, 정해져 따라 용도가 바뀔 -이는 구성원(학생, 교사, 학부모)의 자유로, 개방적, 자율적 마인드로 가능함 -공용공간이라는 의미가 익숙해져 책과 일, 사물을 할부로 쓰지 않음				
채널링		-교수 미술실로 활용 -외부 공간에 마련, 넓은 통창과 통창도어로 개방감 -층 2개의 채널링으로 구성 -스포츠 동아리활동, 실 공간, 학습 공간, 행사 등 다양하게 활용	다. 기지(장단점) <table border="1"> <thead> <tr> <th>장점</th> <th>단점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> -실마다 특색있는 공간, 여강 사용 -넓고 긴 천공, 통창도어 등의 사용으로 개방감 극대화 -교실 및 각실의 통창으로 개방감 높임 -교장 곳곳에 그려진 학생들의 활동이 많은 공간이 많 -이 있음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -멀리멀리 개단 중 곳곳에 있어 이용 가능함 -외부 각각의 공간들이 독립되어 학생들의 활동이 높음 -임의가 있어, 공간의 여유를 </td> <td> -공간 안에 특정한 기능을 포함하여 '원인'이 많음 -다양한 특정한 공간이라 외부 통창의 어려움 -학생수가 증가하면서 건물들이 좁아져 교장이 커주 -원인 -외부에서 이용시 이용식 개방감이 많음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -공조구조와 청소와 세거용 등 각실의 공용사용으로 책 -임의가 있어, 공간의 여유를 </td> </tr> </tbody> </table>	장점	단점	-실마다 특색있는 공간, 여강 사용 -넓고 긴 천공, 통창도어 등의 사용으로 개방감 극대화 -교실 및 각실의 통창으로 개방감 높임 -교장 곳곳에 그려진 학생들의 활동이 많은 공간이 많 -이 있음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -멀리멀리 개단 중 곳곳에 있어 이용 가능함 -외부 각각의 공간들이 독립되어 학생들의 활동이 높음 -임의가 있어, 공간의 여유를	-공간 안에 특정한 기능을 포함하여 '원인'이 많음 -다양한 특정한 공간이라 외부 통창의 어려움 -학생수가 증가하면서 건물들이 좁아져 교장이 커주 -원인 -외부에서 이용시 이용식 개방감이 많음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -공조구조와 청소와 세거용 등 각실의 공용사용으로 책 -임의가 있어, 공간의 여유를	동남동은 하나의 공간을 다양한 용도로 활용할 형태를 공간이 아닌 주시로, 정해져 따라 용도가 바뀔 -이는 구성원(학생, 교사, 학부모)의 자유로, 개방적, 자율적 마인드로 가능함 -공용공간이라는 의미가 익숙해져 책과 일, 사물을 할부로 쓰지 않음
장점	단점							
-실마다 특색있는 공간, 여강 사용 -넓고 긴 천공, 통창도어 등의 사용으로 개방감 극대화 -교실 및 각실의 통창으로 개방감 높임 -교장 곳곳에 그려진 학생들의 활동이 많은 공간이 많 -이 있음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -멀리멀리 개단 중 곳곳에 있어 이용 가능함 -외부 각각의 공간들이 독립되어 학생들의 활동이 높음 -임의가 있어, 공간의 여유를	-공간 안에 특정한 기능을 포함하여 '원인'이 많음 -다양한 특정한 공간이라 외부 통창의 어려움 -학생수가 증가하면서 건물들이 좁아져 교장이 커주 -원인 -외부에서 이용시 이용식 개방감이 많음 -공간이 부족해서 체육관 및 기숙사정원이 따로 없을 -공조구조와 청소와 세거용 등 각실의 공용사용으로 책 -임의가 있어, 공간의 여유를							
특별실		-Y lab(창의 융합형 과학실) -열린 공간으로 온이 없어 개방감 -음악비 등 다양한 실로 활용 -Media lab -교과수업 및 복도 공간을 활용 -정보검색 등 자유롭게 컴퓨터사용	Y lab Media lab	동남동은 하나의 공간을 다양한 용도로 활용할 형태를 공간이 아닌 주시로, 정해져 따라 용도가 바뀔 -이는 구성원(학생, 교사, 학부모)의 자유로, 개방적, 자율적 마인드로 가능함 -공용공간이라는 의미가 익숙해져 책과 일, 사물을 할부로 쓰지 않음				

출처: 경남사천용남중학교(2022).

[그림 27] 인사이트 투어 보고서 사례(경남 사천 용남중학교)




출처: 학교시설 공간재구조화 홈페이지. <https://www.schoolredesign.kr/vr-room/school/haemil>

[그림 28] 온라인 인사이트 투어 사례(세종 해밀초등학교)

3) 성공적인 사용자 참여 설계를 위한 유의 사항

▶ 참여자와 전문가의 역할과 참여 필요성 이해

- 학생, 교직원, 지역주민, 시·도교육청 관계자, 교육과정 전문가, 교육학 전문가, 건축계획 및 설계 전문가, 건축구조 및 시공전문가, 인테리어 전문가, 소방설비, 전기설비 전문가 등 다양한 전문가들의 역할과 참여의 필요성을 이해하고 소통하는 것이 매우 중요함
- 사용자 그룹별 소통을 위해 기초적인 용어(건축)를 숙지하고, 이에 따른 진행이 필요
- 동일한 사용자 그룹 간 위계와 이해관계로 인해 공간 계획의 방향이 잘못되지 않도록 소통과 상황공유, 배려가 매우 중요함
- 학교의 장기적 미래교육 비전에 따른 공간 조성 방향이 수립되도록 주기적 협의 필요

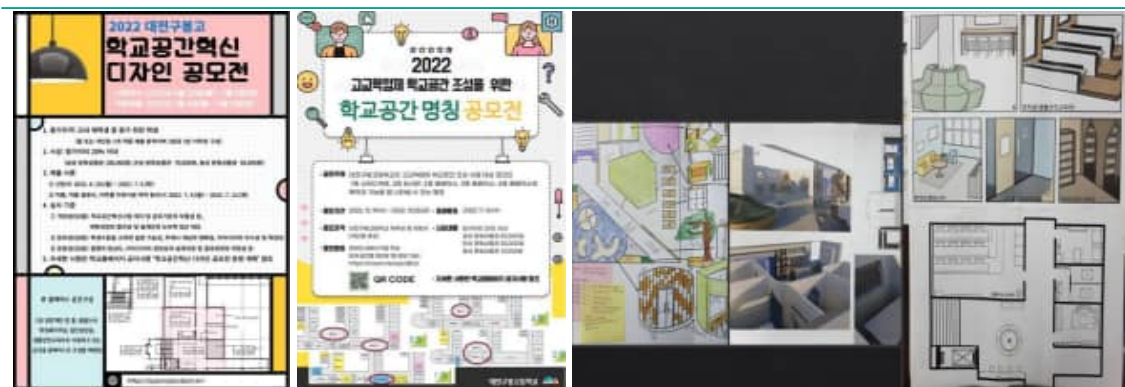

출처: 대전구봉고등학교(2023).

[그림 29] 학생 참여 디자인·명칭 공모전 사례(대전구봉고등학교)

▶ 참여자로서 사업에 대한 명확한 비전의 공유 필요

- 사용자가 사업에 대한 이해가 부재한 상황에서 사업에 참여 시 다양한 형태의 갈등과 문제가 제기될 수 있음. 따라서 고교학점제에 대한 명확한 이해, 사업의 구조, 사업비와 사업의 형태 등 이해해야 하는 범위를 사용자 그룹별로 정리하여, 퍼실리테이터의 사전교육을 검토해야 함

▶ 사업의 우선순위 설정

- 보여주기식 사업이 진행되지 않도록 유의하고, 고교학점제 도입에 따른 필요성과 목적에 부합되도록 사업 대상 공간의 우선순위 설정이 필요함
- 안전성(석면 제거, 구조 보강)과 쾌적성(노후 설비 교체, 환경 관련 정비)을 고려해야 하며, 예산에 적합하도록 순차적으로 진행

다. 컨설팅

1) 컨설팅 개요

» 컨설팅의 목적

- 전문성을 지닌 컨설턴트의 지속적인 학교 밖 지원을 활성화함
- 교육 및 건축 분야 전문가의 컨설팅을 통해 학교 상황에 따른 과제 및 요구를 분석함
- 단위 학교 관계자와 컨설턴트 간 공통의 탐구 과정을 통해 최선의 해결 방안을 모색함
- 단위 학교 구성원의 의견 수렴 과정에서 발생하는 갈등에 대한 조율을 지원함
- 건축설계안에 대한 세부 검토를 통해 다양한 공간 활용 가능성 및 문제점을 검토함
- 학교 여건에 맞는 단계별 선례 공유 및 아이디어 발굴의 기회를 제공함
- 단위 학교의 실정 및 특성에 적합한 학점제형 공간 조성을 통해 고교학점제 지원 및 교육공동체의 학교 교육 만족도 제고에 기여함

» 컨설팅 운영의 기본 방향

- 구성: 교육부와 한국교육개발원으로부터 위촉받은 교육·건축 분야 컨설턴트
- 컨설팅 참여자: 컨설턴트(교육 분야, 건축 분야), 컨설팅 대상학교 담당자(또는 대상학교 관계자), 시·도교육청 사업 담당자
 - ※ 교육 분야 컨설턴트가 팀장으로서 참여자 간 일정을 조율하고 보고서를 작성하는 것을 원칙으로 하나, 학교의 상황 및 여건에 따라 조정 가능
- 시기: 단위 학교의 일정 및 상황에 따라 2회(필수: 중앙컨설팅) 또는 그 이상
- 내용
 - 학교 상황을 분석하고 고교학점제를 지원할 수 있는 최적의 공간 구축 방안에 대해 논의함
 - 변경이 필요한 공간 중 우선순위를 정하거나 공간 조성 과정에서 생길 수 있는 어려움을 해소하는 과정에서 컨설턴트의 의견을 통해 갈등을 조율함
 - (교육 분야) 학교별 고교학점제 운영 계획 분석, 교육과정을 실현하는 데 필요한 공간의 특징, 학점제형 공간 조성의 교육적 방향성 등에 대해 이해
 - (건축 분야) 학교별 공간의 건축학적 특징, 학교 공간 개선안, 건축학적 관점에서 효율적인 공간 디자인 방안 및 이에 수반되는 법적, 기술적 요구조건 등에 대해 이해

» 컨설팅의 유형

- 중앙컨설팅(필수)
 - 컨설턴트는 교육부와 한국교육개발원으로부터 위촉된 교육 및 건축 전문가로 구성되며, 시·도 교육청 담당자(장학사, 주무관)는 컨설팅에 필수로 참석함
 - 컨설턴트는 도입학교에 2회 파견되어 컨설팅을 실시함
- 시·도교육청 컨설팅(시도별 상이)
 - 단위 학교의 개별적인 컨설팅 요청에 따라 시·도교육청에서 자율적으로 구성한 컨설턴트가 컨설팅을 실시함
- 학교 자체 컨설팅(시도별 상이)
 - 필요에 따라 학교 자체적으로 컨설턴트를 위촉하여 컨설팅 및 연수를 실시함
 - 사업비로 컨설팅비와 연수 강사비 지출이 가능함

2) 중앙컨설팅 절차



[그림 30] 중앙컨설팅 절차

» 컨설팅 주요 절차

- 컨설팅은 대상 학교 담당자 워크숍, 1차 컨설팅, 2차 컨설팅의 과정으로 진행됨
- 대상 학교 담당자 워크숍에서는 컨설팅의 주요 절차 및 방식에 대해 안내하며, 본격적인 컨설팅 단계에서는 대상 학교 담당자가 컨설턴트와 컨설팅 일정을 조율한 뒤 컨설팅 의뢰서를 작성하여 제출하고 2회에 걸쳐 컨설팅을 수행하는 과정으로 이루어짐

» 컨설팅 일정 조율(1차, 2차 컨설팅 공통)

- 컨설턴트 팀장(교육 분야 컨설턴트)이 건축 분야 컨설턴트, 컨설팅 대상학교 담당자, 시·도교육청 사업담당자와 연락하여 방문 일정을 조율함
- 학교의 학사 일정, 공간 구축에 대한 학교 내부의 협의 등을 고려하여 컨설팅 시기⁹⁾를 결정함

» 컨설팅 대상 학교 제출 서류

- 컨설팅 의뢰서(1·2차 컨설팅 공동 제출 서류)
 - 컨설팅 대상 학교의 담당자가 컨설팅 1주일 전까지 컨설턴트 팀장에게 제출
 - 작성 방향: 원활한 컨설팅 진행을 위해 컨설팅에서 논의되어야 할 주요 쟁점을 중심으로 교육, 건축 분야의 영역으로 자유롭게 작성함
 - 의뢰서 내용 구성
(학교 공간 조성 진행 사항) 컨설팅 일시까지 진행된 사업 추진 사항 등
(고교학점제 연계 공간 구성) 고교학점제에 맞는 필요 공간, 교수학습 방법에 따른 공간 조성 논의 등
(공간 배치) 최적의 홈페이지 위치, 동선의 효율성과 공간의 기능성을 고려한 적절한 공간 배치 등
(건축) 건축 설계안에 따른 공간 활용의 적정성, 교실 통합에 따른 공간의 합리성, 적절한 자재 선정 등
(기타) 이외에 예산, 학교 공간 조성 절차, 학습기자재 및 비품 구매, 유휴 공간 및 교실의 활용성 극대화 방안 관련 사항
- ※ 단위 학교의 공간적 특성, 교육공동체의 특징, 학교의 교육적 이념, 중점 사항 등에 따라 자율적으로 내용을 구성할 수 있음
- 1차 컨설팅 제출 서류
 - 학교 현황: 지역, 설립 형태, 구성원, 교육과정, 시설
 - 학교의 공간 조성 계획: TFT 운영, 사용자 참여 설계 여부, 월별 일정 등

9) 단위 학교의 학사일정 및 공간 구성에 관한 협의 진행 상황 등에 따라 컨설팅 시기를 정하여 실시함

- 구체화 과정 시
- 사용자 참여 설계 결과 발표 시
- 실시설계 검토 시
- 디자인 컨설팅 시
- 그 밖에 학교 요청에 따라 추가 실시 가능

- 2차 컨설팅 제출 서류
 - 기존 건축 도면(배치도, 평면도 등), 변경 건축 도면(안)(배치도, 평면도 등)
 - 공간 조성 교실 활용 계획
 - 기자재 구입 목록
- 1차, 2차 컨설팅 제출 서류는 학교 진행 상황에 따라 변동 가능하며, 원활한 컨설팅 운영을 위해 컨설턴트가 요청하는 자료는 추가 자료를 제출해야 함

〈표 20〉 컨설팅 대상 학교 제출 서류

회차	공통 제출서류	회차별 제출서류
1차 컨설팅	컨설팅 의뢰서	• 학교 현황(지역, 설립 형태, 구성원, 교육과정, 시설) • 학교의 공간 조성 계획(TFT 운영, 사용자 참여 설계 여부, 월별 스케줄 등)
2차 컨설팅		• 기존 건축 도면, 변경 건축 도면(안) • 공간 조성 교실 활용 계획 • 기자재 구입 목록

※ 각 학교 진행 상황에 따라 제출 서류는 상이함

〈표 21〉 컨설팅 진행 시간표

오전 방문(안)	오후 방문(안)	컨설팅 내용	
		1차	2차
9:00~9:30	14:00~14:30	컨설턴트 사전 협의회(30분)	
9:30~9:40	14:30~14:40	참석자 인사 / 소개 및 컨설팅 절차 안내(10분)	
9:40~9:50	14:40~14:50	학교 공간 조성 계획 설명 (10분)	새 공간 조성안 및 도면 설명(30분) *새 공간 조성 교실 활용 방안
9:50~10:10	14:50~15:10	학교 공간 모니터링 (20분)*필수	
10:10~11:50	15:10~16:50	학교 공간 조성 계획 컨설팅(100분)	학교 공간 조성 컨설팅 (100분)
11:50~12:00	16:50~17:00	컨설팅 마무리 및 정리(10분)	

※ 학교 사정에 따라 컨설팅 절차는 조율할 수 있음

3) 컨설팅 사례

» 교육 분야

〈표 22〉 교육 분야 컨설팅 사례

순서	컨설팅 의뢰 항목	컨설팅 내용 (예시)
1	교사 TFT의 역할과 업무 범위	• 학교는 교육과정을 구현하는 공간이므로 교사 TFT는 교육 분야 전문가로서 학교 교육과정과 교과별 교육목표에 대한 이해를 바탕으로 공간 조성의 방향성 제시 역할을 담당함
2	홈베이스 배치	• 홈베이스는 고교학점제 교육과정 운영 시 학생들의 동선 등 학교 특성을 고려하여 배치할 필요가 있는데 무엇보다도 학생들의 접근성이 높은 위치에 배치해야 활용성이 높아짐
3	사물함 위치	• 학교 실정에 따라 사물함을 교실에 그대로 두는 방안, 홈베이스나 복도에 배치하는 방안 등 다양한 방안들이 있음 • 기본적으로 고교학점제는 행정학급이 아닌 교과 중심의 이동수업을 지향하고 있으므로 사물함을 별도의 공간에 배치하는 것을 대원칙으로 하고 있으나 이는 학교의 실정(복도의 폭, 유휴 교실 수, 학급 당 학생 수 등)에 따라 다양하게 배치할 수 있음 • 최근에는 유휴 교실을 사물함 배치 공간으로 활용하는 사례, 건물 간 연결 브리지를 활용한 사례, 복도 빌트인 형태로 배치한 사례 등이 있음
4	공간 조성 시 고려 사항	• 학점제형 공간 조성은 단순한 리모델링이 아닌 고교학점제라는 교육과정의 효율적 운영을 위한 것이므로 이를 고려하여 전체적인 공간 재배치가 이루어져야 함 (고려할 사항: 추후 학급 당 학생 수의 변화, 교육과정 운영의 방향 등) • 수능 시험장 등 상황에 따라 행정학급과 같은 형태의 공통성을 지닌 공간이 필요한 경우도 있으므로 장기적인 안목을 갖고 공간 전반을 재구조화해야 함
5	조성 공간 선정	• 사업 취지에 부합하도록 고교학점제 운영에 필요한 공간을 중점적으로 선정함 - 홈베이스: 이동수업으로 인해 별도의 사물함 배치 장소 필요 - 수업 모형별 교실: 다양한 수업 모형을 지원할 수 있는 교실 - 미디어스페이스 등 휴게 및 소그룹 활동 공간: 공간, 방과후 활동, 다양한 소그룹 프로젝트 활용을 지원할 수 있는 공간 - 교과 특성이 드러난 교실: AI 관련 교과, 실기 중심 교과 등 특수한 교과 수업을 지원할 수 있는 교실 - 소인수 등 다양한 수강 인원을 수용할 수 있는 교실 • 기투자 공간 및 추후 사업 대상 공간에 대한 확인이 필요 - 사업별 내구 연한이 상이하므로 확인 필요 • 기자재만 구입한 사업의 경우는 공간 예산 투입이 가능함 • 학교 내에는 다양한 종류의 사업들에 의해 조성된 공간이 혼재되어 있으므로 기존 공간과의 조화, 미래학교 운영 방안 등 장기적인 공간 마스터 플랜 설정이 필요함
6	유휴 공간 부족 문제	• 학점제형 공간 조성은 기본적으로 증축을 기본으로 하고 있지 않으므로 단위 학교가 기존 공간을 어떻게 활용하고 재해석할 것인가가 중요한 문제임 • 새롭게 구축할 공간 자체가 부족한 경우에는 한정된 예산 안에서 기존 공간의 다기능화에 초점을 맞출 필요가 있음 • 사례: PBL실 등 교과 구분없이 수업 형태에 따른 공간 구성, 도서관과 시청각실의 다목적화 등

순서	컨설팅 의뢰 항목	컨설팅 내용 (예시)
7	증축 문제	• 증축 희망 시, 증축 가능한 환경(지반 조사와 측량, 구조 안전진단)에 대한 사전조사에 대한 추가적인 비용이 발생하며 공간 기간이 늘어나 학생들의 교육과정 운영에 차질이 있을 수 있는 등 다양한 한계가 존재함 • 예산, 교육과정 운영 등 다양한 측면에서 충분히 검토한 후, 증축 계획을 수립할 필요가 있음 • 그린스마트 미래학교 등 다른 사업을 추후 추진할 경우, 동일 공간에 예산 중복 지원이 되지 않도록 세부 계획을 철저히 검토하여 업무를 추진해야 함. • 고교학점제 학교 공간 조성 사업 예산을 활용한 증축은 불가능함
8	사용자 참여 설계	• 학교 상황과 특성에 따라 다양한 사용자 참여 설계의 방법을 활용함 - 전체 교사, 학생, 학부모 대상의 설문조사를 통해 의견 수렴 - 학생을 공간 혁신 TFT의 일원으로 구성하여 참여 유도 - 교내 건축 및 공간 관련 동아리 등을 활용하는 방법 - 수업 시간의 공간 개선 관련 활동을 통해 사용자 참여 유도 • 공간 구축을 완료한 우수학교를 방문하여 사업에 대한 전반적인 의견 청취 및 모범 사례 습득을 위해 인사이드 투어를 진행함
9	동선의 효율화를 위한 교실 배치	• 교육과정 운영의 효율을 고려하여 교실 배치를 재구조화함 • 학년별 교육과정의 특징을 고려하여 교실을 배치함 (예: 1학년-공동과목 중심, 2학년과 3학년-선택과목 수요 중심) • 학생 수, 선택과목의 변화, 교사 수급 등 장기적인 변화 요인에 대한 선제적 고려가 필요함
10	물품(기자재) 선정 위원회 구성	• 수요자 중심으로 5인 이상 구성(교직원 및 학부모 포함) 권고 • 학교장(기관장) 및 행정실은 제외 • 위원장은 호선하고 사업부서 담당자는 위원회 간사로 참여 가능하며 유사 위원회가 있을 경우에는 통합 운영을 권장함 • 시·도교육청 지침에 따라 학년 초에 구성된 물품선정위원회로 대체하여 운영할 수 있음
11	기자재 선정 및 관리	• 교실은 수업이 실현되는 공간이므로 해당 교과 담당 교사의 교수학습 방법을 고려하여 기자재를 선정함 • 필요한 기자재 목록을 작성한 후 예산에 맞춰 우선 순위에 따라 구매함 • 2,000만원 이상의 기자재 구입 시, 학교의 물품(기자재)선정위원회의 협의를 거쳐 구매함(시도별 기준 상이) • 시·도교육청별 기자재 사용 연한이 상이하므로 시·도교육청 담당자에게 확인한 후, 구입함 • 추후 기자재 파손 및 분실 등에 대비하기 위해 기자재 운영·관리 방안을 수립함
12	물품 선정	• 책상 등의 가구도 수업 지원의 요소이므로 편의성, 교육과정의 연계성을 고려하여 선정함(예: 모둠활동실-바퀴 달린 책걸상을 배치하여 이동의 편의성 확보)
13	조성된 공간 관리	• 표지판을 통해 공간 이용 수칙을 고지하는 방식보다는 학생자치회와 연계하여 학생들의 자발적 협의를 통해 공간 사용 규칙을 만들고 전체 학생들에게 공유하는 방법이 효과적임 • 사용자의 의견을 수렴하여 공간 관리가 민주시민교육으로 연계되도록 유도함
14	공간 사용 예약 시스템	• 학교의 상황 및 특성(예산, 교원 수 등)에 따라 공간 사용 계획 및 교실 사용 규정을 수립함 - 에듀파인 공유설비예약시스템을 활용하여 공간 사용 현황 파악 - 공간 예약 시스템을 활용하여 공간사용 예약 - 구글 드라이브, 네이버 웨스, 기타 온라인 도구 등을 활용하여 공간 사용 예약 • 교실 출입문 옆 보조 모니터 등을 활용하여 수업 시간 및 사용 시간을 실시간으로 안내함

※ 시·도교육청별 컨설팅 기준 및 내용은 상이할 수 있음

» 건축 분야

〈표 23〉 건축 분야 컨설팅 사례

구분	컨설팅 의뢰 항목	컨설팅 내용 (예시)
1	학습 공간의 조성 방안	- TFT, 교과별, 공간별 교육기획 협의를 통해, 교과 중심에서 강의형, 토론형, 거꾸로 학습, PBL 등 교수학습 방법에 따른 공간 구성이 필요함 - 수평 또는 수직 조닝(그룹핑)으로 동선의 효율성 고려 - 대형 강의실 분할 시 가변 벽은 방음 성능을 고려하여 선택해야 하며, 수업 형태에 따라 교실 규모 변경이 가능하도록 유연성을 극대화할 필요가 있음 - 소인수/다인수 수업 개설 강좌 및 수강 인원 등을 고려하여 적절한 교실의 크기와 개수를 산정하고 이에 따른 공간을 계획함 - 계단형 강의실 조성 시, 교실의 층고 및 안전상의 문제를 고려하여 추진 여부를 결정하고, 방습 및 방음 처리 등의 환경 여건을 고려함 - 기존 벽을 철거할 경우에는 내력벽 여부를 확인하는 등 구조 검토가 필요함
2	홈베이스의 조성 방안	- 홈베이스는 활용 목적을 고려하여 휴게, 자기주도학습, 소인수 수업 등이 이루어질 수 있도록 복합적 공간으로 조성함 - 학교 공간의 공간 재구조화를 통해 교실 재배치 후 적절한 위치에 조성 - 활용 목적에 따라 사물함 설치 여부 고려 - 홈베이스의 유형: 복도를 활용한 유형, 유휴 교실을 활용한 유형, 건물 간 이동 통로를 활용한 유형 등 - 가능하면 학년별/층별 홈베이스를 우선하여 배치함 - 학교 구조 및 동선 등을 고려하여 접근성이 높은 곳에 위치를 선정함 - 복도에 홈베이스를 설치할 경우, 비상 시 피난 대피로 확보 등 건축 관련 법을 고려함 - 홈베이스에는 학생들의 활용 패턴을 고려하여 PC, 프린터 등의 기자재 설치 및 스마트 기기 활용에 따른 WiFi 설치를 고려함 - 홈베이스를 개방형 공간으로 구성(복도 측 벽을 개방)할 경우, 냉난방에 대한 에너지 효율 문제가 있을 수 있으므로 충분한 검토가 필요함
3	공용 공간 및 지원 공간의 조성 방식	- 공용 현관이나 복도 및 계단 공간을 활용하고자 할 때는, 피난과 이동 시 안전, 출입 동선의 혼잡 방지 등을 고려함 - 학생 작품 전시, 진로 또는 전공 과목에 대한 게시, 라운지 및 휴식 공간 등으로 활용 가능 - 교실 복도 창문 공간에 스탠딩 학습 공간을 조성할 경우, 소방법상 대피로 확보 여부를 확인하고, 복도 폭이 충분히 넓은 경우에 한 해 스탠딩 학습 공간을 설치함 - 건물 간 연결통로를 신설하는 것은 층축에 해당되어 원칙상 불가함 - 교무실, 교사협의실 등과 관련하여 교사 휴게만을 위한 공간 조성은 불가하며, 학생 상담 등 교육과정과 연계된 공간으로 조성하여야 함 - 도서관은 지원 공간의 복합성이라는 원칙에 따라 다목적 공간(러닝센터)으로 역할과 기능을 확장하여 조성함 - 컴퓨터실의 경우 액세스 플로어를 신규로 설치할 때에는 교실 층고 및 유지 관리의 적정성을 검토하여야 하며, 액세스 플로어를 설치하지 않고 운영하는 학교의 사례에 대한 안내도 필요함 - 체육교과와 연계한 체력단련실 등의 조성 시, 기구 사용에 따른 소음 진동에 대한 대처가 필요함

구분	컨설팅 의뢰 항목	컨설팅 내용 (예시)
4	유휴 공간의 활용 방안	- 지하공간의 활용은 사업 취지에 부합하는 경우에 한 해 허용되나, 환기 및 제습 설비 등의 투자가 필요하고 가능한 대공간으로 조성하여야 함 1층 필로티 공간은 야외 학습 공간이나 휴게공간으로 활용 가능하나 해당 교육청과의 협의가 필요함 - 1층 필로티에 벽체 설치의 증축에 해당되어 불가 - 외부 테라스(베란다)의 활용은 구조적 안전성, 바닥의 방수 공사, 안전 난간의 높이 등을 고려하여 교육청과 협의하여 우선 순위에 따라 결정함 - 야외 공간의 활용은 학점제형 공간으로 학습 공간에 해당하는 경우에 한 해, 교육청과 협의를 통해 추진해야 함 - 중정 공간을 활용하고자 할 경우, 단순 조경 공간으로의 조성은 사업 목적에 맞지 않으므로, 학점제 공간 조성의 사업 목적 부합성을 검토하고 실내 공간과의 연계성을 확인한 뒤, 추진 여부를 결정하여야 함
5	건축 환경 및 설비 검토 사항	- 교육시설 공간별 조도 기준에 적합하도록 천장 조명 설계가 이루어져야 함 - 가구 배치에 따른 적합한 조명의 배치와 인테리어적 요소 및 채광을 고려한 조명기구 등의 선정이 필요함 - 공간별 방음, 차음, 음향설비 등에 대해 사용자 의견 수렴을 통해 적절한 방식 및 성능 수준을 고려해야 함 - 개방형 천장을 조성하면 높은 층고로 인해 우수한 공간감을 얻을 수 있으나 천장 내 설비 등의 혼재되어 있을 경우 공사 난이도가 높으며, 추가 공사비, 소음 대책 등에 대해서도 면밀한 고려가 필요함 - 공간구획을 위해 강화유리를 설치할 시, 안전, 사생활 보호, 학생 지도 등을 고려해야 함 - 상기의 요소들은 공사비 상승과 관련되므로 실시설계 후 내역 산출을 통해 우선 순위를 고려하여 최종 확정함
6	건축 설계 및 사후 관리	- 설계도를 확정하기 전에 자재, 방음, 규격 등 교직원 및 학생이 놓치기 쉬운 분야에 대한 검토가 필요함 - 홈베이스, 도서관, 컴퓨터실 등은 학생들의 활동을 감안하여 콘센트 위치, 인터넷 포트 및 WiFi, 가구의 종류 및 규격 등이 설계에 세부적으로 반영될 수 있도록 함 - 설계를 통해 산출된 내역을 검토하여 예산 초과 여부에 대해 확인하고 예산 초과 시 시공에서 배제될 순위를 선정함 - 인건비 및 건축자재비 상승 등의 여건 변화로 인해 매년 공사비가 상승하고 있어서 자재 선정 등에 있어 합리적인 건축 설계가 필요함 - 내진 및 석면 제거가 선행되어야 함을 안내함 - 실시설계 완료 후 공사 단계에서 설계 관리(감리)에 대한 업무가 발생함을 안내함 - 실시설계가 끝나면 교육지원청에서 설계 승인을 받는 절차가 있음을 안내하고, 이를 고려한 공사 일정을 수립하도록 함
7	시설 중복 투자 방지	고교학점제의 원활한 운영을 위해 공간 재구조화를 실시하고 마스터플랜을 수립하여 기투자 공간과 추후 사업 계획 공간을 전체적으로 고려하여 사업 대상 공간을 결정함

※ 시·도교육청별 컨설팅 기준 및 내용은 상이할 수 있음

기타

〈표 24〉 기타 컨설팅 사례

구분	컨설팅 의뢰 항목	컨설팅 내용 (예시)
1	공간 명칭 선정	- 교과교실의 다목적성을 고려한 명칭을 선정함 - 여러 개의 건물로 이루어진 경우 : 건물명과 호수를 병기 (예) M101호(건물 약자+1층+왼쪽에서 첫 번째 교실) - 단독 건물로 이루어진 경우 : 대학 강의실과 같이 번호로 호실을 표기 (예) 101호 - 수업 형태별 구분을 강조한 명칭을 선정함 - 멀티미디어 러닝룸, 학습 스튜디오 등 - 학생, 학부모, 교직원 공모 등을 통해 공간 명칭을 선정하여 사용자의 참여를 유도함
2	팻말 제작	- 교실의 위치와 용도를 모두 파악할 수 있도록 팻말에 명칭 표기 (예: A205. 온라인학습실 / B401. 도서실) - 추후 교육과정의 변화 및 공간 재구조화 사업을 고려하여 교체가 쉬운 형태의 팻말로 설치함

※ 시·도교육청별 컨설팅 기준 및 내용은 상이할 수 있음

4) 컨설팅 기대 효과

사업 진행 사항 검토

- 컨설팅을 통해 대상 학교에서 계획한 공간 조성 진행 사항을 검토하고 학교 공간 조성의 방향성을 변경하거나 유지함
- 조성 범위에 따라 적합한 추진 일정 및 공사 일정에 대한 컨설팅이 가능함

학교 여건에 맞는 단계별 기존 선례 공유 및 공간 아이디어 발굴

- 컨설팅을 진행하면서 컨설턴트의 의견 청취를 통해 학교 구성원들이 미처 생각하지 못했던 아이디어 도출이 가능함
- 공간 확보가 어려운 경우, 컨설팅을 통해 자투리 공간을 발굴하거나 통합 사용이 가능한 공간 제안이 가능함
- 기조성 경험 노하우 및 전문가적 시각을 활용하여 해당 학교 여건에 맞는 공간 조성 아이디어를 도출함

건축 설계안에 대한 세부 검토

- 작성된 건축 설계안에 대해 기존 사례를 바탕으로 공간 조성 경험에 대한 노하우를 공유하고 보다 나은 공간 제안을 위한 전문가적 견해를 전달할 수 있음

- 설계 및 시공단계에서 발생할 수 있는 법적, 기술적 조건을 체크하고, 기능성, 심미적 측면 뿐만 아니라 안전과 효율성 측면에서의 설계 요소를 사전 검증함
- 공간 조성 후, 활용 시에 발생할 수 있는 문제점 검토 및 보완점 도출이 가능함

» 의견 수렴 과정에서의 갈등 조율

- 변경이 필요한 공간에 대해 공간 조성 방향 및 사업 대상 공간의 우선순위를 선정하는 과정에서 컨설턴트의 의견 청취가 가능함
- 업무 추진 중, 의견 충돌 발생 시 컨설팅을 통해 조율이 가능함

라. 기본설계

1) 일반적인 건축 설계 과정의 이해

» 신축의 건축 설계 과정

- 일반적인 신축(신설)의 건축 설계 과정은 건축사의 고유한 영역으로 기획업무, 계획설계, 중간 설계, 실시설계, 사후 설계 관리의 총 5단계로 진행됨
- 5단계의 건축 설계 과정에 대한 구체적인 정의, 세부 업무 내용과 그에 따른 작성 도서 등을 정리하면 아래와 같음

기획업무	계획설계	중간 설계	실시설계	사후 설계 관리
디자인을 위한 기본적인 정보를 확인할 수 있는 도면을 작성하는 과정. 이 과정은 공간 조성 방향 설정에 중요한 과정임	기획설계에서 결정된 내용을 도면화하는 과정으로 사용자 요구 사항 반영 및 시공도면 작성에 필요한 중요 사항을 결정하기 위해 의뢰인과의 대화와 협의를 통해 건축, 구조, 재료, 설비, 색상 등 총체적인 디자인 결정	계획설계를 더욱 심화하는 과정으로 계획도면을 구체화하여 구조계획과 설비계획 등의 치수를 정확히 결정하고 표현	건축물을 정확히 시공하기 위해 모든 건축 요소를 결정하여 도면으로 작성하는 과정. 구조, 설비, 냉난방, 배관, 방화계획 도면에 반영하고, 도면에 표현하기 어려운 내용은 시방서 등 관계 도서를 작성	건축설계가 완료된 후 시공 과정에서의 설계감리
• 규모 검토 • 법규 검토 • 현장 조사 • 설계지침서 • 공정표 • 사례 조사	• 법규 검토 • 대지 분석 • 계획 방향 • mass 계획 • 평면 계획 • 입면 계획 • 단면 계획 • 구조 계획 • 동선 및 주차 계획	• 배치 계획 • 평면 계획 • 입면 계획 • 단면 계획 • 구조 계획 • 토목 계획 • 기계설비 계획 • 소방설비 계획 • 전기설비 계획 • 조경 계획	• 공사용 도서 작성 • 상세도면 작성 • 각 분야 도면 작성 • 시방서 작성	• 공정별 감리보고서

출처: 대한건축사협회(<https://www.kira.or.kr/index.do>)

[그림 31] 건축 설계 과정


- 건축법상 신축 건물의 건축설계의 경우, 건축물의 규모에 따라 다르지만 단계별로 기획 업무와 계획설계를 합쳐 전체 공정의 20%, 중간 설계를 30%, 실시설계를 50%로 볼 수 있음

※교육시설 설계비 1억 이상인 경우 기획 업무는 별도로 진행

- 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 경우 사업유형이 증설과 전환으로 진행되며 건축법상 증설은 증축, 전환 중 리모델링은 대수선에 해당하는 것으로 업무 내용은 실내 건축, 공간 디자인, 인테리어 설계에 더 가깝다고 할 수 있음

2) 고교학점제 학교 공간 조성 사업 설계 과정

- 고교학점제 학교 공간 조성을 위한 설계 과정은 아래와 같이 정리할 수 있음

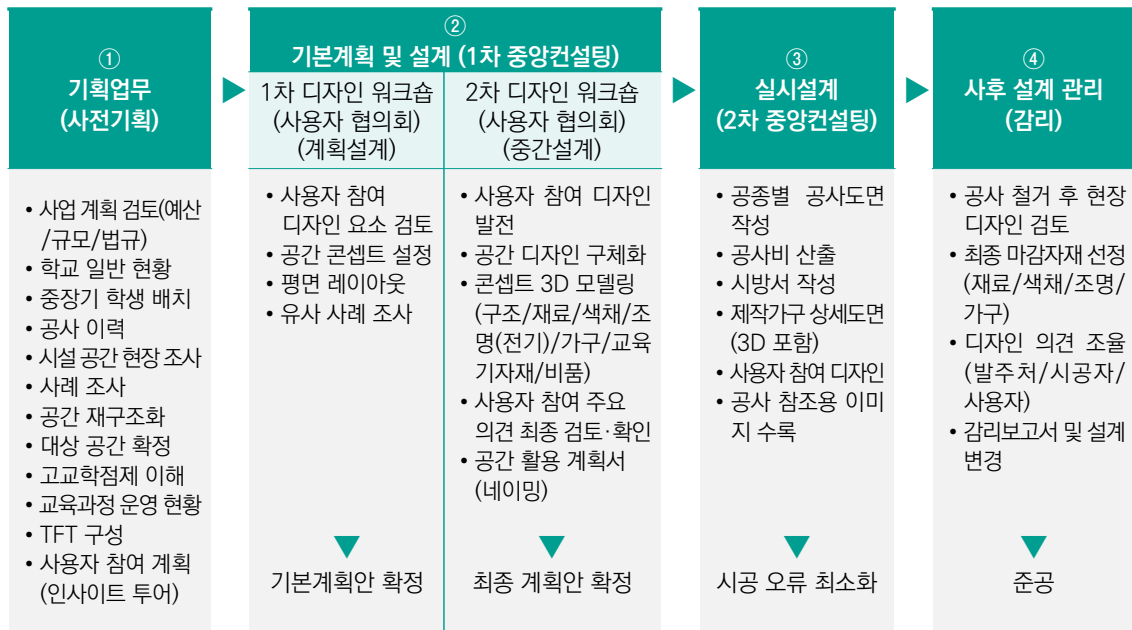

[그림 32] 고교학점제 학교 공간 조성 사업 설계 과정

» (1단계) 기획업무(사전기획)

- 기획업무 단계는 고교학점제 학교 공간 조성 사업의 전체적인 사업 추진 방향 등을 설정하는 단계를 말함
 - 사전기획 업무가 법제화되면서 초·중등교육법 제2조 학교의 교육시설을 건축하거나 리모델링 하는 사업으로서 그 설계비 추정가격이 1억 원 이상인 사업인 교육시설 사업의 경우 ‘교육시설의 사전기획 등 업무수행 지침’에 규정된 방식과 절차에 따라 별도 업무로 사업을 진행하여야 함¹⁰⁾
 - 다만, 고교학점제 학교공간 조성 사업은 대부분 총설계비가 1억 원 미만으로, 이 경우 사전기획 단계를 반드시 별도로 진행할 필요는 없음
- 기획업무 단계의 검토 내용
 - 시도교육청에 따라 학교 공간 조성 사업의 추진을 위한 퍼실리테이터(촉진자) 또는 실시설계자가 학교 업무 담당자와 사전협의회를 거쳐 학교 공간 조성 사업 관련 신청서를 토대로 학교의 일반 현황, 고교학점제 운영 현황, 사업 유형(증설 실 수와 전환 실 수), 배정 예산, 시설 현황(학교 교실배치도 및 평면도, 최근 7년 이내 특수목적비에 따른 기 투자실), 공간 활용 계획 등을 파악함
 - 학교 업무 담당자는 촉진자와 함께 배정 예산에 따른 시설, 기자재, 비품 등 항목별 예산 집행액을 확인, TFT 구성, 사용자 참여 계획(인사이트 투어 포함)등에 대한 계획을 기획업무 단계에 수립이 필요함
 - 촉진자 또는 실시설계자는 대상 학교의 교육과정 운영을 이해하기 위해서는 학교 교육과정 이수 계획서를 검토하고, 고교학점제 학교 공간 조성 사업에 대해 이해하기 위해서는 한국교육개발원에서 발행하는 고교학점제 운영 안내서를 참고하고 연수에 참여하고, 홈페이지나 유튜브 등을 통해 고교학점제 학교 공간 조성 우수학교 사례 조사를 실시하고, 인사이트 투어 등에 참여할 필요가 있음
 - 또한 학교에서 사용하고 있는 교실 배치도(일반적으로 엑셀이나 한글로 작성되어 있음)를 토대로 교육청 또는 학교 행정실을 통해 학교시설 현황의 캐드 도면, 즉 에듀빌 도면을 받은 후 현재 학교 교실 배치도를 토대로 현재 운영되는 공간과 비교, 확인하여 수정 작업을 하고, 학교시설 현황에 대한 현장조사를 실시함

10) 교육시설의 사전기획 등 업무수행 지침(시행 2023년 4. 21)(교육부고시 제2023-16호, 2023.4.21 일부개정): 총설계비가 1억 원 이상인 교육시설의 경우, 설계 전에 교육과정 운영 및 교수학습 방법에 따른 공간 구성, 교육시설과 지역사회 연계에 관한 사항, 사업의 규모, 내용 및 사업비 등 사업의 추진에 관한 사항, 사용자 참여를 통한 디자인 계획 및 안전에 관한 사항, 발주 방식에 관한 사항, 에너지 효율화 등 지속가능성 제고 방안 등에 관한 사전 전략 수립 등을 별도의 사전 기획 업무로 진행하여야 함.

- 학교시설 현황 조사는 학교 업무 담당자 및 행정실과 함께 진행하면서 공간 사용에 있어 불편한 점이나 개선할 점, 반영할 점 등에 대한 학교 의견을 수렴함. 또한 최근 이미 투자된 공간은 중복 투자되지 않도록 투자 범위를 확인하고, 향후 예정된 공사에 따른 진행 상황, 공사 시기 등을 검토하여 사업추진계획을 검토
- 사업유형이 증설일 경우, 수직 증축 또는 수평증축 가능성 확인 후 적절한 증설 위치를 검토하며, 구조적 안전성, 지질조사 자료, 추가되는 연면적에 따라 법규를 검토하고 인허가 절차를 사전에 확인
- 촉진자는 기존 시설 현황 리서치 분석 자료와 고교학점제형 교육과정 운영을 위한 학교 공간 조성 원리를 토대로, 학습 공간의 유연성, 지원 공간의 복합성, 공용 공간의 활용성, 동선의 효율화 학생 이동 동선을 고려한 공간과 교육과정의 연계성을 목표로 해야함. 적절한 위치에 홈페이지, 미래 융합교육 공간 등이 배치되도록 학교의 공간 조성 방향을 설정하고 교실 재배치에 대한 공간 재구조화를 실시한 후 사용자 협의회(워크숍)를 진행하여 대상 공간과 우선 순위를 확정함
- 촉진자는 대상 공간의 확정시 예산 범위에 따른 공사 우선 순위를 내부적으로 결정할 필요가 있으며, 실시설계 이후 구체적인 공사비 산출 후 예산에 따라 우선 순위에 따라 최종 대상 공간이 확정됨을 학교에 안내 필요



[그림 33] 공간 재구조화 사례(충남 건양고등학교 사례)

» (2단계) 기본계획 및 설계 단계


- 촉진자가 주관하며 기획업무 단계의 자료를 토대로 사용자 참여 의견을 반영하여 대상 공간에 대한 공간 구성 아이디어와 콘셉트 등의 학교 공간 조성(안)을 실제 시각화하여 기본계획 및 설계도면으로 표현하는 단계이며, 계획설계와 중간 설계 단계를 합한 개념으로 디자인 워크숍으로 진행됨
- 1차 디자인 워크숍
 - 1차 디자인 워크숍에서는 현황조사 분석 결과, 우수사례 조사, 인사이트 투어 등 사용자 참여 결과물을 토대로 대상 공간에 대한 학교의 의견을 토대로 디자인 요소를 검토하고 공간디자인 콘셉트를 설정하기 위해 사용자와 협의하는 단계로 참석 범위(학생, 교사, 학부모, 지역주민, 동문회 등)는 학교 여건에 따라 결정하여 진행
 - 1차 디자인 워크숍에서는 현황조사에서 발견된 문제점과 공간 재구조화 전후의 공간 변화, 대상 공간에 대한 대략적인 공간 레이아웃이 작성된 평면, 유사 사례 사진 등을 시각적 자료를 활용하여 사용자 의견을 최대한 수렴하는 것이 중요함
 - 수렴된 사용자 의견을 기반으로 한 기본 계획안과 더불어 기본 콘셉트를 벗어나지 않는 범위에서 대안을 제시하여 설계안의 확일성을 지향하고, 다양한 해결 방안이 도출될 수 있는 피드백이 필요함
 - 건축적인 표현보다는 공간을 재구성하기 위한 스케치 중심의 워크숍 진행으로 다양한 아이디어 도출하는 방법이 좋으나, 기본설계가 사진 첨부 또는 개략 스케치와 같이 지나치게 개념적으로 표현될 경우 실시설계 단계에서 의견 수렴이나 도면 수정·확정을 위한 시간이 추가적으로 많이 소요되므로 사용자 참여 의견이 명확하게 표현될 수 있도록 작성하는 것이 중요함



[그림 34] 1차 디자인 워크숍 사례(충남 건양고등학교 러닝센터 사례)

• 2차 디자인 워크숍


- 2차 디자인 워크숍의 기본계획 도면은 1차 디자인 워크숍에서의 의견을 반영한 적정 크기의 필요 공간, 가변 벽 등 내부 구조를 파악할 수 있는 기본 치수를 포함한 레이아웃이 표현된 평면도와 디자인 콘셉트에 부합하는 벽과 천장의 입체 공간 구조(가변 벽 설치 위치, 수업 가능한 학생 인원 등) 및 마감 재료, 색채, 조명, 가구, 교육기자재, 비품 등 세부 디자인 요소를 이해할 수 있도록 시각화 자료(스케치업 등 프로그램을 활용한 3D 실내 투시도, 유사 사례 사진) 등으로 작업하는 것이 바람직함(1차 중앙컨설팅 추진)
- 학교 공간 조성안에 대한 기본설계 최종안은 최종보고회 등을 통해 사용자 의견, 특히 학생들의 의견에 대한 반영 및 미반영 내용을 안내하여 피드백이 될 수 있도록 함
- 기본계획 및 설계 단계에서는 학교 공간 조성안의 내용을 구성원과 공유하며, 의견을 반영하여 실시설계로 연계될 수 있도록 하는 것이 중요하므로 촉진자가 기획업무를 포함하여 인사이트 투어, 사용자 참여 결과물 및 최종 기본계획안에 대한 보고서 및 도면을 충실하게 작성하여 실시설계를 진행할 건축사에게 잘 전달될 수 있도록 하는 것이 중요함

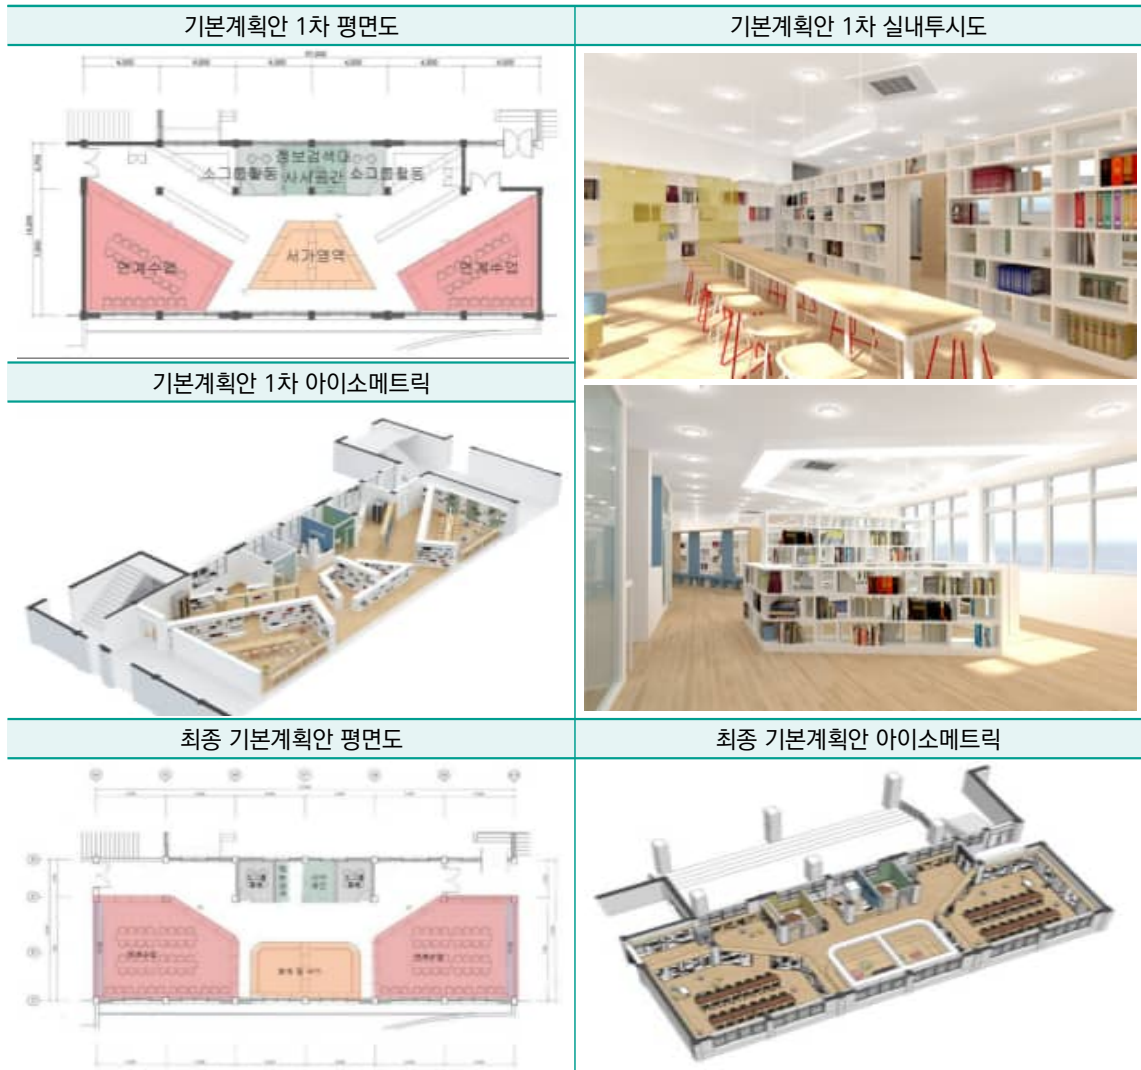


[그림 35] 2차 디자인 워크숍 사례(충남 건양고등학교 도서관 사례)

» (3단계) 실시설계


- 실시설계 단계는 공사를 위한 대상 공간에 대한 세부적인 도면을 작성하는 단계로 건축사 면허를 소지한 건축사사무소에서 주관하여 건축 실시설계를 진행하여야 함. 이때 대상 공간에 대한 현황 도면을 작성하여 철거, 이전 설치, 재사용 등을 학교 업무 담당자 및 행정실에 확인 후 실시설계 도면에 기술하여야 하며, 철거 비용도 본 사업 예산에 포함된다는 것을 안내할 필요가 있음
- 이 단계에서는 대상 공간의 최종 기본계획안을 토대로 건축 인테리어 실시설계 수준의 도면이 필요하며 도면의 구성은 대상 공간의 철거 전과 후의 도면이 필요하며, 평면도, 천정도, 가구 배치도뿐만 아니라 공간구성에 따라 냉난방을 포함한 전기(조명-콘센트 위치 포함), 교육 기자재와 연계된 통신, 안전상 소방 등 분야별 세부 실시설계 도면이 구체적으로 작성되고, 도면에서 표현하기 어려운 경우 필요시 시방서가 작성되며 실시설계 도서에 따라 산출된 공사비와 시공에 필요한 마감 재료 등 자재의 사양(스펙)이 기재된 내역서가 포함됨
- 도면작성 시 재활용되는 기존 가구, 제작가구, 구매해야 하는 비품 등을 구분하여 명확하게 학교에 안내해야 함. 제작 가구와 학교에서 구입해야 하는 비품을 구분하여 표기하는 것이 필요함
- 실시설계 완료 후 산출된 내역서와 학교에 배정된 예산 등을 검토하여 우선순위에 따라 공사 범위 및 내용을 학교와 협의를 통해 결정할 필요가 있음(2차 중앙컨설팅 추진)
- 실시설계는 건축사만의 고유한 영역으로 실시설계자와 촉진자로서 기본계획안을 작성한 사람이 동일할 경우에는 사용자 참여부터 실시설계까지 일관성 있게 잘 진행될 수 있음. 그러나 동일하지 않을 경우 가능한 사용자 참여와 기본계획안 작성 전에 실시설계 계약을 하여 같이 참여할 수 있도록 하는 것이 바람직함
- 실시설계의 디자인 워크숍을 통한 사용자 협의회 시에는 기본계획에서 확정된 내용을 이해할 수 있도록 시각화 자료를 제공받아야 함. 교사, 학생들이 쉽게 이해할 수 있는 3D 이미지, 색채 및 마감재료가 기재된 실내입면도, 제작가구 설치 위치 및 가구 상세도면 등을 활용한 변경 전과 후의 실시설계 도면을 작성해야 함. 협의 자료는 추후 시공사가 결정되면 참고용 자료로 활용되어 인테리어 공사 현장에 대한 이해도가 향상되어 시공 오류를 줄이는 데 도움이 됨

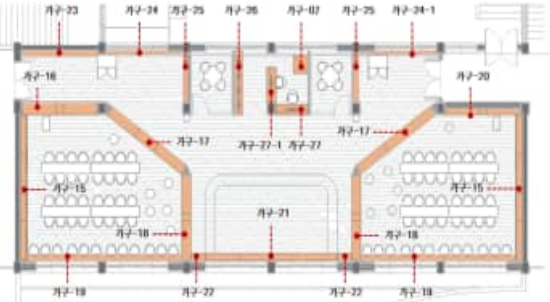내부 마감 재료 및 색채 계획	
	천정 경량천정틀+THK9.5 석고보드 위 비닐페인트- 신설 (조명기구 위치 확인 후 타공및 틀작업)
	벽 미송각재틀(30X30@300) 위 THK9.5 석고보드 2겹 위 낙서방지페인트(H1200) 2회 친환경수성페인트 2회 - 신설
	바닥 기존 목재틀위 내수합판+후로링보드- 신설
	걸레받이 미송각재틀(30X30@300)위 THK9.5 석고보드 2겹 위 세라민페인트(MC2028) - 신설
제작가구 위치도	제작가구 상세도
	

[그림 36] 실시설계 디자인 워크숍 2차(사용자 협의회)(충남 건양고등학교 도서관 사례)

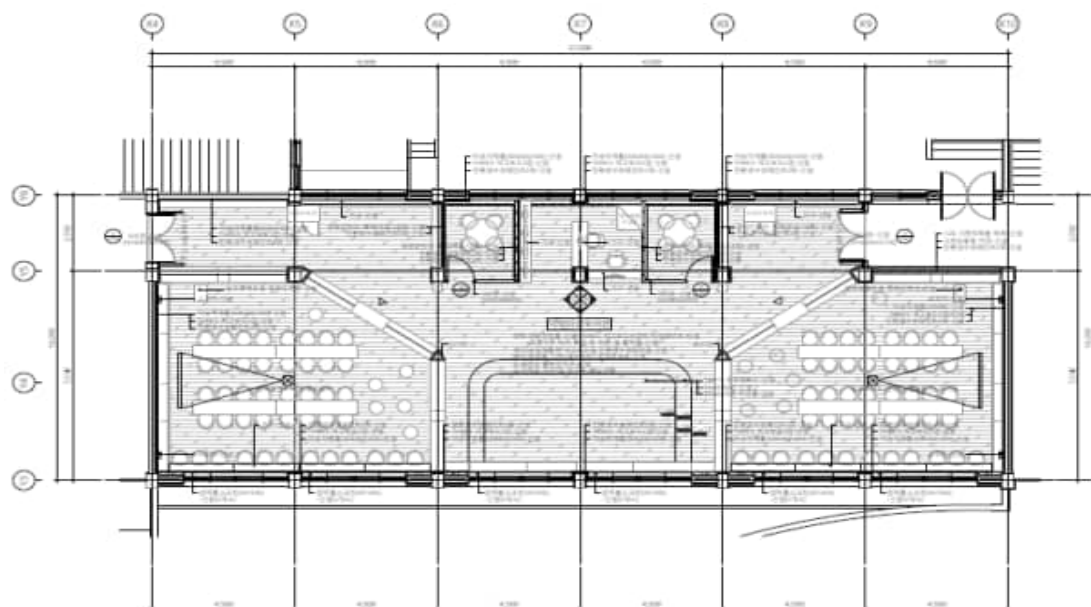

건양고등학교 지상1층 다정다감도서관 평면도(변경후)



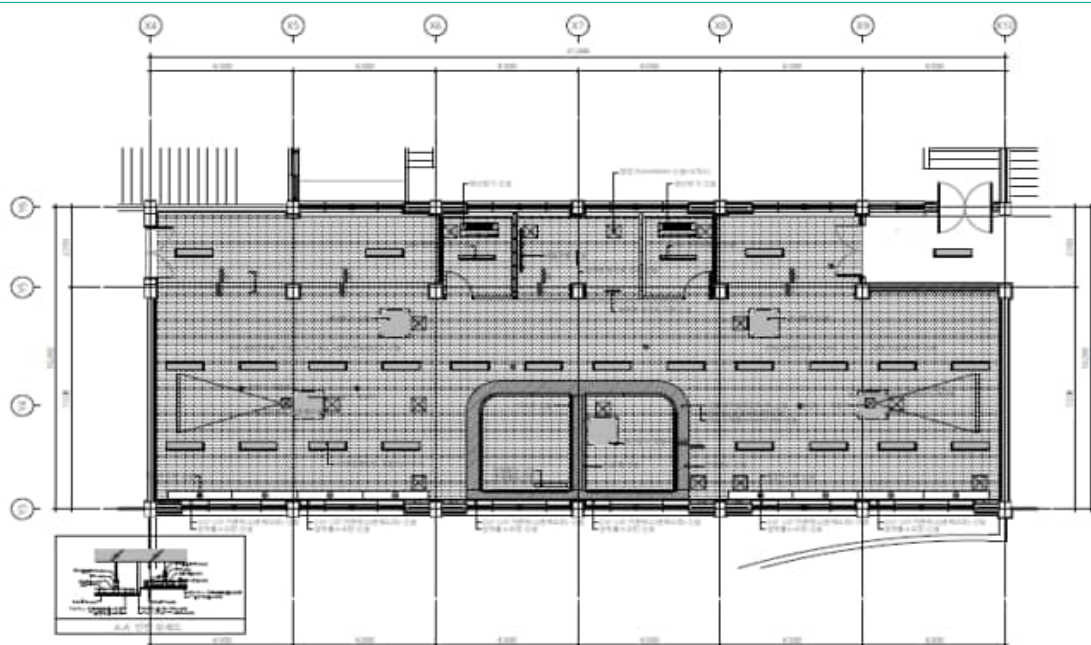


건양고등학교 지상1층 다정다감도서관 천장평면도(변경후)

단 계		단 계	
1. 1층	2. 2층	3. 3층	4. 4층
5. 5층	6. 6층	7. 7층	8. 8층
9. 9층	10. 10층	11. 11층	12. 12층
13. 13층	14. 14층	15. 15층	16. 16층
17. 17층	18. 18층	19. 19층	20. 20층
21. 21층	22. 22층	23. 23층	24. 24층
25. 25층	26. 26층	27. 27층	28. 28층
29. 29층	30. 30층	31. 31층	32. 32층
33. 33층	34. 34층	35. 35층	36. 36층
37. 37층	38. 38층	39. 39층	40. 40층
41. 41층	42. 42층	43. 43층	44. 44층
45. 45층	46. 46층	47. 47층	48. 48층
49. 49층	50. 50층	51. 51층	52. 52층
53. 53층	54. 54층	55. 55층	56. 56층
57. 57층	58. 58층	59. 59층	60. 60층
61. 61층	62. 62층	63. 63층	64. 64층
65. 65층	66. 66층	67. 67층	68. 68층
69. 69층	70. 70층	71. 71층	72. 72층
73. 73층	74. 74층	75. 75층	76. 76층
77. 77층	78. 78층	79. 79층	80. 80층
81. 81층	82. 82층	83. 83층	84. 84층
85. 85층	86. 86층	87. 87층	88. 88층
89. 89층	90. 90층	91. 91층	92. 92층
93. 93층	94. 94층	95. 95층	96. 96층
97. 97층	98. 98층	99. 99층	100. 100층

출처: 바오플랜건축사사무소+(주) 레오플 디자인연구소(2023).

[그림 37] 실시설계 평면도/천정도(충남 건양고등학교 도서관 사례)

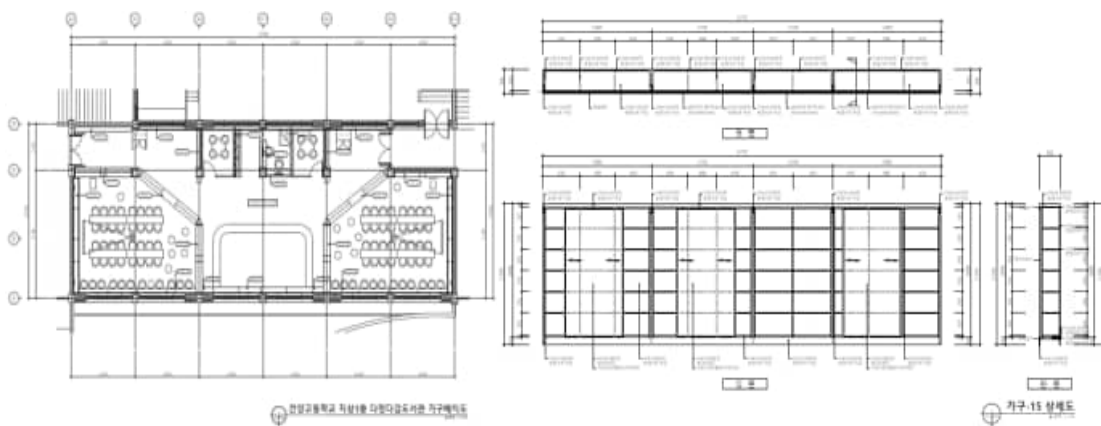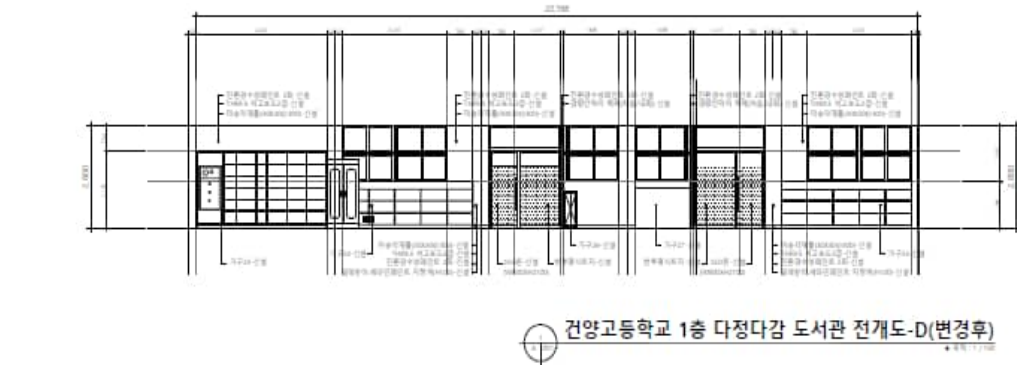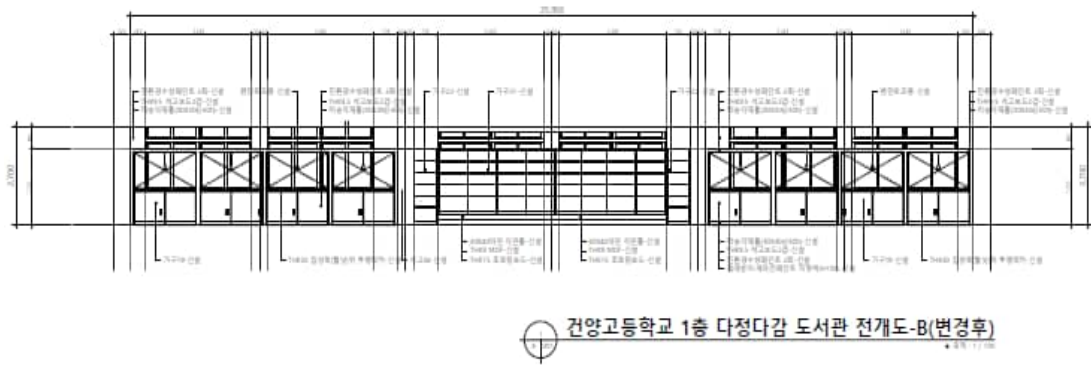

출처: 바오플랜건축사사무소+(주) 레오플 디자인연구소(2023).

[그림 38] 실시설계 입면도/제작가구(충남 건양고등학교 도서관 사례)

» (4단계) 사후 설계관리(감리)

- 시공 단계의 디자인 감리 단계로 실시설계대로 공사가 진행되는지를 감독하는 업무임. 실시설계 도면 이외에 기본계획안 디자인 워크숍에서 사용했던 기작성된 시각화 자료, 제작가구 도면 3D 이미지 등을 활용하여 디자인을 검토함. 마감소재와 색채를 선정할 경우, 실제 시공될 재료 샘플북을 활용하여 사용자와 소통하면 의사 결정이 신속하게 이루어져 공사 진행이 원활함
- 공사 착공 후 공사 현장에서 예상하지 못한 상황이 발생할 경우에는 사용자, 교육청, 시공사 간의 해결을 협의하여 시공 상황에 따른 실시설계의 적절한 설계변경을 진행해야 할 경우가 있음
- 사후 설계관리는 건축사의 고유한 업무로 기본계획안을 작성한 축진자가 건축사인 경우, 실시설계를 진행한 건축사, 따로 감리계약을 체결한 또 다른 건축사의 3가지 경우 중 하나로 진행될 수 있음. 가능하면 기본계획안을 작성하거나 실시설계를 진행한 건축사가 담당하는 것이 바람직함
- 공사가 완료된 준공 후에는 공정별 감리수행 내용에 대한 감리보고서나 디자인컨설팅 최종보고서를 작성하여 제출할 의무가 있음



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 39] 마감 재료 샘플북 사례

마. 구체화 시 유의 사항

1) 학점제형 학교 공간 설계 및 시공 주안점

» 학교 시설 노후화에 따른 구조, 기반 시설 등 재구조화 기초 환경 확보 필요

- 내진 보강 공사(예정)에 따른 재구조화 방향 고려
- 석면철거(예정)에 따른 재구조화 방향 고려
- 무선 인터넷 환경 확보 필요
- 이동식 교육기기 활용 환경(충전 등) 확보
- 창호 등 노후 자재를 교체할 경우 단열 등 에너지 성능을 고려하여 설계 및 자재 선정 필요
- 기존 시설 철거시 건축물관리법 제30조에 따른 '건축물 해체허가(또는 신고)'에 의거 적법한 절차에 따라 안전에 유의하여 진행할 것

» 학교시설 기시공에 따른 예측 불가 설계 및 시공 상황 발생

- 천장 텍스 해체 시, 마감 현황 및 배선 현황에 따른 설계 및 시공 변수 대비
- 천장 텍스 해체 시, 냉난방 기기 및 소화 안전 점검 시설 설계 및 시공 변수 대비

» 학습 환경 안전기준(방염 환경 확보, 공기 질 개선, 사고 예방 등) 안내 필요

- 새로운 실내 자재 도입 시, 방염기준 필요
- 실내공간 통합 또는 분리 시, 구조 벽체 및 방화구획에 대한 점검과 피난 통로를 위한 복도 너비 및 설치 기준 준수
- 소방환경(비상동선, 소화전, 소방기구) 확보 확인

» 기존 시설 재구조화에 따른 냉난방 환경 고려

- 실내 복도, 전이공간 학습환경으로 활용 시 냉난방 조닝 및 효율적 에너지 활용 대안 제시 필요

» 유연한 공간 활용을 대비한 공공건축 기준에 준하는 설계, 시공 수준 향상 필요

- 교육과정 변화에 따른 유연한 공간 활용에 대비하여, 공간 재구조화 가능성을 포함한 학교 공간 설계 및 시공 기준 마련 필요(학교별 시공연도 고려)
- 시공 자재, 설계 방법에 따른 안전기준을 명확히 하되, 새로운 설계 및 시공 방향 시도를 위한 유연한 기준 적용과 교육시설물 외 공공건축물 기준으로 설계비 및 시공비 단가 상향 필요

2) 사업 설계 시 참고 법령

〈표 25〉 사업 설계 시 참고 법령

구분	법적 근거	법규 내용
계단의 설치 기준	- 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제15조	- 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단은 다음 기준에 적합하여야 함 - 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치할 것 - 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치 되는 것을 포함)을 설치할 것 - 너비가 3m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3m 이내마다 난간을 설치할 것. 다만, 계단의 단 높이가 15cm 이하이고, 계단의 단 너비가 30cm 이상인 경우에는 그러하지 아니함 - 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이)는 2.1m 이상으로 할 것 - 옥내계단의 설치 기준 - 계단 및 계단참의 유효너비는 150cm 이상, 단 높이는 (초등학교 : 16cm 이하, 중/고등학교 : 18cm 이하) 단 너비는 26cm 이상으로 할 것
복도너비 및 설치 기준	- 건축법 제49조 - 건축법시행령 제48조 - 건축물의 피난, 방화구조등의 기준에 관한 규칙 제15조2	- 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 - 양옆에 거실이 있는 복도 : 2.4m 이상 - 기타의 복도 : 1.8m 이상
대지안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치	- 건축법시행령 제41조	- 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지로 통하는 통로를 설치하여야 함 - 통로의 유효너비 1.5m 이상
방화구획의 설치 기준	- 건축법 제49조 - 건축법시행령 제46조 - 건축물의 피난, 방화구조등의 기준에 관한 규칙 제14조	- 설치 대상 - 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것 - 설치기준 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000㎡ (스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3,000㎡) 이내마다 구획할 것 - 매층마다 구획할 것. 다만, 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로 부위는 제외함
구조안전 확인	- 건축법 제48조, 제48조의3 - 건축법시행령 제32조 - 학교시설 내진설계 기준 (교육부 고시 제2020-2223호)	- 구조 안전의 확인 서류 제출 대상 - 층수가 2층 이상, 연면적 200㎡ 이상, 높이 13m 이상, 처마높이 9m 이상, 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물 - 건축물의 내진능력 공개 대상 - 층수가 2층 이상인 건축물, 연면적 200㎡ 이상인 건축물

구분	법적 근거	법규 내용
건축물 해체	- 건축물관리법 제30조, 제30조의 2, 제30조의 4 - 건축물관리법 시행령 제21조, 제21조의 3, 제22조, 제23조의 2 - 건축법 제2조 제1항 제7호	• 건축물 해체 신고 및 허가 대상 - 신고대상 : 1) 주요구조부(내력벽, 기둥, 바닥 등)를 해체하지 않는 건축물의 해체 2) 연면적 500㎡ 미만 / 건축물 높이 12미터 미만 / 지상층과 지하층을 포함하여 3개층 미만인 건축물 3) 바닥면적의 합계 85㎡ 이내 증축, 개축, 재축 (3층 이상 건축물의 경우 연면적의 1/10 이내) 4) 연면적 200㎡미만 + 3층 미만 건축물의 대수선 5) 관리지역 등에 있는 높이 12미터 미만의 건축물 - 허가대상 : 신고대상 외 건축물 • 해체공사감리자 지정 및 자격 요건 - 지정대상 : 허가대상 건축물 - 자격요건 : “건축사법” 또는 “건설기술진흥법”에 따른 감리자격이 있는 자 (공사 시공자 본인 및 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 제2조에 따른 계열회사는 제외) - 해체공사 감리업무 신규교육 또는 보수교육을 3년 이내에 이수한 자 • 건축물 해체계획서 작성 (필요시 구조안전 검토서 첨부)

3) 현장 사진

(사례1) 텍스 내부 시공 품질 향상 필요	(사례2) 텍스 내부 배수관 정리 작업 필요
	
(사례3) 냉난방기 (자연)배수관 기울기 차이	(사례4) 소방 협의 후, 소화전 이전 설치
	

출처: 작성자 직접 촬영

[그림 40] 시공 유의 사항 현장 사진

4. 건축 설계 및 시공

가. 설계 용역 및 시공

1) 퍼실리테이터, 설계 용역 및 시공 계약의 발주 방식 비교

〈표 26〉 발주 방식 비교

구분	별도 발주 방식	통합 발주 방식
용역 계약	촉진용역 계약, 설계용역 계약	설계용역 계약
참여 전문가	퍼실리테이터, 설계자	건축사(사용자 참여 설계를 포함한 실시설계 업무를 수행이 가능한 건축사면허 소지자)
장점	분야별 전문성 확보 용이	일관되고 신속한 용역 계약 및 수행
단점	전문가 간 불협 시 사업 추진 어려움	용역비 상승에 따른 수의계약 범위 초과 시 공모 및 계약업무 부담 증가
특징	사용자 참여 설계가 일반 건축설계와 차별화된 경우 효과적	사용자 참여 설계의 과정 자체가 실시설계 구현과 직결되는 경우

출처 : 경남교육청(2022).

2) 수의 계약 범위


- 용역비의 수의 계약 가능 범위는 관련 법령에 따라 추정가격 2,000만원 이하까지 가능함 (교육부 교육시설과-8979, 2020.9.1.)
- 단, 여성기업지원에 관한 법률 시행령에 의거 여성 기업은 5,000만원 이하까지 수의 계약이 가능함

3) 설계자 계약

- 사용자 참여 설계 진행 중에 설계 계약: 설계자와의 계약 시기는 프로젝트 계획이 수립된 후 조기에 계약을 실시하여 촉진자와 원활하게 소통이 되는 것이 바람직함
- 촉진자와 설계자가 소통하여 사용자 참여 설계 내용 실시설계 반영 필수: 촉진자와 설계자가 일치하지 않는 경우 주의해야 함(별도 발주 방식)


4) 실시설계 용역 계약

- 계약과정(국·공립)

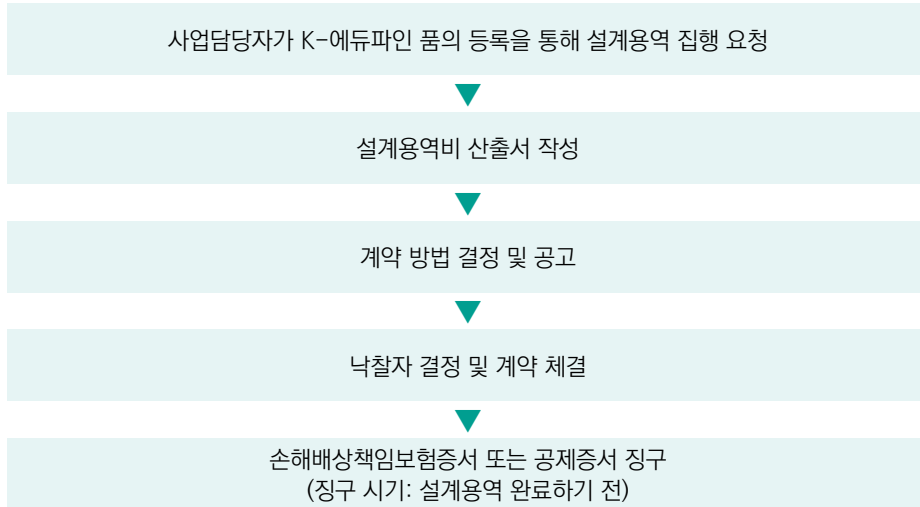


[그림 41] 국·공립학교 실시설계 용역 계약 과정

- 계약과정(사립)

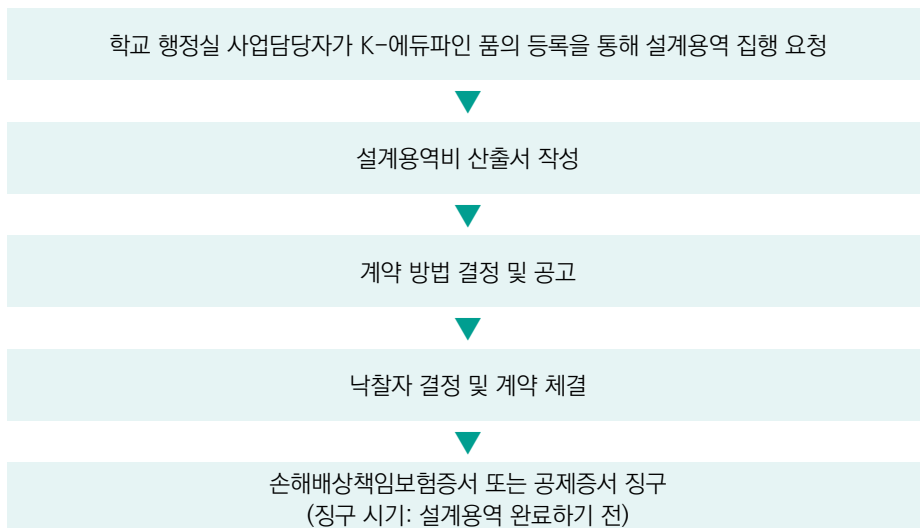


[그림 42] 사립학교 실시설계 용역 계약 과정

5) 실시설계 검토 및 완료

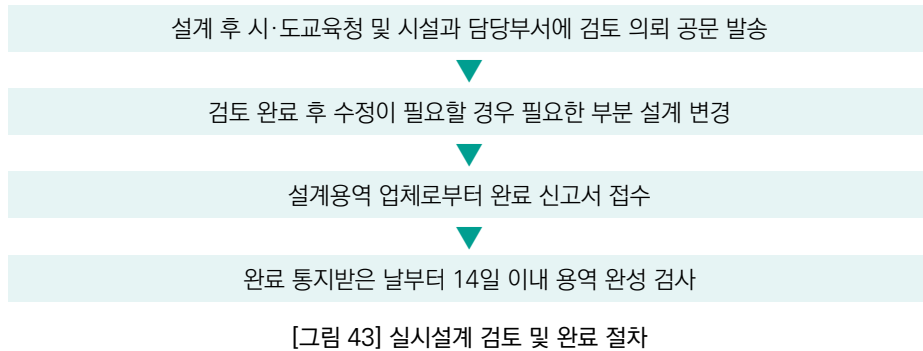

6) 공사 업체 계약(10월~11월)

- 공사 업체 계약 절차 및 공고 사항

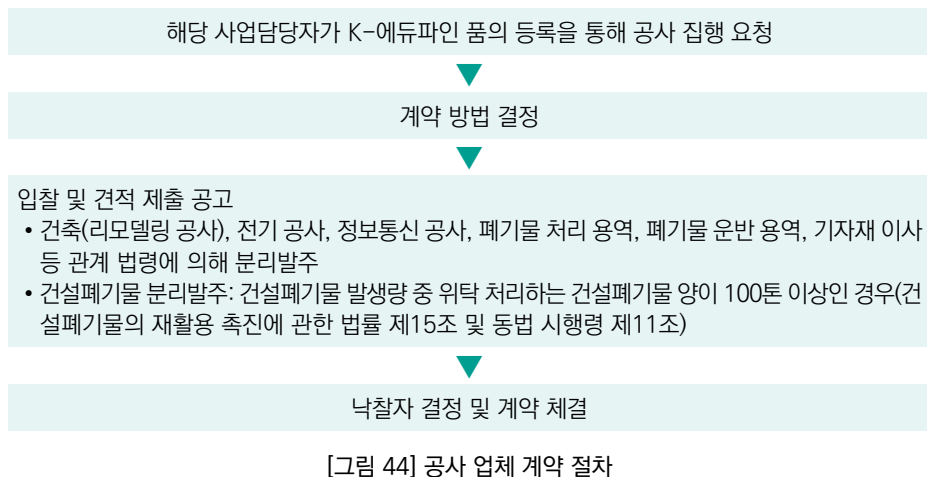


- 2단계 입찰 공고 기간

〈표 27〉 추정가격에 따른 2단계 입찰 공고 기간

구분	공고 시기
추정가격 1억원 미만	제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 10일 전에 공고
추정가격 1억원 이상 10억원 미만	제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 20일 전에 공고
추정가격 10억원 이상	제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고
긴급 및 재공고	제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 10일 전에 공고

7) 감리 용역 계약(10월~11월)

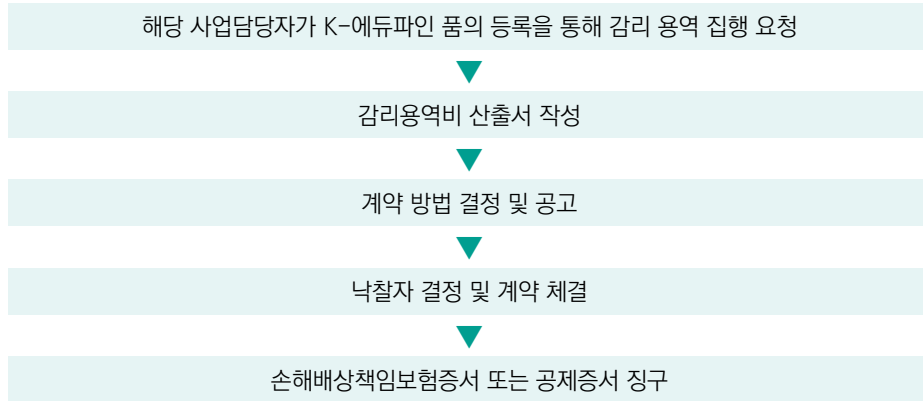

[그림 45] 감리 용역 계약 절차

8) 계약 방법 결정 방법

- 예산집행 품의 내용을 고려하여 계약담당자는 다음 순서로 계약방법을 결정
 - 공사, 물품의 제조·구매, 용역으로 계약목적물 구분
 - 다른 법령에 따른 계약방법 적용 여부 검토
 - 일반입찰, 제한입찰, 지명입찰, 수의계약 경쟁형태별 계약방법 결정 및 2단계 입찰, 규격/가격
동시 입찰, 협상에 의한 계약 등 기타 계약방법 적용 여부 결정
 - 확정계약, 총액계약, 단년도 계약, 단독계약 등 계약체결 형태별 계약방법 결정
 - 낙찰자 결정방법 결정
- 기타 지방계약법 이외의 법령에서 정하고 있는 사항을 검토하여야 함
- 분할 계약 금지
 - 동일구조물공사와 단일공사는 분할 계약이 금지되어 있음¹¹⁾

〈표 28〉 동일구조물공사와 단일공사의 개념

동일구조물공사	• 천연 또는 인조의 재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(그 부대공작물을 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물
단일공사	• 해당년도 예산상 특정단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사 • 예산상 특정되지 아니한 경우에는 예산집행과정에서 특정되는 공사 • 면허나 자격요건 등으로 법령에 의하여 공사를 분할 발주하여야 하는 경우에는 그 분할 발주하는 공사를 각각 단일공사로 봄

11) (계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준(2025.1.24.)

- 단, 다음의 경우는 분할발주가 가능함

- ① 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사(전기, 정보통신, 소방시설 공사 등)
- ② 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사
- ③ 공사의 성격상 공종¹²⁾을 분리해도 하자 책임 구분이 용이하고 품질, 안전, 공정¹³⁾ 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 아래의 공사

- 관계 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사
- 다른 공종과 시공 목적물이 명확하게 구분되는 공사
- 선·후행 또는 병행되는 다른 공종의 공사와 상호 영향을 미치지 않아 개별적인 시공이 가능한 공사
- 다른 공종과 시공 장소(작업 위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사

- 유의 사항 : 담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 분할·분리계약 가능 여부를 검토해야 함. 특히 1인 건적 수의 계약을 체결하기 위해 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할해서는 안 됨

12) 공종: 공사의 종류(미장공사, 도장공사, 방수공사 등)

13) 공정: 시간에 따른 공사의 진도관리에 쓰는 용어로 공정관리라고 함

9) 시설 공사 추진 시 가격 관련 용어의 개념


〈표 29〉 시설 공사 추진 시 가격 관련 용어

구분	내용
추정가격 ①	- 추정가격 = 해당 목적물의 규격서, 설계서 등에 따라 산출된 금액 등을 기준으로 하여 산정한 금액으로서 관급 자재로 공급될 부분의 가격 및 부가가치세를 <u>제외한</u> 금액 - 근거: 지방계약법 시행령 제7조 <u>계약방법 결정, 공고기간 산정, 국제입찰 대상의 기준</u>
기초금액 ②	- 원가계산 등에 의한 조사가격이나, 계약담당자가 설계가격의 적정 여부를 검토하여 부가세를 합산한 금액(설계도서에 부가세가 포함되어 있는지 확인) - 기초금액 = ①+부가가치세 - 입찰공고문에 기재 → 예정가격 $\pm 3\%$, 산정(G2B)
추정금액 ③	- 추정금액 = ②+도급자설치 관급자재비 - 근거: 지방계약법 시행규칙 제2조 ※ 추정가격 $\neq$ 추정금액 <u>시공비율 산정의 기준(PO, 적격심사), 입찰참가자격의 기준(등급, 시공평가액 제한)</u>
도급자설치 관급자재비 ④	관급자재란 발주처(학교)에서 재료를 구입하여 계약업체(도급자)에 조달하는 자재를 말하며, 관급자재비는 계약업체(도급자)가 조달받은 자재를 시공까지 하는 비용을 의미함 예) 시멘트, 철근, 벽돌 등
공사예정금액 ⑤	- 공사예정금액 = 추정금액 - 근거: 건설산업기본법 시행령 제8조 <u>건설기술자 배치의 기준</u>

구분			
순공사비(내역서의 재료비, 노무비, 경비의 합계)	추정가격 (①)	기초금액 (②)	추정금액 (=예정금액) (③=⑤)
간접경비(4대 보험료, 안전보건비 등)			
일반관리비, 이윤			
부가가치세			
도급자설치 관급자재비(④)			

[그림 46] 가격 관련 용어의 구분

나. 기자재 구입




[그림 47] 기자재 구입 단계

1) 기자재 구입 단계별 세부 내용

» (1단계) 의견 수렴

조성될 공간별로 교육 활동을 고려하여 교과별 효율적 교육 활동을 위한 기자재에 대한 의견을 수렴할 뿐 아니라 공간을 함께 사용하게 될 교직원 및 학생, 학부모 등 다양한 주체의 의견을 수렴하고 필요시 기자재 시연회를 실시하여 정보 제공

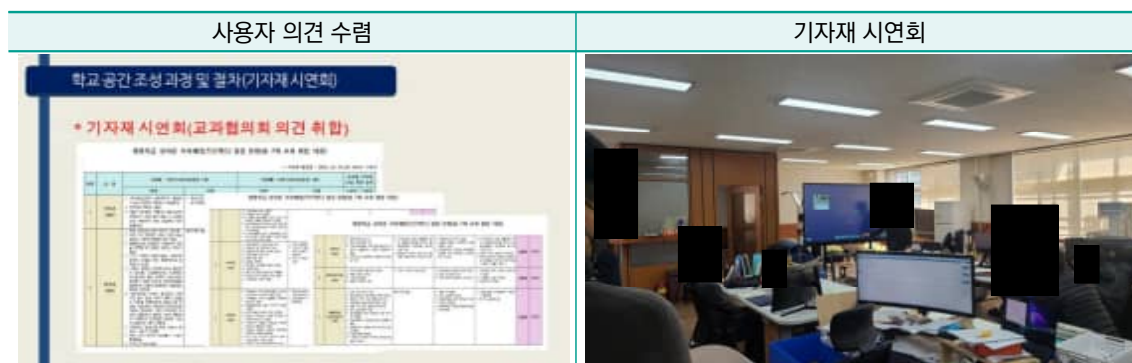


출처: 한국교육개발원(2022e:15-16).

[그림 48] 의견 수렴 및 시연회 실시

» (2단계) 기자재 목록 및 수량 확정

최종 도면을 통해 공간별 규격 및 구조를 확인하고 공간에 필요한 기자재의 종류와 규격, 수량 등을 정리하고 전체 기자재의 목록과 수량을 산출. 이후 예상 전적을 산출하여 전체 기자재 구입 가능 여부를 판단하고 예산 부족 상황을 고려하여 기자재 구입 우선 순위를 결정해 두는 것이 효율적임

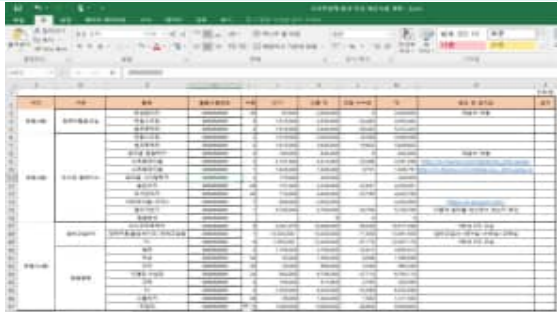기자재 목록 및 예산 건적 관리 예시1										기자재 목록 및 예산 건적 관리 예시2									
																			

출처: 한국교육개발원(2022c:63).

[그림 49] 기자재 목록 및 예산 건적 관리 예시

» (3단계) 물품선정위원회 운영 및 역할

물품선정위원회 운영을 통해 계약 내용에 따라 제품 선정(업체 선정), 경쟁 대상업체 선정, 규격 선정 중 하나의 방식으로 운영

- 물품선정위원회 회의 개최 대상(시·도교육청별 기준 상이)
 - 1회 기준 총액 추정가격이 2,000만 원(부가가치세 포함 2,200만 원) 초과 시 개최
 - 구매 총액 2,000만 원 초과 중 주요 물품을 선정위원회 심의
- 물품선정위원회 운영
 - 학교장 요청에 따라 회의 소집, 재적위원 과반수 이상 참석, 참석위원 과반수 이상 찬성 또는 고득점(다선호)으로 결정
 - 간사의 역할: 설명자료 작성, 설명, 회의 운영, 회의록 작성 등을 하되 평가자로 참여하지 아니함
 - 회의록 작성 및 보관: 회의록은 참석위원 서명하고, 전자문서 등록 후 주관부서에서 관리하고, 증빙서에는 사본 첨부
- 물품선정위원회 역할
 - 제품 선정(업체 선정): 추정가격 2,000만원 이상 물품을 특정 규격(또는 업체)으로 구매 추진 시, 평가표에 의한 평가 실시
 - 경쟁 대상업체 선정: 중소기업자 간 경쟁상품 1억 이상, 경쟁제품 아닌 경우 5,000만원 이상 물품을 나라장터 다수공급자계약(MAS) 제품을 2단계 경쟁 방식으로 구매 추진 시, 5인 이상 계약상대자를 대상으로 제안 요청, 평가표에 의한 평가 실시
 - 규격 선정: 2인 이상 건적 제출 또는 입찰공고 방식으로 물품 구매

» (4단계) 주문 및 검사·검수

기자재 종류별 주문 금액을 고려하여 계약 방식을 결정하고 공간의 공정률을 고려하여 주문 업체에 기자재 제작 기간 및 납품 가능 시기 등을 확인 및 조율 후 기자재 주문. 납품 후에는 기자재 상태 및 수량 등을 정확하게 확인하고 기자재의 경우 현장 설치 시 정확한 공간 및 위치에 설치 상태와 정상 작동 여부를 확인

2) 기자재 구입 시 참고 사항

» 물품의 종류 및 구분 기준

물품이란 소유 및 사용하는 동산 중 현금, 유가증권, 공유재산을 제외한 동산을 의미

• 비소모품의 구분 기준

- 그 품질 현상이 변하지 않고 장기간 사용할 수 있는 물품
- 내용 연수가 1년 이상으로 소모성 물품에 속하지 아니하는 물품
- 내용 연수가 1년 미만일지라도 취득단가가 20만원(시도별 상이) 이상의 물품
- 기타 교육감이 지정한 물품

• 소모품의 구분 기준

- 소모, 파손되기 쉬운 물품 및 공작물 기타 구성부분이 되는 물품
- 내용 연수가 1년 미만으로 사용에 비례하여 소모되거나 파손되기 쉬운 물품
- 내용 연수가 1년 이상이더라도 취득단가가 20만원 이하로써 소모, 파손되기 쉬운 물품
- 한 번 사용하면 원래의 목적으로 다시 사용할 수 없는 물품
- 다른 물품의 부속으로 사용되어 그 본성을 상실하는 물품

» 기자재 및 비품 예시

〈표 30〉 비품 및 기자재의 구분과 세부 예시

순서	구분	물품 예시
1	공통 비품	책상, 의자, 게시판, 칠판, 이동식 칠판, 화이트보드, 교구 보관함, 냉난방기, 토론형 테이블, 홈베이스용 소파 및 테이블, 블라인드 등
2	공통 기자재	무선 마이크 시스템, 스피커, 전화, 청소기, 복합기, 프린터 등
3	실험·실습 기자재	실험기구 수납장, 실험·실습대, 가스레인지, 전자레인지 등
4	멀티미디어 기자재	전자칠판, PC, TV, 크롬북, 노트북, 빔프로젝터, 스크린, LED 게시판, 방송시스템, 무선 AP 장치, 동영상 촬영 장비, 어학 시스템, 전자교탁 등
5	수업 교구	교과 관련 교수·학습 교구 및 기자재 등

» 주요 물품 내용 연한

〈표 31〉 주요 물품 내용 연한

품명	연한	품명	연한
노트북 컴퓨터	6	비디오 프로젝터	8
데스크톱 컴퓨터	5	텔레비전	9
태블릿 컴퓨터	5	책장	9
LCD 패널 또는 모니터	5	캐비닛	8
터치스크린 모니터	6	책상	9
잉크젯 프린터	5	회의용 탁자	9
레이저 프린터	6	보조 책상	9
칠판 또는 액세서리	9	실습대	11
게시판 또는 액세서리	8	수강용 탁자	8
인터랙티브 화이트보드 및 액세서리	7	컴퓨터 책상	9
영사용 스크린	9	교탁	10

출처: 조달청(2021).

• 물품 불용결정

- 불용품: 사용 또는 보관 중인 물품이 사용할 필요가 없게 되거나, 사용할 수 없게 되어 지방자치단체장 또는 물품관리관이 불용결정을 한 물품
- 불용결정 기준: 공유재산 및 물품관리법 제75조 및 동법 시행령 제76조

- 사용할 필요가 없게 된 물품으로 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
- 예측할 수 있는 일정 기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
- 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
- 훼손 또는 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 수선을 요하는 물품으로 수선을 하는 것이 비경제적인 물품
- 내용 연한이 도래한 물품도 사용이 가능할 경우 불용처분을 하여서는 안 되며, 내용 연한이 도래하지 않은 물품도 상당한 이유가 있을 때는 불용 처리를 할 수 있음

※ 불용은 상식적으로 '더 이상 필요가 없을 때' 할 수 있음(내용 연한이 지나지 않았어도, 상식적으로 필요가 없다면 불용 가능)

▶ 기자재 구입 관련 Tip

• 예산 관련

- 시·도교육청, 학교설립 구분에 따라 예산 교부 방식이 다름. 또한 시설비와 기자재 구입비의 비율이 80:20 또는 70:30으로 정해진 시·도교육청이 있고 학교가 자율적으로 결정하여 집행하는 지역도 있음. 자율적으로 집행하는 지역의 경우에 시설비는 도입 연도에만 사용할 수 있으므로 시설비 비중을 높이는 것이 바람직함. 도입 후 운영비를 받으므로 운영비 중 일부를 기자재 구입비로 사용 가능함(단, 시·도교육청 지침 고려가 필요함)
- 공간을 조성하는 과정에서 효율적인 교육 환경 조성에 필요한 비품 구입비가 부족할 경우 공간에 가구 등을 빌트인으로 설치하는 경우 시설비에서 해당 내용을 충당할 수 있기 때문에 시설비와 비품 구입비를 고려하여 융통성 있게 추진 가능함

• 기자재 설치 시기 관련


- 기자재 업체와 협의 후 공사가 완료되지 않았지만 기자재(빔프로젝터, 모니터, TV 등)를 설치해도 무리가 없으면 공간별로 순차적으로 설치. 단, 공사 중 먼지 발생 등을 고려하면 완료 후 설치하는 것을 추천. 가구의 경우는 손상의 위험이 커서 공사 완료 후 설치하는 것을 추천하며, 담당 업체(공사업체, 가구업체, 전기통신업체, 기자재 업체 등)와 협의해서 학교 상황에 맞게 진행

• 조달청 외 물품 구입 관련

- 기본적으로 기자재를 조달청 제품으로 구입하는 것을 추천하지만 부득이한 경우 조달청에 등록되지 않은 제품도 구입하는 것이 가능함. 다만, 이렇게 제품을 구입한 경우 학교의 재산으로 등록하기 위해 행정실에서 조달청에 목록화 요청을 통해 물품 식별 번호를 일일이 부여받아야 하는 복잡한 절차를 진행해야 함. 물품이 다양해지면 행정적인 부담 요소가 될 수 있으므로 조달청 외 물품을 구입하는 경우에는 사전에 행정 담당자와 충분히 소통하여 결정할 것을 추천함
- 업체와 수의계약을 할 경우, 2,000만원 이내에서 구입이 가능. 단, 여성 기업, 장애인 기업의 경우 5,000만원까지 구입이 가능
- 해당 업체에 조달청 등록을 의뢰하여 업체가 조달청에 직접 등록한 후 물품을 구입하여 행정적인 절차를 간소화하는 방법도 있음

다. 시공 단계

우수한 공사 수준으로 정해진 기간 내 준공을 보장하기 위해서는 충분한 공사 기간을 확보하고, 시공회사의 역량을 본 공사에 집중할 수 있는 분위기를 조성하는 것이 필요함. 이를 위해서는 착공 전 충분한 준비 기간을 확보할 수 있도록 겨울방학 1개월 전에 공사 계약을 완료하고, 학교 구성원들의 지속적인 관심과 학교 관계자들이 조직적으로 공사 관리에 대응할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함. 학교 관계자가 공사 진행을 점검하기 위해서는 착공 전 시공사에서 착공에서 준공까지 공정별 세부 공사 일정 계획을 수립하도록 함. 선·후 공정별 전체 공사일정 계획인 공정표를 학교와 협의를 통해 작성하도록 하고, 사용 자재와 공법에 대해 공사 전 학교에 설명하고 승인을 받은 후 공사를 진행하도록 하는 것이 중요함

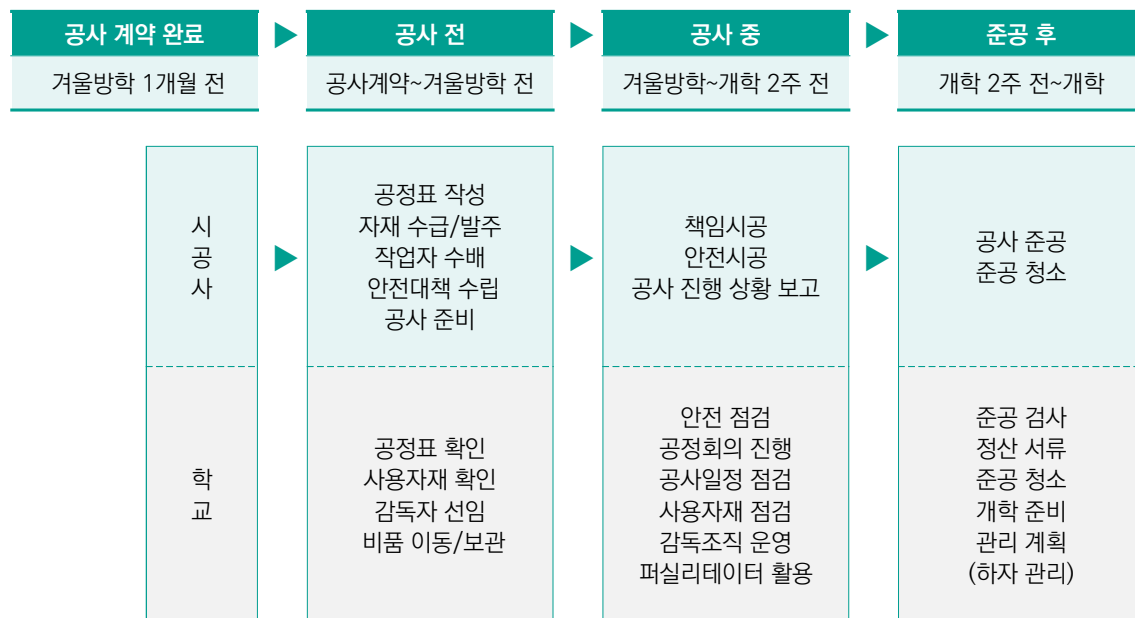

[그림 50] 시공 단계별 수행 사항

1) 공사 시작 전 유의 사항

〈표 32〉 공사 시작 전 유의 사항 요약

착공 전 주요 점검사항	• 방학 1개월 전 공사계약 완료 • 학사일정 반영된 공정표 확인 • 공사도면 및 계약내역서 확인 • 자재 납품계획서 확인 • 관리자, 행정실장, 담당자, 감리자 등을 포함한 공사감독조직 구성 • 학교 구성원 중, 공사 진행을 담당할 경험자로, 감독자 선임 • 설계자와 퍼실리테이터를 활용한 감리자 선임 • 공사 준비 상황 점검 • 비품 이동 목록표 작성 및 각 실 담당자 역할 분담 • 공사비 외 추가 비용(폐기물 처리, 이사, 전기통신 등) 예산 확보(방학 기간 및 공사 기간 중 초과근무자 예산 확보) • 타 공사와 중복되지 않도록 공사 일정 점검
시공사 확인	• 공사 일정 계획 학교와 협의 후 공정표 완성 • 공사도면과 계약내역서 학교 제출 • 자재 수급 계획 수립 후 자재납품계획서 제출 • 철거 등 공사 준비

- 공사가 겨울방학 기간을 활용하여 진행되는 만큼, 충분한 공사 기간을 확보하기 위해서는 공사 계약을 방학 1개월 전에 완료할 수 있도록 전체 일정 계획을 수립
- 시공사가 선정되면, 시공사에서 공사 일정 계획을 수립한 다음, 학교와 협의를 진행한 후, 전체 공사 일정을 확인할 수 있는 공정표를 작성 후 학교 제출
- 시공사는 공사도면과 계약내역서를 학교 담당자(감독자, 감리자 등)가 공사 진행을 확인할 수 있도록 자세하게 작성. 특히 감독자가 마감자재 사용을 확인할 수 있도록 수량 산출서와 일위대가를 첨부하여 구체적으로 작성
- 시공사에서 착공 전 자재 수급 계획을 수립하고, 학교와 협의를 진행한 후, 납품계획서를 학교에 제출
- 학교에서는 시공사와의 협의를 진행하고, 공사를 감독할 조직을 구성
 - 감독 조직에는 학교장, 행정실장, 담당자, 감독자, 감리자(감리자가 선임되지 않은 경우, 설계자 또는 퍼실리테이터 포함) 등 포함
 - 학교 구성원 중 공사 진행 및 하자 요인 점검을 전담할 공사감독자를 선임
 - 설계자와 퍼실리테이터 등을 활용하여 전문적인 감독이 가능하도록 감리자를 선임하고, 업무 범위를 협의

- 방학과 동시에 공사가 시작될 수 있도록 준비 상황을 점검
 - 철거공사를 시작으로 공사가 진행될 때, 기자재 및 비품 파손을 예방하고 안전을 위한 조치를 점검(특히 기계 및 자재 운반시 동선에 따라 공사 범위를 제외한 시설물 보양 및 가림막 등 사전 조치 필요)
 - 비품 이동목록표를 작성하고, 폐기 물품을 처리하고 물품 이전 및 보관계획을 세우고, 각 실의 담당자와 역할 분담을 명확히 할 것
- 폐기물 처리 비용, 이전 비용, 전자기기 설치를 위한 전기통신 추가 비용 등이 상황에 따라 발생할 수 있으니 예산을 확보
- 구입한 기자재가 방학 중 원하는 곳에 설치될 수 있도록 실사용자와 담당자가 미리 계획할 것
- 벽 철거 계획이 있는 경우, 기둥이 없는 내력벽, 방화구획을 위한 벽, 소화전 등 매입된 배관 및 배선을 반드시 확인
- 환경 개선 사업과 공사 병행 시 중복 공사가 발생하지 않도록 공사 범위를 분리하고 공사 일정을 점검
- 구조 보강공사 및 석면 철거공사를 병행할 시 작업 선후 공정을 고려하여 일정 계획을 수립
- 기존 시설 철거 전 건축물 해체 신고(또는 허가) 등 철거 관련 인허가 업무 사전 수행

2) 공사 진행 시 유의 사항

〈표 33〉 공사 진행 시 유의 사항 요약

공사 중 주요 점검사항	• 공사 중 시공사의 안전조치 확인 • 정기적(주 1회 권장) 공정회의 개최 통한 공사 일정 관리 • 감독자와 감리자는 공사 감독 상시 시행 • 감독자와 감리자는 공사 진행 상황 촬영 후 보관 • 사용자 요구사항 시공사에 전달 체계 수립 (분야별 담당자의 연락처 공유 단체 채팅방 구축) • 감리자(설계자 혹은 퍼실리테이터) 상시 활용 • 학생, 교직원 등 안전사고 예방 대책 수립
시공사 확인	• 철거 시 구조 안전 및 사고 예방 등 안전조치 • 하자 방지 대책 수립 및 책임시공 • 최소 개학 2주 전 공사 완료 • 작업자 안전사고 예방 대책 수립 후 안전관리계획서 제출

» 시공 시 주요 점검사항

- 철거시 구조안전을 위해 사전 제출된 건축물 해체계획서에 따라 철거하고, 사고 예방을 위한 안전조치를 확인
- 시공사가 공사에 집중할 수 있도록 분위기를 조성
 - 학교에서 공사 진행을 확인할 수 있도록 정기적 공정회의를 개최
 - 공사 진행 과정에서 작업 지시 혹은 수정 지시는 공사 현장 책임자를 통해 작업자에게 전달될 수 있도록 해야 함
 - 작업 현장 정리를 철저히 하여 안전사고를 방지할 수 있도록 지도
- 도면대로 시공되고 있는지를 상시 확인할 수 있도록 감독자와 감리자를 선임하여 운영
- 감독자는 공사 진행 과정을 촬영하여, 공사 진행 과정에서 발생하는 분쟁에 대비
- 각 공종별 시공사, 감리자(설계자 또는 퍼실리테이터), 감독자와의 정기 회의를 통한 공정관리와 사용자 요구를 시공사에 전달할 체계를 갖출 것. 주 1회 공정관리회의를 진행하는 것을 권장
- 마감재 선택, 마감 상태 점검, 색상 선정, 공사 중 설계안 변경에 대해 설계자 및 퍼실리테이터를 활용
- 개학 2주 전에 공사를 완료할 수 있도록 일정 관리
 - 공사 완료 후 준공 서류 처리 및 준공 후 청소, 개학 준비를 위한 일정을 확보
 - 준공 전 사용자 확인 후 개선 사항을 조치할 수 있는 기간을 확보
- 양생 기간이 오래 걸리는 공사(타일 공사, 도장 공사 등)는 하자가 발생할 수 있으므로 양생 기간을 충분히 갖고 시공할 수 있도록 할 것
- 인테리어, 전기, 소방, 통신 등 다수의 전문기업이 참여하게 되므로 의사소통을 효과적으로 수행하기 위해 분야별 담당자의 연락처를 작성, 공유. 단체 채팅방을 구축하여 공사 일정 등 의견 조율을 효과적으로 수행
- 방학 중 공사 기간 동안 초과 근무자를 위한 예산 사용 계획 필요
- 안전사고가 발생하지 않도록 특별히 당부해야 함
- 학교의 여건상 대부분의 공사가 겨울방학 시기에 집중되는 바, 동절기 공사에 따른 하자 발생 가능성을 고려하여 공정계획 수립 및 시공 필요

» 시공 시 안전관리

시공 과정에서 작업자뿐만 아니라, 학생, 교직원, 교육 활동 참여자 등 모두가 협력하여 실천할 수 있는 안전사고 예방 대책을 수립하는 것이 필요

- 시공사는 학교 현장 여건을 충분히 고려한 안전 관리계획을 수립 후 안전관리계획서를 제출
- 학교장은 학생의 공사장 접근 및 출입에 대한 안전관리와 함께 공사 차량 통행 시 안전관리에 대해 점검
- 학교장은 소속 교직원 중에서 안전 담당자를 지정하여 공사의 특성을 고려한 안전관리에 대해 점검체계 수립
- 작업자들이 작업순서 및 안전 작업 요령을 지키도록 당부하고 점검
- 인화물질 등은 다른 자재와 분리, 안전하게 보관할 수 있도록 확인
- 시공사는 안전관리 수칙 및 안전관리자의 인적 사항을 시공 현장 내에 적당한 위치에 게시

3) 준공 후 유의 사항

〈표 34〉 준공 후 유의 사항 요약

준공 후 주요 점검사항	• 준공검사원 접수 후 준공 검사 협조 요청 공문 발송 • 학교와 교육청 관계 공무원 합동 준공 검사 실시 • 준공 검사 후 정산 보고(2월 중) • 사용 전 하자 점검 • 개학 전 이사 진행 • 사용 후 시설 및 기자재 관리 • 사용 후 하자 관리 • 공사 과정의 변경사항이 반영된 최종 준공도서 확인 및 보관
시공사 확인	• 공사 완료 후 준공검사원 접수 • 하자 발생 시 책임 조치

- 개학 2주 전 공사가 완료될 수 있도록 일정 관리할 것
- 공사 완료 후 준공 검사 진행(2월 중)
 - 공사 완료 후 준공검사원 접수
 - 교육청 ‘고교학점제 학교 공간 조성 담당 부서’와 시설과에 준공 검사 협조 요청 공문 발송
 - 학교 및 교육청 관계 공무원 합동 준공 검사 실시

- 준공 검사 후 정산 보고(2월 중)
 - 공간 조성 사업비는 잔액이 남지 않도록 집행하고, 잔액 발생 시 이월하지 않고 전액 교육청 재정과로 반납
 - 집행 내역은 상세하고 구체적으로 작성하고(1만 원 이상 지출 내역 기재) 증빙자료는 학교에서 보관
- 사용 전 하자 점검 후 개선 사항 조치
- 안전사고 위험 요소 점검 후 개선 사항 조치
- 사용 후 시설 및 기자재 관리
 - 구축된 시설의 정·부 관리자를 지정하여 시설 및 물품의 효율적 관리
 - 학습 공간 및 지원 공간의 경우 공간 활용의 유연성으로 담당 교과가 변경될 수 있으니 관리자 간의 인수인계 시스템 구축
 - 스마트 기기 등 이동 가능한 기자재의 관리 시스템 마련
 - 지정된 관리 장소별로 물품 관리대장을 비치하여 물품 등록 후 관리
 - 학생자치기구 차원에서 공용 공간 관리 권장
 - 구축된 시설은 구축 시점부터 7년 경과 전 변경 금지(불가피한 사유가 있는 경우 교육청과 협의)
- 하자 관리
 - 하자 발생 시 시공사에 하자 보수를 요청하고 응하지 않을 경우 보증보험사에 하자 발생 통보
 - 하자발생 통보사항은 하자 내용(사진 포함), 하자 보수 완료 기간, 하자 보수보증서 사본 첨부
 - 시공사가 정당한 사유 없이 3회 불응 및 하자보수 능력이 없을 경우, 학교에서 하자 보증 기관에 하자보수보증금을 청구하여, 직접 별도 계약 후 보수를 진행할 수 있음
 - 추가 피해 발생 우려 등으로 시급하게 하자 보수가 필요할 경우 하자 보증 기관에 직접 사용을 통지한 후 하자 처리
- 공사 과정의 변경사항이 반영된 최종 준공도서를 보관하여 향후 시설관리의 기준으로 활용

4) 시공 관련 학교 담당자 설문조사 내용

» 이사 과정의 어려움

- 이삿짐 보관 장소에 따라 이사 업체별 견적 차이가 심함
- 교사들이 이삿짐을 옮길 때, 박스, 장갑, 수레 등이 많이 부족함
- 책자와 같은 물품들은 학교 구성원이 함께 옮겨야 함
- 이사할 때, 물품들이 어디 있는지 찾지 못하는 경우가 많아서 추가 예산이 발생하는 경향이 있었음
- 이삿짐 보관 장소와 장소별 이사 담당자를 미리 정하고, 담당자별 이삿짐 목록을 작성하는 것이 필요함
- 이사 전 수레, 박스, 장갑 등을 충분히 준비하는 것이 필요함

» 기자재 결정 및 설계 변경의 어려움

- 설치 자재의 소재, 색상, 디자인 등 교사가 결정해야 할 부분이 많음
- 방학 중 담당자가 학교에 상주하지 않는 경우와 담당자가 전문가가 아닌 것을 결정해야 한다는 부담감이 있음
- 결정할 사안이 언제 발생할지 모르고 사안이 발생할 때마다 TFT를 모으는 것이 어려움
- 설계변경이 많이 발생하고 그에 대한 결정이 어려움
- 감독자, 감리자 선임 후 정기적으로 진행되는 공정관리회의에서 주요 사항을 결정할 수 있도록 계획 수립하는 것이 필요함
- 설계 과정에서 학교 구성원들의 요구를 충분히 반영하고 사용자의 요구를 설계사에게 전달하여 반영된 결과를 확인하는 것이 필요함

5. 학점제형 공간의 활용

가. 학습 공간의 유연성

1) 첨단 미래 교실 및 블렌디드 러닝 교실

» 에듀테크 기술을 활용한 다양한 형태의 다양한 교과 수업이 가능한 공간



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 51] 학습 공간 조성 및 활용 사례(부산센텀여자고등학교)

- 다양한 모둠활동, 토의 토론 활동, PBL 등을 지원하는 공간
 - 학생 참여형 수업을 지원하는 공간으로 다양한 교과 활용 가능
 - 책상과 의자에 바퀴가 달려 수업의 특성에 따라 다양한 대형으로 자유롭게 이동
 - 와이파이존으로 조성하여 학생들의 자유로운 스마트 기기 사용 지원, 모둠활동 시 다양한 자료 검색에 용이
 - 공간을 폴딩도어로 구분하여 이론 수업 영역과 모둠활동 및 체험활동 영역으로 구분하여 유연하게 활용

- 블렌디드 수업 및 다양한 체험활동을 지원하는 공간
 - 빔프로젝터, 스크린, 전자칠판, 스마트TV 등 다양한 기자재를 구비하여 미래형 수업 및 온·오프라인 수업 지원
 - 이론 수업과 VR, AR 체험활동 및 메이커 수업, 온라인 학습, 동아리 활동 등을 지원할 수 있는 다기능의 공간으로 활용도가 매우 높음

2) 미술실 및 다목적 교실

▶ 수강 인원에 따라 활용, 다양한 수업과 학생 자율활동이 모두 가능한 공간

미술실(공간 분할 활용: 건식, 습식)	미술실(수업 및 전시 공간)
	
다목적 교실(다양한 기자재 선택 활용)	다목적 교실(이동형 거울 및 공연 공간)
	

출처: 한국교육개발원(2023b).

[그림 52] 학습 공간 조성 및 활용 사례(해운대여자고등학교)

- 이론과 실기 수업이 모두 가능한 공간
 - 고교학점제로 미술과목 선택이 증가하여 수업 교실이 부족한 경우 동시에 2개 반이 미술 수업을 할 수 있도록 기존 미술실에 폴딩도어를 설치하여 공간을 분할
 - 미술실 수업 재료 보관을 위한 준비실과 수업 결과물 및 학생 작품 전시 공간을 설치하여 활용

- 수업과 다양한 학생 활동을 지원하는 다목적 공간
 - 무용실을 수업과 댄스동아리 활동, 역할극, 공연 등이 가능한 다목적실로 재구조화
 - 전자칠판과 빔프로젝터를 모두 설치하여 수업 형태와 필요에 따라 사용자가 선택하여 활용
 - 창문이 있는 측면과 칠판이 부착되어 있는 전면에 슬라이딩 도어 형태의 이동형 거울을 설치하여 공간의 유연성 확보

나. 지원 공간의 복합성

1) 도서관

» 도서관 내 다양한 활용 공간 조성



출처: 한국교육개발원(2023b).

[그림 53] 지원 공간 조성 및 활용 사례(대전보문고등학교)

- 열람 공간 및 강의 공간
 - 도서관 내에 다양한 형태의 열람 공간을 제공하여 학생들이 편리하게 도서를 열람하거나 도서를 활용한 다양한 형태의 수업 운영이 가능함. 도서관 내에 중·소형 강의실을 포함하고 있어 수업 및 다양한 형태의 학생 중심 활동에 활용할 수 있음. 또한 야외 공간과 연계하여 학생들이 공간을 융통성 있게 활용할 수 있음

2) 학습 카페 및 상담실

» 학습 카페 및 상담실 조성을 통한 교육과정 운영 지원



출처: 한국교육개발원(2023b).

[그림 54] 지원 공간 조성 및 활용 사례(광주여고, 부산브니엘고, 전남남악고, 울산신정고)

• 학습 카페 및 상담실 조성

- 학습 카페와 상담실을 조성하여 자기주도학습 및 공강 시간에 활용함. 학생들이 자기 주도적으로 학습을 할 수 있도록 하거나 교사와 함께 진로 및 학업 설계 상담을 할 수 있도록 하여 학생 선택형 교육과정 운영을 지원

다. 공용 공간의 활용성

1) 홈베이스 및 복합문화공간

» 다기능의 홈베이스 조성

홈베이스(자기 주도 학습 및 모둠활동 모습)	홈베이스(소규모 랩 공연 모습)
	
홈베이스(다양한 휴식 공간)	홈베이스(다양한 자율활동 공간)
	

출처: 한국교육개발원(2023b).

[그림 55] 공용 공간 조성 및 활용 사례(부산센텀여자고등학교, 우신고등학교)

- 자기주도학습, 모둠활동, 수업, 공연, 휴식 등 다목적으로 활용하는 공용 공간
 - 콘센트와 스탠드가 있는 모둠활동 책상, 칸막이 책상, 스탠드 책상 등 다양한 형태의 책상을 비치하여 학생들이 취향과 개성에 따라 선택하여 활용
 - 벽면에 화이트보드, 빔프로젝터, 강연대를 설치하여 수업 공간으로도 활용
 - 한쪽 벽면 전체에 거울을 설치하고, 무대 조명과 음향시설을 구축하여 다양한 형태의 공연 가능
 - 한쪽 벽면에 전시 공간을 만들어 수업 결과물 및 학생 작품 전시

» 다기능의 복합문화공간 조성



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 56] 공용 공간 조성 및 활용 사례(해강고등학교)

- 휴식, 학습, 공연, 다양한 모둠활동을 복합적으로 할 수 있는 공용 공간
 - 외벽을 허물고 폴딩도어를 설치하여 실내 외 공간을 연결하여 공간의 유연성 확보
 - 실내 무대 및 실외 공간을 야외무대로 활용하여 버스킹, 댄스 공연 등 다양한 공연 장소로 활용, 실내 공간은 학생들의 휴식 및 커뮤니티 공간으로 활용
 - 소규모의 그룹 활동이 가능한 자율활동 공간을 구축하고 와이파이존으로 조성하여 공강 및 쉬는 시간에 모둠활동, 멘토 멘티 활동, 자기 주도 학습 등 지원

2) 현관, 로비, 복도

» 다목적홀 조성



출처: 한국교육개발원(2023a: 98).

[그림 57] 공용 공간 조성 및 활용 사례(한울고등학교)

- 다목적, 다기능을 갖춘 공용 공간으로 디자인
 - 체육 수업 공간을 공연, 전시, 휴식, 연수, 상담, 학습 등의 목적으로 활용
 - 한정된 학교 공간을 다목적으로 활용하여 공용 공간의 활용성을 극대화

» 다기능의 현관 및 로비 조성



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 58] 공용 공간 조성 및 활용 사례(센텀고등학교)

- 현관과 로비의 새로운 모습을 제시하는 공용 공간으로 디자인
 - 휴식, 회의, 상담, 학습 등의 기능을 겸비한 커뮤니티 공간 조성
 - 외벽을 허물고 폴딩도어를 설치하여 실내 공간이 실외 공간과 연계되어 확장될 수 있는 유연한 공간으로 조성
 - 원형, 삼각형, 사각형 모양의 다양한 테이블과 다양한 형태의 조명을 설치하여 공간의 완성도를 높임.
 - 로비에 전시 공간을 마련하여 수업 결과물 및 학생 작품 전시. 디지털 사이니즈 등을 설치하여 학교 정보 게시 공간으로 활용

» 다기능의 복도 공간 조성



출처: 작성자 직접 촬영

[그림 59] 공용 공간 조성 및 활용 사례(센텀고등학교, 해운대여자고등학교)

- 복도의 새로운 모습을 제시하는 공용 공간으로 디자인
 - 복도 공간에 다양한 휴게공간을 조성하여 활용
 - 포켓 칼라를 활용하여 학년별로 특색 있는 공간 조성
 - 복도 모퉁이 유휴 공간에 포켓 도서관을 조성하여 열린 공간으로 활용
 - 공강 시간이나 쉬는 시간에 학생들이 휴식, 학습, 소그룹 활동이 가능한 자율 공간으로 활용

라. 동선의 효율화

1) 물리적 동선의 효율화

» 학년 및 교과 Zone 구성



출처: 한국교육개발원(2023b: 202).

[그림 60] 공간 기능 연계 고려 사례(서울 방산고등학교)

- 학년 Zone
 - 1학년: 2층 전관과 후관 사용 및 교실과 복도를 하늘색으로 통일
 - 2학년: 3층과 4층 전관 사용 및 교실과 복도를 노란색으로 통일
 - 3학년: 4층과 5층 후관 사용 및 교실과 복도를 분홍색으로 통일
- 융합 교과 Zone
 - 수학·과학 수업 Zone: 3층 후관 과학 실험실, PBL실 조성
 - 인문·사회·외국어 수업 Zone: 4층 후관 사회, 외국어, 국어 교과실 조성
 - 예술 수업 Zone: 5층 후관 음악실, 미술실 조성

2) 교육과정적 동선의 효율화

» 블록타임 운영

3학년 3단위 2+1 블록수업 시간표						학생 개인별 시간표					
3학년	월	화	수	목	금		월	화	수	목	금
1		G	D	E		1		생물과목(2시간) 3-4	화학과목(2시간) 3-5	인체과학(2시간) 3-5	
2				F		2				세계사(2시간) 3-4	
3	C	D	A		E	3	인체과학(2시간) 3-5	화학과목(2시간) 3-5	생물과목(2시간) 3-5		인체과학(2시간) 3-5
4				I		4	인체과학(2시간) 3-5	화학과목(2시간) 3-5	생물과목(2시간) 3-5	세계사(2시간) 3-4	인체과학(2시간) 3-5
5						5					
6	B	A		G	F	6	수학과목(2시간) 3-4	생물과목(2시간) 3-5		생물과목(2시간) 3-5	세계사(2시간) 3-4
7		C				7	수학과목(2시간) 3-4	인체과학(2시간) 3-5		생물과목(2시간) 3-5	세계사(2시간) 3-4

출처: 한국교육개발원(2023b:174, 2023b:179).

[그림 61] 블록타임 운영 사례(대구강동고등학교)

- 3학년 3단위 선택과목군 시간표를 2+1 형태로 블록으로 운영하여 학생 이동 소요 최소화

참고 문헌

- 경남사천용남중학교(2022). 2022년 그린스마트 미래학교 인사이트 투어 보고서.
- 경남교육청(2022). 고교학점제 대비 학교 공간 바뀔까?.
- 교육부(2021). 고교학점제 종합 추진계획.
- 교육부(2019.3.25.). 고교학점제 학교 공간 조성 지원을 위한 2019년 교과교실제 추진 방향 안내.
- 교육부(2023.6.5.). 2024년 고교학점제 학교 공간 조성 사업(교과교실) 대상교 선정 지원 계획 안내.
- 교육부(2023.2.). 2023년 고교학점제 학교 공간 조성 지원 계획.
- 교육부(2024.2.). 2024학년도 일반계고 고교학점제 학교 공간 조성 및 운영 지원 계획.
- 교육부(2024.5.22.). 2025년 고교학점제 학교 공간 조성 사업(교과교실) 대상교 선정 지원 계획 안내.
- 광양백운고등학교(2022). 광양백운고등학교 누리집.
- 김포하성고등학교(2023). 공간 조성 사업 사용자 참여 설계 용역 과업지시서.
- 대전구봉고등학교(2023). 2022 고교학점제 공간 조성 사업 사용자 참여 설계 학교 공간 조성 절차.
- 바오플랜건축사사무소+(주) 레오플 디자인연구소(2023). 실시설계 도서.
- 이광수, 류수훈(2019). 학교시설의 사용자 참여 설계 프로세스 비교분석에 관한 연구.
- 이윤서, 박성철, 이상민, 황은희, 이주연, 장재원(2020). 고교학점제 시설 운영 특성에 따른 학교 공간 재구조화 방안 연구. 한국교육개발원.
- 임종현, 김정아, 박성철, 조진일, 이상민, 우선영, 박종미, 김은경, 홍지오, 유해연, 박연정(2022). 고교학점제 학교 공간 조성 과정 및 활용 방안 연구: 학교 공간과 교육과정의 연계성 탐색. 한국교육개발원.
- 조달청(2021). 내용연수(조달청고시 제2021-41호).
- 한국교육개발원(2022a). 고교학점제 학교 공간 조성 2차 중앙 컨설턴트 워크숍 자료집.

- 한국교육개발원(2022b). 고교학점제 학교 공간 조성 운영 안내서.
- 한국교육개발원(2022c). 도입교 담당자 및 행정자료 연수 자료집.
- 한국교육개발원(2022d). 도입교 퍼실리테이터 워크숍 자료집.
- 한국교육개발원(2022e). 컨설팅 대상학교 담당자 워크숍 자료집.
- 한국교육개발원(2022f). 학교 공간과 교육과정의 연계성 탐색.
- 한국교육시설안전원(2022). 교육시설 사전기획 업무 도움자료.
- 한국교육개발원(2023a). 2023년 고교학점제 공간 도입교, 활용교 담당자 연수 자료집.
- 한국교육개발원(2023b). 고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서.
- 한국교육개발원(2023c). 고교학점제 학교 공간 컨설팅 대상학교 담당자 워크숍 자료집.

[전자자료]

- 건축용어사전. <http://dict.aik.or.kr/> (부록 용어 해설)
- 대한건축사협회. <https://www.kira.or.kr/index.do>
- 학교시설 공간재구조화. <https://www.schoolredesign.kr/vr-room/school/haemil>



고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서



부 록



1. 고교학점제 학교 공간 조성 현황
2. 학교 공간 유형별 활용 사례
3. 용어 해설
4. 자료 안내



부록



1. 고교학점제 학교 공간 조성 현황

가. 2019년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반계열 55개교

연번	시도	학교	연번	시도	학교
1	서울(12)	경신고등학교	29	강원(2)	강일여자고등학교
2		대진여자고등학교	30		마차고등학교
3		동북고등학교	31	충북(1)	청원고등학교
4		면목고등학교	32	충남(2)	당진고등학교
5		미림여자고등학교	33		대산고등학교
6		삼성고등학교	34	전북(1)	장수고등학교
7		선일여자고등학교	35	전남(3)	능주고등학교
8		세현고등학교	36		완도고등학교
9		은광여자고등학교	37		학다리고등학교
10		중경고등학교	38	경북(12)	경북외국어고등학교
11		청원고등학교	39		경산여자고등학교
12		한서고등학교	40		경안여자고등학교
13	부산(3)	부산동성고등학교	41		경일고등학교
14		부산진여자고등학교	42		사곡고등학교
15		해화여자고등학교	43		성의여자고등학교
16	대구(4)	다사고등학교	44		안동고등학교
17		대구동부고등학교	45		안동여자고등학교
18		덕원고등학교	46		영광고등학교
19		수성고등학교	47		영주여자고등학교
20	인천(2)	동산고등학교	48		이서고등학교
21		명신여자고등학교	49		한일여자고등학교
22	광주(4)	광주인성고등학교	50	경남(6)	경상국립대학교사범대학부설고등학교
23		빛고을고등학교	51		김해여자고등학교
24		서강고등학교	52		남해고등학교
25		첨단고등학교	53		마산구암고등학교
26	대전(1)	대전전민고등학교	54		명덕고등학교
27	울산(2)	학성여자고등학교	55		함안고등학교
28		화암고등학교			

» 직업계열 4개교

연번	시도	학교
1	인천(1)	인천전자마이스터고등학교
2	광주(1)	광주자동화설비공업고등학교

연번	시도	학교
3	경북(2)	금오공업고등학교
4		포항제철공업고등학교

나. 2020년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반계열 36개교

연번	시도	학교
1	서울(2)	누원고등학교
2		신림고등학교
3	부산(4)	동아고등학교
4		부산국제외국어고등학교*
5		예문여자고등학교
6		해동고등학교
7	대구(4)	강북고등학교
8		대구제일고등학교
9		상인고등학교
10		효성여자고등학교
11	인천(2)	백석고등학교
12		인천세원고등학교
13	광주(3)	광주제일고등학교
14		살레시오여자고등학교
15		조선대학교부속고등학교
16	대전(1)	대전용산고등학교
17	울산(2)	범서고등학교
18		우신고등학교

연번	시도	학교
19	강원(1)	치악고등학교
20	충남(4)	온양한울고등학교
21		용남고등학교
22		천안고등학교
23		한일고등학교
24	전북(1)	완산고등학교
25	전남(1)	순천금당고등학교
26	경북(11)	구미산동고등학교
27		금오여자고등학교
28		길원여자고등학교
29		상모고등학교
30		상주고등학교
31		영광여자고등학교
32		우석여자고등학교
33		울진고등학교
34		점촌고등학교
35		포항고등학교
36		하양여자고등학교

*2021년부터 '부산센텀여자고등학교'로 교명 변경

» 직업계열 5개교

연번	시도	학교
1	서울(1)	미림여자정보과학고등학교
2	전남(1)	진성여자고등학교
3	경북(3)	경북식품과학마이스터고

연번	시도	학교
4	경북(3)	김천생명과학고
5		한국원자력마이스터고

다. 2021년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반고(국·공·사립) 81개교

번호	시도	학교	번호	시도	학교
1	서울(8)	강서고등학교	37	강원(11)	강릉제일고등학교
2		건국대학교사범대학부속고등학교	38		강원대학교사범대학부설고등학교
3		경희여자고등학교	39		북원여자고등학교
4		광문고등학교	40		사북고등학교
5		대진고등학교	41		삼일고등학교
6		방산고등학교	42		성수고등학교
7		성심여자고등학교	43		성수여자고등학교
8		청원여자고등학교	44		원주고등학교
9	부산(6)	경원고등학교	45		육민관고등학교
10		동래여자고등학교	46		춘천고등학교
11		부산대학교사범대학부속고등학교	47	충남(13)	제천제일고등학교
12		부산동고등학교	48		갈산고등학교
13		성모여자고등학교	49		건양대학교병설건양고등학교
14		충렬고등학교	50		공주고등학교
15	대구(6)	강동고등학교	51		금산여자고등학교
16		구암고등학교	52		대천고등학교
17		심인고등학교	53		목천고등학교
18		영송여자고등학교	54		북일여자고등학교
19		협성고등학교	55		서일고등학교
20		화원고등학교	56		서해삼육고등학교
21	인천(6)	광성고등학교	57		신평고등학교
22		부광여자고등학교	58		온양고등학교
23		안남고등학교	59		온양여자고등학교
24		인성여자고등학교	60		천안신당고등학교
25		인천여자고등학교	61	전북(3)	전주고등학교
26		인천영선고등학교	62		전주근영여자고등학교
27	광주(4)	광주경신여자고등학교	63		전주중앙여자고등학교
28		광주동성고등학교	64	전남(3)	목포제일여자고등학교
29		광주송일고등학교	65		영산고등학교
30		정광고등학교	66		옥과고등학교
31	대전(2)	동방고등학교	67	경북(10)	구미여자고등학교
32		서일고등학교	68		동지여자고등학교
33	울산(3)	남창고등학교	69		문명고등학교
34		성신고등학교	70		성창여자고등학교
35		울산여자고등학교	71		세화고등학교
36	강원(11)	강릉여자고등학교	72		영덕여자고등학교

번호	시도	학교
73	경북(10)	의성여자고등학교
74		진랑고등학교
75		포항중앙여자고등학교
76		현일고등학교
77	경남(5)	마산여자고등학교

» 자율형고등학교(공립) 3개교

번호	시도	학교
1	대전(1)	대전여자고등학교
2	전남(1)	여수고등학교

» 일반고(종합고)(공립, 사립) 3개교

번호	시도	학교
1	강원(3)	강릉문성고등학교
2		설악고등학교

» 특성화고(공립, 사립) 9개교

번호	시도	학교
1	서울(3)	대경상업고등학교
2		미래산업과학고등학교
3		용산공업고등학교
4	인천(1)	정석항공과학고등학교
5	대전(1)	대전신일여자고등학교

» 마이스터고(공립) 3개교

번호	시도	학교
1	서울(1)	서울도시과학기술고등학교
2	강원(1)	원주의료고등학교

번호	시도	학교
78	경남(5)	밀성고등학교
79		삼천포고등학교
80		창원명곡고등학교
81		철성고등학교

번호	시도	학교
3	경남(1)	김해경원고등학교

번호	시도	학교
3	강원(3)	함백고등학교

번호	시도	학교
6	전남(1)	목포성신고등학교
7	경북(1)	금호공업고등학교
8	경남(2)	간디고등학교
9		김해한일여자고등학교

번호	시도	학교
3	전남(1)	전남생명과학고등학교

라. 2022년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반고(국·공·사립) 142개교

번호	시도	학교	번호	시도	학교
1	서울(4)	문현고등학교	37	인천(7)	삼산고등학교
2		배문고등학교	38		송덕여자고등학교
3		예일여자고등학교	39		인천예일고등학교
4		우신고등학교	40	광주(10)	광주수피아여자고등학교
5	부산(23)	개금고등학교	41		광주여자고등학교
6		건국고등학교	42		광주진흥고등학교
7		경남여자고등학교	43		금호중앙여자고등학교
8		경일고등학교	44		동아여자고등학교
9		경해여자고등학교	45		보문고등학교
10		구덕고등학교	46		비아고등학교
11		금정고등학교	47		성덕고등학교
12		기장고등학교	48		조선대부속여자고등학교
13		남성여자고등학교	49		호남삼육고등학교
14		테레사여자고등학교	50	대전(6)	대전구봉고등학교
15		문현여자고등학교	51		대전이문고등학교
16		배정고등학교	52		대전지족고등학교
17		부산남일고등학교	53		보문고등학교
18		브니엘고등학교	54		서일여자고등학교
19		브니엘여자고등학교	55	울산(8)	중일고등학교
20		사직고등학교	56		무거고등학교
21		센텀고등학교	57		신선여자고등학교
22		신도고등학교	58		신정고등학교
23		양정고등학교	59		울산강남고등학교
24		장안제일고등학교	60		울산중앙고등학교
25		한얼고등학교	61		울산중앙여자고등학교
26		해강고등학교	62		학성고등학교
27		해운대여자고등학교	63	세종(4)	현대고등학교
28	대구(5)	대곡고등학교	64		고운고등학교
29		대구서부고등학교	65		두루고등학교
30		대구해화여자고등학교	66		아름고등학교
31		대진고등학교	67		종촌고등학교
32	인천(7)	성화여자고등학교	68	강원(2)	장성여자고등학교
33		가좌고등학교	69		주천고등학교
34		강화여자고등학교	70	충북(6)	세명고등학교
35		대인고등학교	71		운호고등학교
36		부평여자고등학교	72		제천여자고등학교

번호	시도	학교
73	충북(6)	청주대성고등학교
74		충원고등학교
75		형석고등학교
76	충남(15)	공주영명고등학교
77		대흥고등학교
78		배방고등학교
79		서야고등학교
80		예산여자고등학교
81		온양용화고등학교
82		웅천고등학교
83		정산고등학교
84		천안불당고등학교
85		천안쌍용고등학교
86		천안업성고등학교
87		천안여자고등학교
88		청양고등학교
89		합덕고등학교
90		홍주고등학교
91	전북(10)	군산동고등학교
92		기전여자고등학교
93		남원국악예술고등학교
94		만경고등학교
95		만경여자고등학교
96		영생고등학교
97		우석고등학교
98		원광고등학교
99		전북대학교사범대학부설고등학교
100		함열여자고등학교
101	전남(23)	광양고등학교
102		광양백운고등학교
103		금성고등학교
104		남악고등학교
105		목포덕인고등학교
106		목포정명여자고등학교
107		목포홍일고등학교

번호	시도	학교
108	전남(23)	문태고등학교
109		문향고등학교
110		백제고등학교
111		순천매산고등학교
112		순천복성고등학교
113		순천제일고등학교
114		순천효천고등학교
115		여수중앙여자고등학교
116		여양고등학교
117		영암여자고등학교
118		예당고등학교
119		장성고등학교
120		진도고등학교
121		창평고등학교
122		해룡고등학교
123		화순고등학교
124	경북(6)	구미고등학교
125		금오고등학교
126		대동고등학교
127		동지고등학교
128		예천여자고등학교
129		포항영신고등학교
130	경남(12)	김해가야고등학교
131		김해제일고등학교
132		남해제일고등학교
133		대성일고등학교
134		웅상고등학교
135		진주고등학교
136		창녕여자고등학교
137		창원고등학교
138		창원대암고등학교
139		창원신월고등학교
140		창원토월고등학교
141		효암고등학교
142	제주(1)	제주대학교사범대학부설고등학교

마. 2023년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반고(공·사립) 189개교

번호	시도	학교	번호	시도	학교
1	서울(20)	강동고등학교	37	부산(21)	삼정고등학교
2		광신고등학교	38		성지고등학교
3		광영고등학교	39		양운고등학교
4		대신고등학교	40		지산고등학교
5		동국대학교사범대학부속고등학교	41		화명고등학교
6		동일여자고등학교	42	대구(7)	경덕여자고등학교
7		보성고등학교	43		경원고등학교
8		상일여자고등학교	44		경화여자고등학교
9		서울고등학교	45		능인고등학교
10		석관고등학교	46		성산고등학교
11		성동고등학교	47		시지고등학교
12		솔샘고등학교	48	인천(8)	현풍고등학교
13		송곡여자고등학교	49		강화고등학교
14		영신고등학교	50		계산고등학교
15		오금고등학교	51		계양고등학교
16		월계고등학교	52		부개고등학교
17		인현고등학교	53		부광고등학교
18		창문여자고등학교	54		인천공항공고등학교
19		한가람고등학교	55		인천효성고등학교
20		한광고등학교	56		학익여자고등학교
21	부산(21)	가야고등학교	57	광주(3)	광주석산고등학교
22		금성고등학교	58		명진고등학교
23		금정여자고등학교	59		설월여자고등학교
24		남산고등학교	60	대전(10)	대전가오고등학교
25		내성고등학교	61		대전관저고등학교
26		다대고등학교	62		대전노은고등학교
27		대덕여자고등학교	63		대전만년고등학교
28		대연고등학교	64		대전예술고등학교
29		덕문여자고등학교	65		대전중앙고등학교
30		동인고등학교	66		서대전고등학교
31		동주여자고등학교	67		서대전여자고등학교
32		동천고등학교	68		신탄진고등학교
33		만덕고등학교	69		충남고등학교
34		부산고등학교	70	울산(11)	다운고등학교
35		부흥고등학교	71		달천고등학교
36		사직여자고등학교	72		대현고등학교

번호	시도	학교
73	울산(11)	무룡고등학교
74		문수고등학교
75		방어진고등학교
76		삼산고등학교
77		울산동천고등학교
78		울산제일고등학교
79		함월고등학교
80		효정고등학교
81	경기(39)	경민고등학교
82		광주중앙고등학교
83		남양고등학교
84		대신고등학교
85		대화고등학교
86		덕현고등학교
87		동국대학교사범대학부속영석고등학교
88		동두천고등학교
89		동화고등학교
90		목감고등학교
91		문산수익고등학교
92		문산제일고등학교
93		미사강변고등학교
94		배곧고등학교
95		백송고등학교
96		부용고등학교
97		부천고등학교
98		부천북고등학교
99		사우고등학교
100		수내고등학교
101		수지고등학교
102		안산강서고등학교
103		안양여자고등학교
104		양명여자고등학교
105		운산고등학교
106		운정고등학교
107		율곡고등학교
108		은혜고등학교
109		의왕고등학교
110		일산대진고등학교
111		장기고등학교

번호	시도	학교
112	경기(39)	청운고등학교
113		청평고등학교
114		평촌고등학교
115		풍동고등학교
116		하남고등학교
117		하성고등학교
118		한광고등학교
119		효성고등학교
120	강원(11)	강릉고등학교
121		대성고등학교
122		도계고등학교
123		동해광희고등학교
124		문막고등학교
125		석정여자고등학교
126		속초여자고등학교
127		원주삼육고등학교
128		원주여자고등학교
129		인제고등학교
130		홍천여자고등학교
131	충북(1)	세광고등학교
132	충남(18)	계룡고등학교
133		공주금성여자고등학교
134		대천여자고등학교
135		부석고등학교
136		서산여자고등학교
137		서산중앙고등학교
138		서천여자고등학교
139		설화고등학교
140		아산고등학교
141		안면고등학교
142		천안두정고등학교
143		천안오성고등학교
144		천안월봉고등학교
145		천안청수고등학교
146		태안고등학교
147		태안여자고등학교
148		홍성고등학교
149		홍성여자고등학교
150	전북(13)	고창북고등학교

번호	시도	학교
151	전북(13)	고창여자고등학교*
152		군산중앙고등학교
153		김제여자고등학교
154		설천고등학교
155		성일고등학교
156		양현고등학교
157		이리남성여자고등학교
158		전라고등학교
159		전북여자고등학교
160		전북제일고등학교
161		전주대학교사범대학부설고등학교
162		전주성심여자고등학교
163	전남(9)	나주고등학교
164		목상고등학교
165		목포고등학교
166		목포해인여자고등학교
167		삼호고등학교
168		순천팔마고등학교
169		여수충무고등학교
170		장흥관산고등학교

번호	시도	학교
171	전남(9)	함평고등학교
172	경북(7)	경주예일고등학교
173		계림고등학교
174		대가야고등학교
175		성주여자고등학교
176		세명고등학교
177		안동중앙고등학교
178		포항창성고등학교
179	경남(11)	거제고등학교
180		거제중앙고등학교
181		마산가포고등학교
182		마산내서여자고등학교
183		마산제일고등학교
184		명신고등학교
185		진영고등학교
186		창녕옥야고등학교
187		창원경일여자고등학교
188		창원문성고등학교
189		창원성민여자고등학교

*2021년부터 '자유고등학교'로 교명 변경

» 일반고(국립) 2개교

번호	시도	학교
1	전북(1)	전북대학교사범대학부설고등학교

번호	시도	학교
2	제주(1)	제주대학교사범대학부설고등학교

» 특목고(공립) 4개교

번호	시도	학교
1	서울(2)	세종과학고등학교
2		한성과학고등학교

번호	시도	학교
3	대전(2)	대전외국어고등학교
4		대전과학고등학교

바. 2024년도 학교 공간 조성 학교 명단

» 일반고(공·사립) 208개교

번호	시도	학교	번호	시도	학교
1	서울(25)	경문고등학교	37	대구(8)	원화여자고등학교
2		경북여자고등학교	38		포산고등학교
3		경일고등학교	39		학남고등학교
4		광영여자고등학교	40		호산고등학교
5		대원고등학교	41	인천(27)	가림고등학교
6		덕원여자고등학교	42		가정고등학교
7		동국대학교사범대학부속여자고등학교	43		검단고등학교
8		동명여자고등학교	44		계산여자고등학교
9		명지고등학교	45		교동고등학교
10		삼각산고등학교	46		덕신고등학교
11		상명고등학교	47		서인천고등학교
12		서라벌고등학교	48		석정여자고등학교
13		서초고등학교	49		세일고등학교
14		선유고등학교	50		송도고등학교
15		성남고등학교	51		연수고등학교
16		성보고등학교	52		연수여자고등학교
17		송곡고등학교	53		옥련여자고등학교
18		잠실고등학교	54		인명여자고등학교
19		장훈고등학교	55		인일여자고등학교
20		중산고등학교	56		인천고잔고등학교
21		중앙대학교사범대학부속고등학교	57		인천남고등학교
22		한성고등학교	58		인천남동고등학교
23		혜화여자고등학교	59		인천논현고등학교
24		효문고등학교	60		인천부흥고등학교
25		휘경여자고등학교	61		인천산곡고등학교
26	부산(7)	광명고등학교	62		인천원당고등학교
27		낙동고등학교	63		인하대학교사범대학부속고등학교
28		대동고등학교	64		인항고등학교
29		대명여자고등학교	65		작전고등학교
30		부산동여자고등학교	66		제일고등학교
31		주례여자고등학교	67		학익고등학교
32		해광고등학교	68	광주(1)	고려고등학교
33	대구(8)	대건고등학교	69	대전(4)	대전둔원고등학교
34		대구여자고등학교	70		대전반석고등학교
35		대륜고등학교	71		대전한빛고등학교
36		대원고등학교	72		한밭고등학교

번호	시도	학교	번호	시도	학교
73	울산(3)	문현고등학교	109	경기(86)	서해고등학교
74		울산예술고등학교	110		성남고등학교
75		호계고등학교	111		성포고등학교
76	경기(86)	가좌고등학교	112		성호고등학교
77		계남고등학교	113		세원고등학교
78		과천여자고등학교	114		소사고등학교
79		관양고등학교	115		송양고등학교
80		광동고등학교	116		송현고등학교
81		광문고등학교	117		수원고등학교
82		구리고등학교	118		수일고등학교
83		금촌고등학교	119		시온고등학교
84		남한고등학교	120		시흥고등학교
85		다산고등학교	121		신길고등학교
86		대평고등학교	122		신성고등학교
87		덕산고등학교	123		심원고등학교
88		도당고등학교	124		안산고등학교
89		돌마고등학교	125		안성여자고등학교
90		동광고등학교	126		안양고등학교
91		동안고등학교	127		양명고등학교
92		동우여자고등학교	128		양주고등학교
93		동원고등학교	129		여주고등학교
94		마송고등학교	130		역곡고등학교
95		무원고등학교	131		영북여자고등학교
96		문산고등학교	132		유신고등학교
97		미사고등학교	133		이매고등학교
98		백운고등학교	134		인덕원고등학교
99		별가람고등학교	135		인창고등학교
100		보평고등학교	136		장안고등학교
101		부원고등학교	137		저동고등학교
102		부천여자고등학교	138		중흥고등학교
103		부흥고등학교	139		지산고등학교
104		분당대진고등학교	140		진건고등학교
105		삼광고등학교	141		진접고등학교
106		상록고등학교	142		창원고등학교
107		상원고등학교	143		청명고등학교
108		서울삼육고등학교	144		청학고등학교

번호	시도	학교
145	경기(86)	초월고등학교
146		충현고등학교
147		충훈고등학교
148		태광고등학교
149		태성고등학교
150		토평고등학교
151		퇴계원고등학교
152		파주여자고등학교
153		풍산고등학교
154		하길고등학교
155		한빛고등학교
156		한빛누리고등학교
157		한솔고등학교
158		함현고등학교
159		호원고등학교
160		화수고등학교
161		화흥고등학교
162	강원(9)	강원고등학교
163		봉의고등학교
164		상동고등학교
165		속초고등학교
166		양구여자고등학교
167		여량고등학교
168		유봉여자고등학교
169		화천고등학교
170	충남(5)	황성고등학교
171		부여여자고등학교
172		삼교고등학교
173		서산고등학교
174		쌍불여자고등학교
175	전북(15)	호서고등학교
176		동암고등학교

번호	시도	학교
177	전북(15)	마령고등학교
178		산서고등학교
179		순창고등학교
180		순창제일고등학교
181		신대인고등학교
182		이리여자고등학교
183		이일여자고등학교
184		전주솔내고등학교
185		전주해성고등학교
186		정주고등학교
187		한국전통문화고등학교
188		한들고등학교
189		한별고등학교
190		호남고등학교
191	전남(10)	담양고등학교
192		보성고등학교
193		부영여자고등학교
194		순천고등학교
195		여수여자고등학교
196		여수화양고등학교
197		영광고등학교
198		장흥고등학교
199		한영고등학교
200		화순이양고등학교
201	경북(4)	김천여자고등학교
202		두호고등학교
203		북삼고등학교
204		선화여자고등학교
205	경남(4)	거제제일고등학교
206		남해해성고등학교
207		마산고등학교
208		마산삼진고등학교

» 특목고(공립) 3개교

번호	시도	학교
1	인천(2)	인천과학고등학교
2		인천국제고등학교

번호	시도	학교
3	울산(1)	울산과학고등학교

2. 학교 공간 유형별 활용 사례

가. 학교 현황	133
나. 학습 공간	134
1) 융합교과실	134
2) 소인수 강의실	143
3) 대형 강의실	146
(1) 일반형 교실	146
(2) 계단식 교실	150
(3) 가변형 교실	154
4) 실험실·실습실	159
5) 디지털 교실·온라인 학습실	165
다. 지원 공간	180
1) 문화예술·체육 활동실	180
2) 소규모 활동 공간	185
3) 다목적실	188
4) 자기 주도적 학습 공간·학습카페	192
5) 강당	199
6) 도서실·복합문화공간	201
(1) 커뮤니티형	201
(2) 강연 및 행사형	212
(3) 교육 및 학습형	217
라. 공용 공간	224
1) 복도·로비	224
2) 휴게이스	232
3) 자율활동·휴식 공간	251
4) 야외 공간	260
마. 기타: 기자재 활용 사례	266

가 학교 현황

연번	시도	사업연도	교명 ^{주1)}	설립 유형	학교 유형	공학 여부	학급 수	학생 수	교원 수
1	♠♠	2019	해맑고등학교	공립	일반고	공학	32	733	71
2	●●	2019	달무리고등학교	사립	일반고	공학	18	468	42
3	▶▶	2020	아름드리고등학교	사립	일반고	여고	24	473	51
4	◇◇	2021	꽃보라고등학교	사립	일반고	여고	28	727	58
5	□□	2021	미쁨고등학교	공립	일반고	공학	30	808	72
6	◆◆	2021	햇살고등학교	공립	일반고	여고	36	922	80
7	△△	2021	동살고등학교	사립	일반고	여고	35	855	77
8	○○	2021	양증고등학교	사립	일반고	여고	24	683	55
9	☆☆	2021~23	모꼬지고등학교	공립	자율고	공학	25	584	52
10	♣♣	2022	듬썩고등학교	공립	일반고	공학	27	818	65
11	△△	2022~23	또랑또랑고등학교	공립	일반고	공학	29	722	70
12	◇◇	2022	띠앗고등학교	공립	일반고	남고	30	759	67
13	▣▣	2022	도란도란고등학교	공립	자율고	공학	25	681	58
14	●●	2022	초롱초롱고등학교	공립	일반고	공학	24	550	53
15	○○	2022	하늬고등학교	공립	일반고	여고	6	114	19
16	●●	2023	꽃내음고등학교	공립	일반고	여고	27	656	56
17	●●	2023	송골송골고등학교	공립	일반고	여고	34	938	71
18	◇◇	2023	안다미로고등학교	공립	일반고	여고	24	560	51
19	◇◇	2023	아스라이고등학교	사립	일반고	여고	30	761	62
20	◇◇	2023	쫄로니고등학교	사립	일반고	공학	30	892	64
21	♠♠	2023	꼬리별고등학교	공립	일반고	공학	29	613	59
22	□□	2023	윤슬고등학교	공립	일반고	공학	23	646	56
23	◆◆	2023	달보드레고등학교	공립	일반고	공학	27	689	56
24	▶▶	2023	새뚝고등학교	공립	일반고	공학	25	450	54
25	◇◇	2023	까치놀고등학교	사립	일반고	남고	20	372	42
26	●●	2023	너울가지고등학교	사립	일반고	여고	21	481	50
27	●●	2023	너나들이고등학교	공립	일반고	공학	32	824	67
28	●●	2023	또바기고등학교	사립	일반고	여고	24	656	51

주1) 제시된 교명은 모두 가명 처리된 것으로, 실제 학교 이름과 무관함.

나 학습 공간

1) 융합교과실

2019년 조성 | ●●교육청 달무리고등학교 사립 공학
주제: 찬반 논쟁 협동학습이 자유로운 미래형 카페 교실

» 공간 이름: 과학 카페

» 공간 종류: 융합교과실·토론형·가변형 교실

① 공간 소개

- 가변형 벽체 활용으로 학습 공간의 유연성을 확보
- 학생 참여형 수업의 활성화를 위한 토의·토론 전용 교실
- 수업 이후 다채로운 협동학습 및 탐구학습이 가능한 카페형 공간

② 공간 활용 사례

- 주제 중심 수업 운영을 위한 사회·과학 전용 교실
- 다양한 창의적 체험활동(자율활동·진로활동·동아리 활동) 전용 활용 공간
- 학교 방문 및 학부모 간담회 등 학교 행사를 위한 공간 이용 등

③ 공간 활용 사진



주제 중심 수업
(가변형 벽체 활용 경제·물리학 교과 수업)



창의적 체험활동 프로그램 운영
(화학공학연구원, 화장품 연구원
진로활동)



학교 행사 공간 활용
(교육부 출입 기자단 학교 방문, 2021.)

[그림 62] 과학 카페 활용

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학

주제: 공간의 유연성을 도모한 교과교실, 과학실(물리화학실, 생명화학실)

» 공간 이름: 교과교실, 물리화학실, 생명화학실

» 공간 종류: 융합교과실·실험실

① 공간 소개

- 층마다 크기가 다른 교과교실이 3개씩 배치됨.
- 교실 반 칸 크기, 한 칸 크기, 두 칸 크기 등 다양한 크기의 교과교실이 있음.
- 학습 공간 및 지원 공간으로의 역할

② 공간 활용 사례

- 공간 시간 활용
- 보충수업 실시
- 면접 준비를 위한 활동
- 학생 및 학부모 상담
- 교과 협의회
- 각종 소규모 회의 등에 활용
- 특히 지역사회와 연계한 활동인 한국****연구원 및 ***학 기업과 협력하여 과학 심화 탐구 프로젝트 실시 및 진로 멘토링을 교과교실 및 과학실에서 진행했고 ☆☆대학교와 연계하여 수업량 유연화 기간에 실시한 학생 진로별 심화 특강을 교과교실 및 과학실, 도서실에서 실시하여 학생 진로별 핵심역량을 키우는 데 기여함.
- 번역체계의 이해, 융합과학 탐구 등 학기마다 다양한 소인수 과목 수업을 개설하여 소수의 학생이 원하는 수업을 수강할 수 있도록 노력함. 이에 교과교실을 적극 활용하여 학점제 공간을 충분히 활용.

③ 공간 활용 사진

1) 학습 공간의 유연성

- 수업 방식을 반영한 다양한 형태와 크기의 교실 활용



[그림 63] 다양한 크기와 형태의 교과교실 및 활동

2) 동선의 효율화

- 1학년은 2층, 2학년은 3층, 3학년 4층 안에서 모든 수업이 이루어질 수 있도록 2~3개 정도의 교과교실이 층마다 활용되고 있음.



2층 1학년 수업 공간

4층 3학년 수업 공간

3층 2학년 수업 공간

[그림 64] 층별 교과교실 배치

3) 공간의 효율적인 활용을 위해 강의실 예약 프로그램 활용


- 수업 이외의 활동 시 공간을 희망하는 학생 및 교사들이 많아 강의실 예약 프로그램을 활용하여 공간을 활용하고 있음.




도서관 예약 현황 1




3층 교과교실 예약 현황

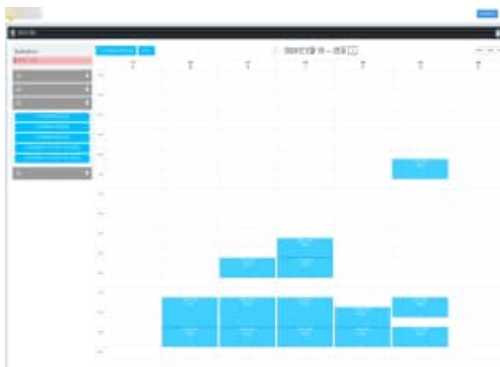


3층 스튜디오 예약 현황

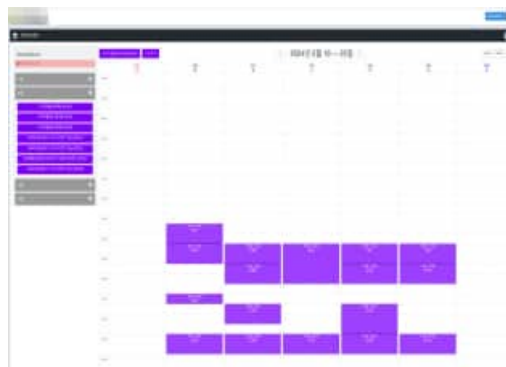

2층 스튜디오 예약 현황

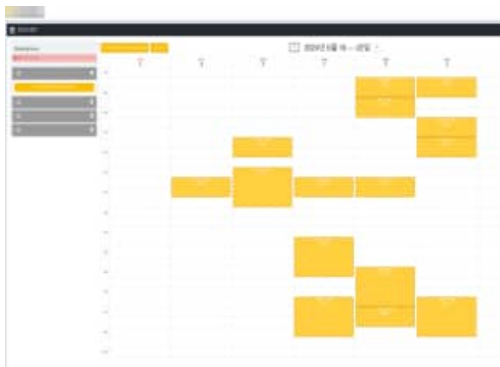

도서관 예약 현황 2

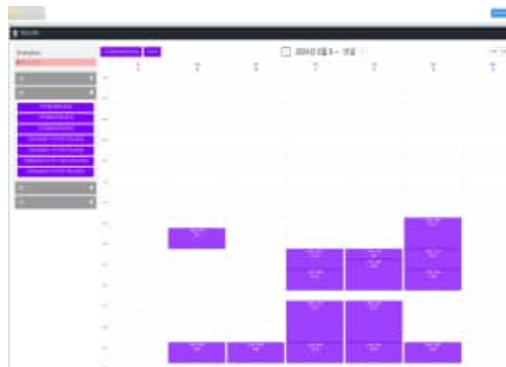

2층 교과교실 예약 현황

[그림 65] 공간 예약 프로그램 화면

2020년 조성 | ▶▶ 교육청 아람드리고등학교 사립 여고
주제: 미래형 학습 환경 구축 - 인문사회 강의실

» 공간 이름: 인문사회 강의실1

» 공간 종류: 융합교과실

① 공간 소개

- 카페 같은 분위기의 인문사회센터
- 전자칠판 구축으로 디지털 학습 환경 지원
- 원활한 자료 검색과 실시간 학습 활동이 가능한 무선 인터넷 환경 구축
- 토론 및 협업용 테이블 설치로 자유로운 수업 환경 배치가 가능한 모듈 학습 지원
- 편안한 좌석과 인테리어로 창의적 사고를 유도

② 공간 활용 사례

- 디지털 자료를 실시간으로 분석하고 다양한 시각 자료를 활용한 심화 학습
- 소규모 토론 및 협업 활동
- 디지털 기기를 활용한 발표학습으로 학생들의 디지털 리터러시 능력 강화
- 자유 학습 및 휴식 공간으로 활용
- 다양한 교과 간 융합 프로젝트 활동의 중심 역할

③ 공간 활용 사진



[그림 66] 인문사회 강의실 활용

2023년 조성 | □□교육청 윤슬고등학교 공립 공학

주제: 꿈·끼 키움 스페이스

» 공간 이름: 일반교실

» 공간 종류: 융합교과실

① 공간 소개

- 전자칠판 설치를 바탕으로 크롬북 등의 디지털 기기 활용 수업이 가능한 학습 환경 구축
- 스마트 기기의 효율적 활용을 통한 다교과 간 연계 수업 및 주제 통합적 교수학습 활동
- 학생 참여형 수업 활동 적극적 지원

② 공간 활용 사례

- 주제 통합형 탐구 수업 활동
- 학생 참여를 바탕으로 토론 및 발표 수업

③ 공간 활용 사진



[국어]
토론을 통한 인공지능과
미래사회에 대한 분야별 탐구



[미적분]
처방전 속 약 복용시간과 횟수



[심화영어]
해외 학술자료 조사를 통한 DNA
심화 탐구



[정치와 법]
ESG 경영과 기업 윤리



[생명과학]
친환경 효소 기술을 통한 환경 보전



[사회문제탐구]
기후 위기 대책을 위한 토의

[그림 67] 교과별 꿈·끼 키움 스페이스 활용

2023년 조성 | ●●교육청 꽃내음고등학교 공립 여고

주제: 재충전하고, 다시 연결하고, 준비할 수 있는 오아시스 공간

» 공간 이름: 쉼마루

» 공간 종류: 융합교과실


① 공간 소개

- 교실 1실 크기
- 모듈형 책상으로 다양한 형태의 그룹 형성이 가능한 모둠활동
- 초단초점 프로젝터 설치
- IOS, 안드로이드 운영 장비에서 무선 미러링 가능
- 범랑 화이트보드, 파워드 스피커 설치
- 개방적인 문과 작은 원형 창(1학년)
- 선생님들과 면담이나 상담을 할 수 있는 작은 부스 설치
- 3학년 수업 공간은 부스형, 큰 테이블에 자습하는 공간으로 크게 나뉘어 있어 온전히 공부에 집중할 수 있도록 시선을 휴게공간과 분리함.
- 3학년 수업 공간은 카페 같은 분위기의 공간을 조성하였고 학생들의 주체적인 사용으로 활용되므로 조도를 충분히 확보할 수 있도록 직·간접 조명 설치

② 공간 활용 사례

- 이동수업 시 부족한 교실로 사용, 수업이 없을 시 자기주도학습 공간으로 사용
- 최소 성취 수준 예방 수업, 방과후 수업 발표 수업, 미술 교과 수업
- 멘토-멘토링 활동, 동아리 활동실
- 학년 회의나 소규모 스터디

③ 공간 활용 사진



[그림 68] 쉼마루 활용 사진

2023년 조성 | ◆◆교육청 달보드레고등학교 공립 공학

주제: 모두의 생각을 잇는 더이음실

» 공간 이름: 더이음실

» 공간 종류: 토론형·계단식·융합교과실

① 공간 소개

- 교실 한 칸 정도 크기의 공간에 찬반 토론이 가능하도록 테이블이 마주 보는 각도로 양쪽에 배치됨. 2계단으로 단차를 두어 앞자리에 앉아있는 학생의 방해를 최소화해 뒷자리에 앉은 학생도 시야가 트여 수업 몰입도가 높은 편임.
- 건물의 1층 엘리베이터 바로 앞에 위치하고 있어 접근성이 좋고 늘 문이 열려있어 필요한 시간에 원하는 누구나 사용할 수 있는 공간임.
- 가운데 길쭉한 원형 테이블이 배치되어 있어 각종 회의 공간으로도 활발하게 활용.
- 천장에 타원형 조명이 있고 화이트와 하늘색 투톤의 인테리어가 세련된 분위기를 연출하고 있으며 마이크와 전자칠판이 설치되어 있고 소규모 특강 장소로도 적합함.

② 공간 활용 사례

- 찬반 토론
- 모의재판
- 학부모 진로 특강
- 각종 회의(부장 회의, 학생회 간부 회의 등)

③ 공간 활용 사진



[그림 69] 더이음실 회의·토론 장면

2023년 조성 | ▶▶ 교육청 새빛고등학교 공립 공학

주제: 집중은 최고!소음은 최소!

» 공간 이름: 시청각실

» 공간 종류: 융합교과실·계단식 교실

① 공간 소개

- 일반교실 1칸 규모
- 내부 벽면을 방음벽 설치와 방음 유리문 설치하여 소음 최소화
- 학습 공간 및 지원 공간으로 활용
- 천장 타일을 제거하여 개방감을 높인 계단식 강의실

② 공간 활용 사례

- 일반교실에서 수용(20명)이 어려운 다인수 교과목의 교과수업
- 전문가를 초청하여 학생 및 학부모 진로 진학 특강
- 계단식 강의실로 집중력이 높아 강의식 수업에 적합함.
- 방음벽과 방음문 설치로 소음을 줄일 수 있어 음악동아리 활동에 적합함.
- 공강 시간 또래 멘토링 및 동아리 자율활동

③ 공간 활용 사진



전문가 초청 진로 특강



다인수 교과수업



학교생활기록부 기재 교사 연수



음악동아리 활동

[그림 70] 계단식 시청각 교실 활용

2) 소인수 강의실

2021년 조성 | □□교육청 미쁨고등학교 공립 공학
주제: 꿈을 이루는 스터디 공간!

» 공간 이름: 그룹학습실

» 공간 종류: 소인수 강의실

① 공간 소개

- 교실 반 칸의 소규모 그룹학습실
- 학습 공간 및 지원 공간으로의 역할
- 토론 활동 및 여러 명이 모여 상담을 할 수 있도록 6-8인 책상 설치
- 학년별 원활한 사용을 위해 2층(1학년), 4층(2학년), 5층(3학년)에 그룹학습실 조성

② 공간 활용 사례

- 멘토링 토래 학습활동, 방과후 자기주도학습 공간
- 최소 성취 수준 보장 지도, 기초·기본 학력 향상을 위한 방과후학교 수업 공간
- 진로진학 및 대입 관련 일대일 컨설팅 공간
- 소규모 토론 활동 및 회의 공간 지원

③ 공간 활용 사진



[그림 71] 그룹학습실 활용

2022년 조성 | ○○교육청 띠앗고등학교 공립 남고

주제: **꿈이 자라는 실**

» **공간 이름:** PBL1실

» **공간 종류:** 소인수 강의실

① 공간 소개

- 교실 반 칸의 소규모 교실
- 학습 공간 및 지원 공간으로의 역할
- 모둠활동 및 여러 명이 모여 상담을 할 수 있도록 사다리꼴 모양 책상 설치
- PBL1실의 경우 전자칠판 설치

② 공간 활용 사례

- 학생과 학부모 상담
- 면접 준비를 위한 활동
- 모둠활동 및 동아리 활동
- 소인수 및 공동교육과정 수업

③ 공간 활용 사진



[그림 72] PBL1실 활용

2023년 조성 | ●●교육청 송골송골고등학교 공립 여고

주제: 자유로운 활동을 보장하는 학습 공간

» 공간 이름: 해오름실(부채마루, 온라인 학습실, 토론 학습실)

» 공간 종류: 소인수 강의실

① 공간 소개

- 해오름실 내 여러 실에 있는 소규모 학습실
- 학습자의 소규모 온라인 학습과 토론 학습이 가능한 수준으로 설계
- 디지털 칠판과 방송 촬영 장비 등을 구비하여 다양한 학생활동이 가능하도록 지원

② 공간 활용 사례

- 두레 멘토링 활동(1, 2학년 멘티 멘토 활동)
- 전공 심화 스터디 활동(진로가 비슷한 학생들이 진로와 관련된 심화 활동을 수행)
- 학생자치회를 포함한 다양한 동아리 활동 수행
- 교사들의 더 배움 공동체 활동을 통한 전문성 신장
- 다양한 유형의 수업과 평가활동 지원(영상 촬영, 토론 학습 등)

③ 공간 활용 사진



[그림 73] 해오름실 내 소인수 강의실

3) 대형 강의실

(1) 일반형 교실

2021년 조성 | ◆◆교육청 햇살고등학교 공립 여고
주제: 상상하는 활동이 모두 이루어질 수 있는 곳 스카이 클래스

» 공간 이름: 스카이 클래스

» 공간 종류: 대형 강의실

① 공간 소개

- 구조관 7층에 있는 전망 좋은(3면 창문) 교실 3칸 정도의 공간
- 학습 공간, 공용 공간, 지원 공간으로의 역할을 모두 수행할 수 있음
- 공간의 바깥쪽에 햇살고등학교 역사 자료 전시
- 복도에 개교 이후 변화된 교복 전시-사료관
- 공간의 가운데에 육각 책상 36개를 설치하여 다양한 형태의 책상 배열 가능
 - 다양한 형태의 모둠 수업, 동아리 활동 가능
 - 강의식 수업 가능(빔프로젝터, 스크린 설치)
 - 책상을 모두 치울 경우 빈 공간에서 다양한 활동 가능
- 공간의 오른쪽에 편안한 소파형 의자와 탁자 설치
- 암막 커튼과 다운라이트 조명 100여 개 설치
- 바닥재로 전시공간, 학습 공간, 휴게공간 구분

② 공간 활용 사례

- 햇살고 역사 교육, 모둠 수업, 중강의실
- 동아리 활동(뮤지컬 동아리, 영화 동아리 등), 세계시민교육(SNS)
- 자기 주도적 학습, 휴게공간

③ 공간 활용 사진



[그림 74] 스카이 클래스 활용

2022년 조성 | ■■■교육청 도란도란고등학교 공립 공학
주제: 협력적 학습과 소통의 장 '아고라실'

» 공간 이름: 아고라실

» 공간 종류: 대형 강의실

① 공간 소개

- 대규모 인원(70명)이 참여할 수 있는 수업 및 토론 활동을 지원하는 공간
- 넓은 공간으로 설계되어 있어 많은 학생이 동시에 수업에 참여할 수 있으며, 수업 방식에 따라 유연하게 공간 활용 가능
- 시청각 장비 외 미러링용 모니터를 곳곳에 설치하여 사각지대나 뒤에서도 영상자료를 잘 볼 수 있도록 함

② 공간 활용 사례

- 토론활동 및 프로젝트 수업
- 학생자치회 전체 회의
- 학부모 아카데미, 교직원 연수 특강, 학생 대상 특강 등 다양한 프로그램 운영

③ 공간 활용 사진



2022개정교육과정 이해 및
깊이 있는 학습 교원 연수



알아두면 쓸모 있는 미디어
페스티벌(학생 진로 특강)
[그림 75] 아고라실 활용



고교학점제 및
2028 대입 개편안 설명회(학부모)

2023년 조성 | ○○교육청 아스라이고등학교 사립 여고
주제: 150명 강연도 문제없는 대규모 강의실

» 공간 이름: 대형 강의실

» 공간 종류: 대형 강의실

① 공간 소개

- 학부모 입시 설명회, 학생 대상 강연도 고품질로 진행할 수 있는 강의실 마련
- 멀리서도 뚜렷하게 보이는 고화질 화면 설치
- 선명하게 잘 들리는 유무선 스피커
- 이동이 용이한 의자 및 책상 배치

② 공간 활용 사례

- 학부모 대상 입시 설명회 진행
- 학생 대상 진로, 진학 강연 진행
- 교사 대상 강연 진행
- 동아리 축제 시 영화제 진행

③ 공간 활용 사진



학부모 대상 입시 설명회



동아리 축제 - 영화제 진행

[그림 76] 대규모 강의실 활용

(2) 계단식 교실

2021년 조성 | ○○교육청 양증고등학교 사립 여고

주제: 학생과 교사의 다채로운 활동 공간 멀티실

» 공간 이름: B201

» 공간 종류: 계단식·대형 강의실

① 공간 소개

- 일반교실 1.5배 규모 교실
- 학생 활동 중심 수업과 모둠 수업이 가능한 2인용 사다리꼴 책상
- 책상과 의자는 40명까지의 대규모 강의를 운영할 수 있으나, 교실 뒤를 계단식으로 만들어 60명까지 수용 가능함
- 방음이 가능한 벽과 문, 암막 기능이 있는 커튼을 설치함
- 방송설비, 강의 촬영 시스템, 대형 스크린, 전자칠판을 배치한 다목적 수업 교실

② 공간 활용 사례

- 교육과정 내에서 35명 이상의 수업
- 모둠활동을 중심으로 다양한 교수학습 방법을 하고자 하는 교사의 수업
- 융합 수업 및 프로젝트형 수업, 학생 발표회
- 교내 교사 연수, 교사 학습공동체 활동 등

③ 공간 활용 사진



융합 수업



교내 과학 캠프



과목 이수 지도를 위한 전학공 연수



학교 밖 교사 학습공동체 모임

[그림 77] 멀티실(계단식·대형) 활용

2023년 조성 | ○○교육청 안다미로고등학교 공립 여고

주제: 우리의 꿈이 성장하는 목련 마당

» 공간 이름: 목련마루

» 공간 종류: 계단식·대형 강의실

① 공간 소개

- 교실 두 칸을 합쳐 계단식 중형 강의실로 조성
- 세미나·특강·설명회 등 다양한 교육 활동을 지원하는 공간으로 활용
- 무대 및 곡선 구조의 계단식 좌석을 설치
- 전자 교탁과 스크린, 스탠드형 TV, 음향시설 등을 갖추어 활동의 편의성 지원

② 공간 활용 사례

- 과학중점과정 설명회
- 창의 과제 연구 발표회
- 명사 초청 특강
- 대입 설명회
- 진로 독서 특강

③ 공간 활용 사진



과학중점과정 설명회



과제 연구 컨설팅 특강



진로 독서 특강



창의과제연구 발표회

[그림 78] 목련마루(계단식·대형) 활용

2023년 조성 | ●●교육청 또바기고등학교 사립 여고

주제: 중강의실

» 공간 이름: 중강의실

» 공간 종류: 계단식·대형 강의실

① 공간 소개

- 60여 명이 동시에 활용할 수 있는 다목적 중강의실
- 학년별로 팀 프로젝트를 수행하거나 학술 행사를 개최하기 적합한 공간
- 중급 규모의 행사를 진행하거나 수강자가 많은 강의를 진행하기에 좋은 장소

② 공간 활용 사례

- 수강신청자가 많은 윤리 수업 진행을 위해 활용
- 외부 전문가 초청 강연, 학습 워크숍 공간으로 활용
- 학년별 협업 프로젝트의 중간 발표 장소로 활용

③ 공간 활용 사진



명사 초청 특강



인사이드 투어 방문

[그림 79] 중강의실 활용

2022년 조성 | ○○교육청 초롱초롱고등학교 공립 공학
주제: '배움의 아고라' 계단형 강의실

» 공간 이름: 홈플레이스

» 공간 종류: 계단식·대형 교실


① 공간 소개

- 1.4실 정도 규모의 강의실을 계단형 강의실로 구축
- 학생, 교사에게 향상된 시야를 확보하고 토론, 발표 등에 적합한 구조
- 수용인원 50명으로 일반 학급 2개 학급 수용 가능

② 공간 활용 사례

- 수강 인원이 30명 이상인 학생 선택과목 중 계단형 강의실 활용이 교수학습 목적에 부합하는 과목 수업 운영
- 교직원 연수, 학생회 주관 토론회, JTP 발표회, 각종 학생 대상 특강 운영

③ 공간 활용 사진

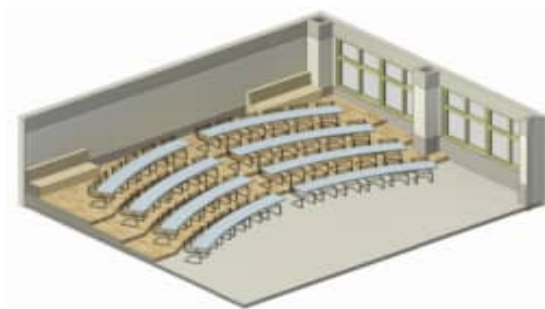

도서관 이용 교육



질문하는 책 읽기



[그림 80] 홈플레이스 계단형 강의실 활용

(3) 가변형 교실

2023년 조성 | ♀♂교육청 꼬리별고등학교 공립 공학

주제: 다양한 꿈을 키우는 복합 공간

» 공간 이름: 1, 2, 3 대강의실

» 공간 종류: 가변형·대형 강의실

① 공간 소개

- 교실 2개 크기의 대규모 공간
- 낮에는 30인 이상의 선택과목 수업이 가능하고, 밤에는 자습을 할 수 있는 공간
- 칠판이 잘 보이지 않는 측면 자리는 독서실 책상(+LED 스탠드), 교실 중앙의 책상은 15cm 단이 있는 저단형 책상으로 범용적 목적의 책상 활용
- 공간은 폴딩도어로 1.5실·0.5실로 구분하여 개폐가 가능하고, 단을 시 양쪽에서 수업할 수 있도록 교실 환경 구축(1.5실 빔프로젝터, 0.5실 이동식 전자칠판)

② 공간 활용 사례

- 선택과목 중 30명 이상의 대규모 수용이 필요한 경우 교실을 활용하기 힘들어 반을 쪼개어 추가적인 반을 만들어 선생님들의 수업 과중이 있었음
- 소규모 강의를 필요한 경우도 학년별 가용 교실이 하나밖에 없는 상황이라 변화한 교육과정에서 다양한 공간 크기의 확보는 필수적이었음
- 공간 개선 전까지는 스탠드가 없고 높은 가림막이 있는 독서실 책상으로만 구분되어 있던 곳으로 학생 관리가 어려웠고, 천장 조명만으로는 조도가 낮아 활용이 잘 이루어지지 않았음
- 위의 당면한 문제를 해결하기 위하여 학년마다 있는 대규모 공간을 정비하여 1.5실·0.5실로 나누고 가변형 교실로 운영(동시 수업 가능)

③ 공간 활용 사진



낮: 30인 이상 선택과목 수업

밤: 다양한 책상 형태에서 자기주도학습

[그림 81] 가변형 교실의 활용

2022~23년 조성 | △△교육청 도량도량고등학교 공립 공학

주제: 고교학점제 교육과정 운영을 위한 가변형 교실

» 공간 이름: 더불어 숲, 그리룸, 블루룸, 설렘ON실, 컴퓨터실, AI 융합교육실

» 공간 종류: 가변형·대형 강의실

① 공간 소개

- 교실 1칸~2칸의 가변형 교실(폴딩도어 설치)
- 선택 교육과정 운영 공간 및 자기 주도적 학습 공간으로 운영
- 모둠활동 및 여러 명이 모여 상담을 할 수 있도록 2인 책상 설치

② 공간 활용 사례

- 선택 교육과정 중 토론형 수업, 활동 중심 수업 운영
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습
- 직업인 특강, 진로 진학 아카데미 등 학교 자율 프로그램 운영 공간으로 활용
- 교원 수업 사례 나눔 공간으로 활용
- 교육과정 박람회, 자율교육과정 시 토론, 발표 등 학생 활동 공간으로 운영

③ 공간 활용 사진



[그림 82] 가변형 교과교실(더불어 숲, 그린룸, 블루룸, 설렘온실)



[그림 83] 교육과정 박람회·대학 연계 아카데미·자기주도학습(더불어 숲, 가변형 교과교실)

2023년 조성 | ●●교육청 서울가지고등학교 사립 여고
주제: 다목적 · 가변형 중강의실 ‘창의공작소’

» 공간 이름: 창의공작소

» 공간 종류: 가변형·대형 강의실

① 공간 소개

- 교실 2.5칸 규모의 중강의실(폴딩도어를 통해 1실(24석)+1.5실(32석)로 분리 가능)
- 학습 공간 및 지원 공간으로의 역할
- 전면부 및 후면부에 전자칠판, 수전, 교구 보관 수납장 설치로 다양한 활동 지원

② 공간 활용 사례

- 40명 이상 미술 수업을 정규교사와 강사가 함께 수업(학생 발표 등 필요시 공간을 분리해 수업을 진행하는 등 목적에 맞게 가변형 공간 활용)
- 교원 연수(50인) 및 워크숍 공간으로 활용
- 야간 자기주도학습 공간으로 활용
- 학생회, 대의원회의, 학부모 연수 등 공간으로 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 84] 창의공작소 활용

2023년 조성 | ●●교육청 너나들이고등학교 공립 공학

주제: 맞춤형 교실 한누리실

» 공간 이름: 한누리실

» 공간 종류: 가변형·대형 강의실

① 공간 소개

- 3개 교실 크기의 대형 강의실
- 주로 학습 공간이나 지원 공간 및 공용 공간의 역할도 수행
- 폴딩도어 설치를 통한 가변형 강의실, 이동 및 접이식 책상, 의자 배치
- 전면 전신 거울, 대형 프로젝트 스크린, 화이트보드, 측면 TV 배치를 통한 다양한 활용

② 공간 활용 사례

- 댄스 동아리 활동, 각종 동아리 작품 전시 등 활용
- 소·중규모(30~60명) 행사 및 특강 활용
- 실내 체육 수업을 위한 활용
- 방과후 활동, 꿈더하기 등 학생 활동 중심의 수업에서 활용

③ 공간 활용 사진



학생 활동 중심의 수업 운영



실내 체육활동



소·중규모(30~60명) 특강 및 행사



실내 체육활동

[그림 85] 한누리실 활용

4) 실험실·실습실

2019년 조성 | ♀♂교육청 해맑고등학교 공립 공학

주제: 학생주도형 탐구활동이 가능한 지능형 과학실

» 공간 이름: 우당탕탕 물리실, 보글보글 화학실, 두근두근 생명과학실, 와글와글 융합실, 반짝반짝 창의실

» 공간 종류: 실험실·가변형·융합교과실

① 공간 소개

- 각 과학실은 전자칠판과 교실 캠을 설치하여 온라인 수업이 용이한 환경으로 구축
- 물리실은 PBL 실험 수업이 가능하도록 구축함. 릴 콘센트, 스탠드형 테이블 등을 마련
- 과학실 복도에는 디지털 게시판(액자형 TV), 타공 게시판, 아크릴 조명 설치
- 지구과학실과 과학공용실 벽을 허물어 가변형 공간(창의실 및 융합실)으로 구축
- 창의실 및 융합실에 폴딩도어를 설치하여 하나의 강의실이나 2개로 나누어 사용
- 융합실에는 학생용 노트북을 비치하고 모뎀별로 공유할 수 있는 화면을 설치

② 공간 활용 사례

- 최소성취수준 예방 지도 및 보장 지도 수업 교실로 활용
- 면접 연습을 위한 공간
- 소인수 과목 강의실로 활용(공동교육과정, 증배교육과정)
- 국제교류 온라인 화상 회의실로 활용
- 과학과 활동(실험, 발명 동아리 활동, 연구 프로젝트 대회 활동, 과학 부스 활동 등)
- 교과별 활동 수업 및 융합 수업 시 사용(국어과 토론 수업, 수학과 프로젝트 수업)

③ 공간 활용 사진



메이커스 동아리(물리실)



융합 수업(물리실)



융합 수업(융합실)



방과후 과학 프로그램(화학실)



발명 동아리 활동(화학실)



MBL 실험 수업(생명과학실)



과학실험 동아리(생명과학실)



국제교류 온라인 회의(창의실)
[그림 86] 지능형 과학실 활용

2022년 조성 | ○○교육청 하늬고등학교 공립 여고
주제: 학생들의 상상을 현실로 만드는 상상이룸실

» 공간 이름: 상상이룸실

» 공간 종류: 실험실·실습실

① 공간 소개

- 교실 한 칸 규모의 교실
- 학습 공간 및 실험 실습, 공작 공간으로의 역할
- 다양한 그룹 활동으로 변형이 가능한 책상 및 이동식 의자 배치
- 여러 명이 모여 의사소통을 할 수 있도록 6인 책상 설치


② 공간 활용 사례

- 물리교과 수업 장소로 활용하고 있으며 정규 내 공동교육과정으로 개설되는 물리학 I, 물리학 II 수업에도 활용하고 있음
- 환경 공학 동아리 프로젝트 활동으로 지능형 식물 재배 시스템 개발 활동, 온실 시스템 개발 활동, 전기자동차 제작, 전기 전동휠 제작 활동을 진행함. 이러한 활동을 기반으로 3년간 ○○교육청이 주관하는 해커톤 대회 피지컬 컴퓨팅 교구 활용 문제 해결 분야에 3년간 입상함
- 방학 중 인공지능 캠프를 통해 노트북, 아두이노, 라즈베리파이 교구 등을 활용하여 지능형 CCTV 개발, 커스텀 객체 탐지, 애플리케이션 개발 등의 활동을 진행함

③ 공간 활용 사진



물리학 I 교과 실험




정규 내 온라인 공동교육과정



환경 공학 동아리 활동



환경 공학 동아리 활동



인공지능 캠프 활동
[그림 87] 상상이룸실 활용



인공지능 캠프 활동

2023년 조성 | ○○교육청 까치놀고등학교 사립 남고

주제: 탐구 역량과 자기 주도적 연구 수행력 함양

» 공간 이름: Science Zone

» 공간 종류: 실험실

① 공간 소개

- 후관 6층 전체를 Science Zone으로 구성하여, 학생들이 다양하고 심화된 내용으로 실험을 수행할 수 있는 전문성을 갖춘 공간 마련
- 교실 한 칸 규모의 실험실 A, B 및 중·대형교실 규모의 지능형 과학실
- 교실 반 칸 규모의 4개의 기자재실 및 2개의 동아리실
- 지능형 과학실 내부에는 유리 벽을 이용한 별도의 학습 공간을 마련하여 학생들의 자기 주도적이며 심도 있는 학습 지원
- 모둠활동 및 실험을 할 수 있도록 6인 책상 설치

② 공간 활용 사례

- 1, 2, 3학년 과학 수업
- 과학 동아리 활동
- 1, 2학기 각각 일과 후 전문적 과학실험 캠프 운영, 인근 학교와 연합 캠프 운영
- 활발한 수업 운영 및 자기 주도적인 활발한 탐구활동

③ 공간 활용 사진



과학실 층 안내



과학 수업



과학실험 캠프



과학 동아리 활동

[그림 88] Science Zone 활용

5) 디지털 교실·온라인 학습실

2019년 조성 | ○○교육청 달무리고등학교 사립 공학

주제: 우리가 기획하는 모든 것이 실현 되는 온라인 교실 ‘멀티미디어 러닝룸’

» 공간 이름: 멀티미디어 러닝룸

» 공간 종류: 온라인 학습실

① 공간 소개

- 4대의 모니터로 구성된 전자칠판
- 원형 책상 배치로 시선의 자율성 확보
- 교육부 ISMP(Information System Master Plan)와 공간 결합으로 실현된 온라인 수업 활성화

② 공간 활용 사례

- (원형 책상과 찬반 토론용 칠판) 원탁 토의와 찬반 논쟁 협동학습이 자유로운 수업
- (스마트 뷰·미러링 시스템 전용 전자칠판) 필요에 따라 실현되는 학생 참여형 수업
- (학생이 설계하고 운영하는 수업) 참여학교 자율 신청을 통한 비대면 고교 모의 UN

③ 공간 활용 사진



고교연합 모의UN 사례
(실시간 송출로 온라인 특성 활용)



비대면 온라인 수업 나눔 사례 발표
(지역교육청 주관 수업 컨설팅 운영)
[그림 89] 멀티미디어 러닝룸



기자재 활용 창의적 체험활동
(온오프라인 혼합 미디어 제작 수업)

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학

주제: 원격수업의 중심 - 온라인 스튜디오

» 공간 이름: 온라인 스튜디오

» 공간 종류: 온라인 학습실

① 공간 소개

- 온라인 수업을 제작할 수 있는 스튜디오

② 공간 활용 사례

- 본교는 온라인 수업보다 오프라인 수업을 중요시하는 분위기로 온라인 스튜디오의 활용도는 다소 미흡한 편임. (70% 기숙사)

③ 공간 활용 사진



[그림 90] 온라인 스튜디오 활용

2020년 조성 | ▶▶ 교육청 아람드리고등학교 사립 여고

주제: 미래형 학습 환경 구축 - 온라인 학습실

» 공간 이름: 온라인 학습실

» 공간 종류: 온라인 학습실

① 공간 소개

- 블렌디드 러닝 수업이 가능한 온라인 스튜디오3실, 1인 교사 수업 전송이 가능한 온라인 스튜디오2실, 학생의 온라인 수강이 가능한 온라인학습실1실로 구성
- 온라인 스튜디오2에서 최대 30명 학습 가능
- 전자칠판, 빔프로젝터, 멀티 모니터 등의 구축으로 학습 환경 지원
- 디지털 기술을 활용한 자율적이고 창의적인 학습 공간 제공
- 블렌디드 러닝 환경 제공

② 공간 활용 사례

- AI 활용 학습 프로그램 운영
- 실시간 온라인 강의와 온라인 콘텐츠를 활용한 수업 (하이브리드 수업)
- 팀 프로젝트 진행하며, AI 도구 및 디지털 자료를 활용한 문제 해결 학습
- 온라인 수업을 활용한 공동교육과정 운영
- 토의·토론을 통한 모둠 프로젝트 활동 지원

③ 공간 활용 사진



[그림 91] 온라인 학습실 활용

2021년 조성 | ◇◇교육청 꽃보라고등학교 사립 여고

주제: 협력과 창의가 만나는 PBL실

» 공간 이름: PBL

» 공간 종류: 디지털 교실

① 공간 소개

- 1.8실 크기
- 학습 공간 및 학생 휴게공간의 역할
- 모둠활동, 프로젝트 활동, 개별화 수업, 하이브리드 러닝 가능
- 토론회, 설명회, 학생과 교사 연수 가능
- 전자칠판, 전자 교탁, PBL장비(교사-학생, 학생-학생 간의 쌍방향 소통), 모뎀 PC, 노트북, 6×6 책상 설치

② 공간 활용 사례

- 다양한 프로젝트 활동에 활용(많은 교과에서 활용)
 - 프로젝트 수업에서 모둠활동 학습지 작성 후 바로 타 모뎀원들의 결과물을 확인할 수 있는 인포그래픽 활동
 - 교사가 모뎀원별로 질문하고 답을 요구할 때 전자칠판과 실시간으로 연동
 - 결과물이 바로바로 공유되기 때문에 학생들의 진행 상황을 바로 확인
 - 개인별 문제 제시 후 개별 답안을 전자칠판으로 바로 지도 교사가 확인하여 학생 답안 작성에 따른 수준별 과제 제시
 - 특색활동 후 다양한 결과물 산출 시 여러 결과물을 한꺼번에 학생들이 실시간으로 공유하며 소통할 수 있고, 동시 토론 활동
 - 모뎀 프로젝트 수업에서 인공지능 개념 수업을 PBL실의 모뎀전용 컴퓨터와 모니터로 활동한 후, 발표 시 원격 조정하여 메인 화면 및 각 모니터에 전송하여 활용
- 자율적 교육과정(수업량 유연화)
 - 영어, 사회, 과학, 정보, 음악, 미술, 등 여러 교과와 융합한 수업 진행에 있어 각 모뎀에 배치된 컴퓨터와 모니터를 활용하여 효율적인 수업 진행
 - 3~4개의 개별 마이크를 활용해 2~3명의 교사가 코칭 진행

- 최신 성능의 노트북을 활용하여 여러 AI 코스웨어를 활용한 교과 융합 수업
- 융합 수업 후 학생들의 결과물 발표 시 에듀테크 기술을 활용하여 토의·토론 수업
- AI 디지털 교과서 영어 교과 교원 연수(거점학교)
- 교사 역량 강화 연수

③ 공간 활용 사진



AI 코스웨어 활용 수업(영어)



창의적 체험활동(자율활동)



AI 코스웨어 활용 수업(과학)



AI ◇◇ 미래교육(교육청)



자율적 교육과정(교과 융합: 토의 토론)



교사 역량 강화 연수



자율적 교육과정(교과 융합: 음악+정보)



AI 디지털 교과서 교원 연수

[그림 92] 디지털 PBL실 활용

2021년 조성 | ◇◇교육청 꽃보라고등학교 사립 여고

주제: 미래교실, AI UNIVERSE

» 공간 이름: AI UNIVERSE

» 공간 종류: 디지털 교실

① 공간 소개

- 1.3실
- 학습 공간 및 학생 휴게공간의 역할
- 모둠활동, 프로젝트 활동, 개별화 수업, 하이브리드 러닝 가능
- 토론회, 설명회, 학생과 교사 연수 가능
- 전자칠판, 전자 교탁, PBL장비(교사-학생, 학생-학생 간의 쌍방향 소통), 모뎀 PC, 노트북, 7×4 책상 설치

② 공간 활용 사례

- 다양한 프로젝트 활동에 활용(많은 교과에서 활용)
- AIDT 활용 수업(프로토타입)
- 교사 역량 강화 연수
- 다양한 공개 수업
- 지역 주민 연수 - 지역 사회 천문 관측 프로그램

③ 공간 활용 사진



AIDT 활용 수업(영어)



AI 코스웨어 활용 수업(영어)



디지털 선도학교 수업 공개



공영방송 촬영



AI ◇◇ 미래교육

프로젝트 수업



교사 역량 강화 연수(AI 활용)



지역 사회 천문 관측 프로그램

[그림 93] AI UNIVERSE 활용

2021년 조성 | △△교육청 동산고등학교 사립 여고
주제: 미래역량과 심화지식을 함양하는 멀티룸B

» 공간 이름: 멀티룸B

» 공간 종류: 디지털 교실

① 공간 소개

- 본교는 학생 수에 비해 특별교실 공간이 부족함
- 이에 몇 개의 교실을 다목적 교실 즉 멀티룸으로 명명하여 필요한 교과와 신청을 받아 시간표를 작성 후 사용함
- 전면에 대형 전자칠판과 가구 장을 설치하여 미래 시대 분위기 도출
- 크롬북 30대 구비, 와이파이 설치로 디지털 수업에 최적화된 공간 조성

② 공간 활용 사례

- 정보교과목에 대한 수요 확대로 기존의 AI 수업실 외에, 추가 교실이 필요하게 되어 이 공간을 사용함
- 방과후에는 학교 간 공동교육과정 수업이나 영재반 수업 교실로 활용함

③ 공간 활용 사진



[그림 94] 멀티룸B 활용

2021년 조성 | △△교육청 동산고등학교 사립 여고

주제: 멀리 있어도 옆에 있는 듯

» 공간 이름: 온라인 학습실

» 공간 종류: 온라인 학습실

① 공간 소개

- 온라인 수업과 오프라인 수업이 동시에 가능한 소규모 교실 (14인 수용 가능)
- 강사 추적 카메라 설치
- TV 4대 설치로 사각지대 없이 모든 학생 관찰 가능

② 공간 활용 사례

- 공유캠퍼스 수업 시 활용
- 코로나 시국 시 공유캠퍼스 연합학교인 학생들이 대면 수업이 아닌 온라인으로 만나서 수업한 교실

③ 공간 활용 사진



[그림 95] 온라인 학습실 활용

2023년 조성 | ●●교육청 꽃내음고등학교 공립 여고

주제: 목표를 세우고 도전하는 미래 아카데미

» 공간 이름: 온라인 학습실

» 공간 종류: 온라인 학습실

① 공간 소개

- 계단식 강의실
- 오프라인·온라인 수업, 온라인 강의를 진행할 수 있도록 고정식, 이동식 장비를 갖추
- PTZ 카메라 1대, 초단초점 빔프로젝터, 범람 칠판, 전자 교탁
- 이동식 카메라 1대, 비디오 스트리밍 스위처 1대, 콘텐싱 마이크
- 노트북 15대, 헤드셋 15개, 갤럭시 탭 30대

② 공간 활용 사례

- 발표 수업, 강의식 수업
- 오프라인 및 온라인 공동교육과정 참여 학생 이용, 교사 강의를 진행
- 학교 행사 온라인 송출

③ 공간 활용 사진



[그림 96] 온라인 학습실 활용

2023년 조성 | ○○교육청 포로니고등학교 사립 공학

주제: 다목적 활동실 메이커스페이스

» 공간 이름: 메이커스페이스

» 공간 종류: 디지털 교실

① 공간 소개

- 메이커스페이스는 기존 교실 두 칸을 리모델링하여 창작 활동과 협업을 지원하는 다목적 공간으로 조성되었습니다.
- 출력 및 후처리실: 교실 반 칸 규모로, 창작 후 결과물을 정리하거나 간단한 작업을 진행할 수 있습니다.
- 활동 공간: 한 칸 반 규모로, 대형 전자칠판과 음향 장비가 설치되어 있으며, 최대 40명이 동시에 참여할 수 있는 넓은 공간입니다.
- 스마트기기를 활용한 창작 활동과 공동 작업을 지원하며, 다양한 교육 및 문화 활동이 가능한 유연한 공간입니다.

② 공간 활용 사례

- 메이커스페이스는 디지털 기술과 창의력을 결합한 활동 공간으로, 학습과 예술, 커뮤니케이션이 융합되는 특별한 환경을 제공합니다.
- 스마트 기반 창작 활동: 스마트기기를 활용해 3D 설계 프로젝트를 진행, 생성형 AI를 이용한 미술 및 음악 작업 등 다양한 디지털 창작 활동
- 공연 및 발표 준비: 음향 장비를 활용해 공연 연습, 소규모 공연, 발표 및 워크숍
- 상담 및 모임: 학생과 학부모 상담, 학부모 설명회, 교직원 연수 같은 공식 모임
- 교육 및 팀워크 활동: 최대 40명이 참여하는 협업 프로젝트, 토론, 교육 프로그램

③ 공간 활용 사진



[그림 97] 메이커스페이스

2023년 조성 | ●●교육청 송골송골고등학교 공립 여고
주제: 디지털 수업에 대비한 쉼틀마루

» 공간 이름: 쉼틀마루

» 공간 종류: 디지털 교실

① 공간 소개

- 40대의 노트북을 구비하여 디지털 수업이 가능하도록 한 공간
- 자유롭게 책상을 배치할 수 있어 노트북을 활용한 다양한 토론학습이 가능하게 구현
- 모듈별 모니터를 준비하여 모듈별로 토론 학습이 원활히 진행될 수 있도록 함

② 공간 활용 사례

- 노트북 활용 토론 수업
- 과학과제연구 토론 수업
- 노트북을 활용한 평가 수업
- 여러 가지 형태의 교사 더배움 공동체 지원
- 영상 촬영 및 편집, 노트북을 활용한 다양한 형태의 교사 연수 진행

③ 공간 활용 사진



[그림 98] 쉼틀마루 활용

2022~23년 조성 | △△교육청 토랑토랑고등학교 공립 공학
주제: 디지털 역량 강화를 위한 수업 혁신 지원 및 수업 환경 조성

» 공간 이름: 틈새공간, 롤링스톤즈

» 공간 종류: 가변형·디지털 교실

① 공간 소개

- 디지털·AI(인공지능) 융합 수업이 가능한 2개 실 구축
- 자율 주행 로봇 실습이 가능한 2인용 컴퓨터실 책상 설치
- 공유공간으로 확장할 수 있는 폴딩도어 설치(AI(인공지능) 교육실)
- 전체 교실을 디지털 기반 교실로 구축(전자칠판 도입)

② 공간 활용 사례

- 1학년 정보, 2학년 인공지능 기초, 3학년 정보과학 교과 수업 운영
- 1학년 데이터 기반 창체 수업(진로) 운영
- AI, SW 캠프, 알고리즘 페스티벌 운영
- 디지털, 데이터 기반 교과 수업 운영(2학년 세계 지리 등)

③ 공간 활용 사진



[그림 99] 스마트 디지털 교육 환경(컴퓨터실, AI융합교육실, 디지털 교실)



[그림 100] 디지털 활용 수업 혁신 지원(AI기반 수업 혁신 연수), 교원학습공동체 연구 지원



[그림 101] 국제교류 활동 장면(덴마크 학교 교류, 한-뉴질랜드 국제 공동 수업(코딩 수업))

다 지원 공간

1) 문화예술·체육 활동실

2019년 조성 | ●●교육청 달무리고등학교 사립 공학
주제: 우리가 기획하고 촬영하여 공유하는 미디어 공간

» 공간 이름: 학습 스튜디오

» 공간 종류: 문화예술활동실

① 공간 소개

- 학생 참여가 자유로운 책상과 의자가 없는 시청각실
- 미디어 기자재를 활용과 방음벽 설치로 활용이 자유로운 교내 스튜디오
- 댄스 및 연극 동아리의 주 무대이자 학교 영상의 주인공이 되는 무대

② 공간 활용 사례

- 연극 수업을 위한 수업 교실로 사용
- 학교 행사 영상 촬영을 위한 무대로 활용
- 학생 부스 운영을 위한 공간 및 비밀 상담을 위한 공간 이용

③ 공간 활용 사진



댄스 동아리 활동 모습



학교 행사 무대 활용 사례(자율활동 홍보) 성과 공유회 부스 운영(수업량 유연화 주간)



[그림 102] 학습 스튜디오 활용

2022년 조성 | ○○교육청 하늬고등학교 공립 여고
주제: 활용도를 최대한 높인 소외 공간

» 공간 이름: 동아리실

» 공간 종류: 문화예술·체육 활동실

① 공간 소개

- 복합문화체육공간의 학생 동아리실
- 밴드 악기 및 사이클 등 체력단련이 가능한 공간 및 기구 배치
- 1.5칸 규모의 공간

② 공간 활용 사례

- 점심시간 활용 밴드 연습 및 버스킹 공연
- 점심시간, 저녁시간 활용 실내 사이클 및 체력단련 기구 활용 체력단련 활동
- 공강 시간 2학년 이상 학생 교육 및 프로그램 운영
- 다문화 학생 진로 컨설팅 및 한국어 교육 활동

③ 공간 활용 사진



밴드 연습



체력 단련



공강 시간 학년 단위 교육 활동



공강 시간 교육과정 안내 교육

[그림 103] 동아리실 활용

2023년 조성 | ○○교육청 포로니고등학교 사립 공학

주제: **만능 창작 지원 메타버스실**

» **공간 이름:** 메타버스실

» **공간 종류:** 문화예술·체육 활동실

① 공간 소개

- 메타버스실은 기존 교실 두 칸을 리모델링하여 가상현실(VR) 및 콘텐츠 제작을 중심으로 다양한 활동을 지원하는 공간입니다.
- 운영실: 교실 반 칸 규모, VR 장비와 콘텐츠 제작에 필요한 장비의 관리와 운영
- 활동실: 한 칸 반 규모, 다양한 활동과 콘텐츠 제작을 위한 환경 마련. 활동실은 공간 활용성을 극대화하여, 학생들이 창작과 체험을 통해 학습할 수 있는 최적의 환경을 제공함. 전체적으로 카펫과 커튼으로 감싸인 따뜻한 분위기의 장소임.

② 공간 활용 사례

- 메타버스실은 첨단 기술과 창의적 활동을 융합하여 미래형 학습과 체험을 지원하는 혁신적 공간으로, 학생들이 상상력을 실현하고 다양한 경험을 쌓을 수 있는 장입니다.
- 콘텐츠 제작 및 활용: 실습실 한쪽 벽은 호리존 스튜디오 형태로 조성되어 조명과 함께 영상 및 이미지 콘텐츠 제작에 활용
- VR 체험 및 활동: VR 기반 학습 및 체험 활동이 가능하며, 가구를 배치하지 않아 안전하게 활동할 수 있도록 설계
- 실내 체육 및 예술 활동: 반대쪽 벽면은 전면 유리로 시공되어 춤 연습과 같은 실내 체육활동을 지원하며, 카펫 바닥으로 안전성을 더함
- 소음 및 음향 관리: 실습실은 카펫과 커튼을 설치하여 소음이 울리는 것을 방지하며, 몰입감 있는 환경을 제공

③ 공간 활용 사진



[그림 104] 메타버스실 활용

2023년 조성 | ♀♂교육청 꼬리별고등학교 공립 공학

주제: 모두의 무대

» 공간 이름: 문화예술활동실

» 공간 종류: 문화예술활동실

① 공간 소개

- 문화예술활동실은 마루형이며 벽 한쪽 면이 거울로 되어 있고, 다른 쪽은 화이트보드로 예술 활동이 가능함. 좌석은 넣었다 뺐다 할 수 있는 가변형 벤치로 활동 방법에 따라 활용 가능함

② 공간 활용 사례

- 문화예술활동실에서 학생들은 춤, 합창 등의 교내 행사 연습 등 무대에 서기 전 준비할 수 있음

③ 공간 활용 사진



[그림 105] 문화예술활동실 활용

2) 소규모 활동 공간

2021년 조성 | △△교육청 동살고등학교 사립 여고
주제: 생각에 생각을 더 하는 곳(더해움 - 순우리말)

» 공간 이름: 더해움

» 공간 종류: 소규모 활동 공간

① 공간 소개

- 학생의 쉼과 토론 학습이 가능한 공간
- 선택과목 교과서를 배치하여 고교학점제 지원

② 공간 활용 사례

- 쉬는 시간 휴게공간
- 공장 및 방과후 자기주도학습
- 토론 학습

③ 공간 활용 사진



[그림 106] 소규모 활동실 더해움 활용

2022년 조성 | ♡♡교육청 듄숙고등학교 공립 공학
주제: 학생자치회실

» 공간 이름: 학생자치회실

» 공간 종류: 소규모 활동 공간

① 공간 소개

- 학생자치회 활성화와 자율적 학생 문화 형성을 위한 학생자치회실
- 회의를 위한 원형 구조의 테이블과 학생자치회 부서별 수납이 용이한 수납함을 목공 선반 작업으로 설치, 컬러프린터와 냉장고 등 필수 집기류 설치, 학생자치회 추진 사업과 관련한 '캠페인 물품', '불법 카메라 단속 장비', '양심 우산' 등 비치

② 공간 활용 사례

- 학생자치회 정기·임시 회의 진행
- 학생자치회 사업 추진을 위한 제작, 준비실

③ 공간 활용 사진



[그림 107] 학생자치회실 활용

2022년 조성 | ■■■교육청 도란도란고등학교 공립 공학
주제: 학생 중심의 창의적 공간 '미디어 스페이스실'

» 공간 이름: 미디어 스페이스실

» 공간 종류: 소규모 활동 공간

① 공간 소개

- 학생들이 자유롭게 학습하고 교육 활동 결과물을 전시할 수 있는 공간 제공
- 자기주도 학습이 가능한 긴 테이블 및 작은 테이블 배치
- 컴퓨터 검색 및 출력이 가능한 복사기와 컴퓨터 설치
- 자유 의견란 및 주제 관련 의견을 공유할 수 있는 유리 게시판 설치

② 공간 활용 사례

- 삼북프로그램 결과물 전시
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습

③ 공간 활용 사진



삼북프로그램 결과물 전시



미디어스페이스 실 앞 게시판
[그림 108] 미디어 스페이스실



공강 시간(방과후) 활용

3) 다목적실

2023년 조성 | □□교육청 윤슬고등학교 공립 공학
주제: 꿈·끼 지원 스페이스

» 공간 이름: ●●마루, 메이커스페이스, 하브루타실

» 공간 종류: 가변형·다목적실

① 공간 소개

- 학생 개개인의 선택과목 및 관심 분야, 주제에 맞는 다양한 규모의 학습 활동 공간
- 학생들의 학습 활동의 유형 및 성격을 고려한 맞춤형 학습 환경 구축

② 공간 활용 사례

- 토론 활동 준비 및 토론학습
- 소규모 프로젝트 학습 준비와 발표 활동 실시
- 상황에 따른 교실 크기를 바꿀 수 있는 가변형 교실에서 소규모 회의 후 대규모 포럼 활동으로 형식 변화

③ 공간 활용 사진



주제 탐구 및 토론 수업
공간(●●마루-도서실)



가변형 교실
(메이커 스페이스)



소규모 팀 프로젝트 공간
(하브루타실 1, 2)

[그림 109] 다양한 목적의 지원 공간 활용

2023년 조성 | ○○교육청 안다미로고등학교 공립 여고

주제: 다양하게, 함께

» 공간 이름: 다목적실

» 공간 종류: 다목적실

① 공간 소개

- 50여 명을 수용할 수 있는 공간
- 대형 스크린, 전자교탁, 음향시설을 통해 중대형 규모의 수업뿐만 아니라 협의회, 강연 등 다양한 활동이 가능한 공간으로 활용

② 공간 활용 사례

- 아침 시간 및 방과후 자기주도학습
- 동아리 활동 및 지역사회 연계 교육 활동
- 교직원 회의 및 학부모회 활동
- 지역거점 과학 체험 행사

③ 공간 활용 사진



교학상장(아침 자기주도학습)



인문학적 관점으로 바라보는 통일 특강



Magnolia STEAM Festival



수학 주제 탐구 발표회

[그림 110] 다목적실 활용

2023년 조성 | ○○교육청 서울가지고등학교 사립 여고
주제: 진로정보 아카이브 '진로카페 이음'

» 공간 이름: 이음

» 공간 종류: 가변형·다목적실

① 공간 소개

- 진로·진학 도서, 안내책자, 브로셔 등 정보가 모여있는 1.5실 규모의 개방형 작은 도서관
- 인터넷 검색대, 소규모(12인) 회의 공간, 4인 모듈 공간, 폴딩도어 가변형 공간으로 구성

② 공간 활용 사례

- 진로·진학 상담, 학부모상담, 진로 수업, 외부 강사 대기실로 활용
- 학년별 담임교사 연수, 교과별 연수 장소로 활용
- 점심시간 개방형 진로 정보 작은 도서관으로 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 111] 진로카페 이음 활용

2022년 조성 | ♡교육청 틈썩고등학교 공립 공학
주제: 복합문화공간 께미온(모든 것을 께다)실

» 공간 이름: 께미온실

» 공간 종류: 다목적실

① 공간 소개

- 뒤편에 유리 칸막이를 두고 방송실이 위치한 80석, 교실 2칸 규모의 개방형 공간
- 실의 출입구 옆으로 3칸의 대기-휴게공간, 실의 우측 폴딩도어를 통해 야외 원목 데크-수용장으로 이어지는 개방적 공간
- 실 전면의 대형 스마트TV와 방송 장비를 통해 실시간 양방향 화상 회의 진행이 가능

② 공간 활용 사례

- 국제교류(일본학교와 실시간 화상 영어 의사소통), 방송부 및 동아리활동
- 대학별 방문 대입 설명회, 학교 설명회 개최
- 전체 교직원 정기회의, 학부모회의 개최

③ 공간 활용 사진



[그림 112] 께미온실 활용

4) 자기 주도적 학습 공간·학습카페

2021년 조성 | ○○교육청 양증고등학교 사립 여고

주제: 집중하여 공부하고, 모둠활동과 면접도 준비하는 스터디 카페

» 공간 이름: 아단301

» 공간 종류: 자기 주도적 학습 공간·학습카페

① 공간 소개

- 쾌적한 자기주도 학습 공간
- 개별 콘센트와 부착형 스탠드가 있는 칸막이형의 개인 열람 좌석이 80석 있음
- 학생들의 자세와 허리 건강을 생각해 의자에 특히 신경을 씀
- 내부에 휴게공간이 있으며 열람 공간의 벽면과 휴게공간에 커피숍 느낌의 높은 테이블을 두어 다양한 환경을 제공함
- 공간 일부에 강화유리로 벽을 만들어 18명 정도를 수용할 수 있는 세미나실이 있음
- 12명을 수용할 수 있는 세미나실은 폴딩도어를 열면 24명을 수용할 수 있음
- 4개의 세미나실에는 각각 전자칠판과 화상 회의가 가능한 디스플레이가 설치되어 있어서 온라인 학습 공간으로 사용할 수 있음

② 공간 활용 사례

- 동아리 활동 및 모둠활동
- 3학년 공장 시간과 방과후 자율학습 시간에 자기주도 학습
- 3학년 수시 전형 기간에 상담 및 수시 전형 면접 연습

③ 공간 활용 사진



열람공간



3학년 공강 시간



세미나실



휴게실

[그림 113] 아단301

2023년 조성 | ●●교육청 너나들이고등학교 공립 공학
주제: 카공족을 위한 은가람실, 다원실, 아람실

- » 공간 이름: 은가람실, 아람실, 다원실
- » 공간 종류: 자기 주도적 학습 공간·학습카페

① 공간 소개

- 교실 1.5개 이상 크기의 지원 공간
- 수업, 동아리, 자기주도 학습실 등으로 다양하게 활용 가능
- 아람실의 경우, 도서관과 폴딩도어 연결을 통한 수업 연계

② 공간 활용 사례

- 독서 논술 활동, 수업 공간으로 활용
- 부서별 동아리 활동
- 자기주도 학습실로 활용(기존 높은 칸막이 독서실 책상에 매립 콘센트를 새로 설치)

③ 공간 활용 사진



은가람실, 다원실의 조성 환경



아람실~도서관 폴딩도어



아람실 수업 사진

[그림 114] 카공족을 위한 학습 카페

2022년 조성 | ♡♡교육청 틈썩고등학교 공립 공학
주제: 꿈을 키우는 꿈도담터

» 공간 이름: 꿈도담터

» 공간 종류: 자기 주도적 학습 공간·학습카페

① 공간 소개

- 교실 4칸 규모의 토의토론실 및 방과후 자기 주도 학습실
- 학습 공간 및 지원 공간으로의 역할
- 스터디 카페형 자기 주도 학습실, 20인 교모의 개인 정독실 공간 3실, 토의토론실이 개방형 방음 유리 벽 파티션과 롤스크린으로 구분된 대형 공간

② 공간 활용 사례

- 방과후 자기주도 학습을 위하여 최근 학생들이 선호하는 스터디 카페형 공간을 조성
- 자율교육과정의 수업 중 토의·토론 활동을 주로 운영함
- 중식 시간, 재량 휴업 기간 및 대학수학능력시험 전 학습프로그램 운영 공간으로 활용함

③ 공간 활용 사진



[그림 115] 꿈도담터 활용

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학
주제: 모두의 힐링 공간

» 공간 이름: 스터디룸

» 공간 종류: 자기 주도적 학습 공간

① 공간 소개

- 스터디룸은 층마다(2, 3, 4층) 3개씩 배치, 책상 4-5개를 놓을 수 있는 좁은 공간

② 공간 활용 사례

- 스터디룸은 학생들의 멘토링 학습 공간 및 개인학습 공간, 소규모 회의 및 토론 활동을 진행함.

③ 공간 활용 사진



[그림 116] 층별 스터디룸

2021년 조성 | ◇◇교육청 꽃보라고등학교 사립 여고

주제: Anyone, Anytime 스터디룸

» 공간 이름: 스터디룸

» 공간 종류: 자기 주도적 학습 공간

① 공간 소개

- 교실 3.5실로 365일 시간과 관계없이 자유롭게 이용
- 다양한 유형의 좌석 설치(폐쇄형 1인석, 개방형 1인석, 다인석, 온라인 학습대, 계단형 쉼터, 모듈 학습 공간 등)
- 보안: AI 안면 인식기, CCTV 4대, 긴급 호출기, 방범 서비스, 전기&조명 제어, 종료 안내 방송
- 환경: 산소 발생기, 공기 청정기
- 교육과정에 대응할 수 있는 학습 공간

② 공간 활용 사례

- 공강 시간에 자유롭게 활용
- 정규수업 시간 활용
- 다양한 강연회
- 자기주도학습 시간 활용
- 방과후, 토요일, 일요일, 공휴일에 자유롭게 활용

③ 공간 활용 사진



2024 진로 부트 캠프(의학)



공영방송 촬영



정규수업(문학과 매체)



영어 AI 융합교육



최소 성취 수준 보장 지도(독서 캠프)



최소 성취 수준 보장 지도(영어)



선후배 교육과정 멘토링



[그림 117] 스터디룸 활용



계열별 대입 컨설팅

5) 강당

2019년 조성 | ♀♂교육청 해맑고등학교 공립 공학
주제: LED스크린이 있는 다목적 강당

» 공간 이름: 다목적 강당

» 공간 종류: 강당

① 공간 소개

- 다목적으로 활용할 수 있는 강당으로 리모델링
- LED 스크린을 활용하여 각종 연수, 설명회, 공연 가능
- 강당 한 편 벽면 안에 새로운 공간을 마련하여 체력단련실 구축
- 강당 내 방송실을 마련하여 각종 행사를 원활하게 진행

② 공간 활용 사례

- 설명회 및 전교생 행사(입학식, 졸업식, 방학식, 학교 설명회 등)
- 인성교육 주간 학교 폭력 예방 뮤지컬 공연
- 학생 연수(명사 초청 특강, 씨름 교실, 예절 교육, 행복 교실, 교육과정 연수 등)
- 축제(연극 공연, 합창대회, 댄스대회, 밴드부 공연, 오케스트라 공연 등)
- 인공지능 관련 캠프(찾아가는 SW 캠프)
- 수능 시험장 관리 본부로 활용
- 교직원 연수(심폐소생술 연수, 교직원 힐링 연수 등)
- 교직원 동아리(배드민턴반), 학생 동아리 활동
- 점심시간 휴게공간으로 활용(체력단련, 걷기 운동 등)
- 교과별 행사 활동(일본 중국 문화 퀴즈 대회, 스포츠 클럽 행사 등)

③ 공간 활용 사진



입학식



학교설명회



졸업식



모래실 축제(합창대회)



일본 중국 문화 퀴즈 대회



스포츠 클럽



찾아가는 SW캠프(자율주행)



학교 오케스트라



체력단련실



찾아가는 SW캠프(인식서비스)



예절 교육
[그림 118] 다목적 강당 활용



오라차차 씨름교실

6) 도서관·복합문화공간

(1) 커뮤니티형

2021~23년 조성 | ☆☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학


주제: 복합문화공간의 중심

» 공간 이름: 모꼬지도서관

» 공간 종류: 도서관·복합문화공간

① 공간 소개

- 복합문화공간의 도서관
- 책상과 의자가 없는 원형의 자유공간을 확보
- 외부로 통하는 큰 창문을 열고 닫을 수 있도록 구성
- 도서관 내 원형 모형의 탁자와 모니터를 설치하여 온오프라인의 회의 가능
- 일반 4개 교실의 크기의 도서관

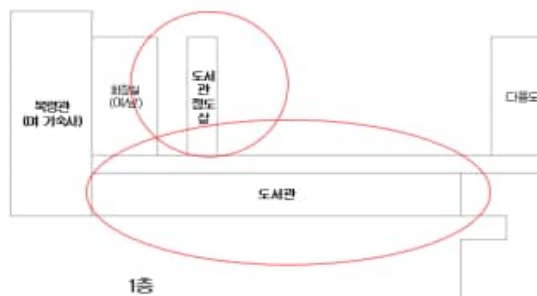

[그림 119] 도서관 배치

② 공간 활용 사례

- 일반 수업 및 비교문화, 인공지능 수학 등 소인수 수업 실시
- 초청 강연 및 학교의 크고 작은 행사를 거의 도서관을 활용하여 실시함
- 사제동행 독서 프로그램 및 고전 콘퍼런스 등 독서 관련 행사

③ 공간 활용 사진



사제동행 독서토론



창이 열리는 도서관



고전컨퍼런스



도서관 속 소회의실



전체 모습



열린 공간

[그림 120] 복합문화공간의 도서관 활용

2021년 조성 | ◆◆교육청 햇살고등학교 공립 여고
주제: 북섬(BOOK-SOME) 교육의 산실 글마루 도서관

» 공간 이름: 글마루 도서관

» 공간 종류: 도서실·복합문화공간

① 공간 소개

- 구조관 6층에 있는 교실 3칸 정도의 공간
- 지원 공간뿐만 아니라 학습 공간으로 역할할 수 있음
- 입구 왼쪽 3층에 계단형 독서 공간을 배치하고, S자형 서고를 비치하였으며, 천장 조형과 바닥재로 숲을 형상화함
- 계단형 독서 공간의 모퉁이 앞쪽에서부터 방사형 서고 배치로 개방감을 극대화
- 입구 왼쪽 창 측 벽면 위쪽에 붙박이 서고 설치, 아래쪽에 벤치형 열람 코너 설치
- 입구 반대편에 벽면 스탠드형 열람 및 독서 코너 설치
- 입구 오른쪽에 조명 테이블, 빔프로젝터, 스크린, 사이버 코너(독서 검색대) 설치
- 도서관 복도 공간에 카페형 테이블과 의자 배치
- 도서관 복도 천장은 루바 천장, 선형 LED 등 설치
- 북섬(BOOK-SOME) 프로그램에서 기르고자 하는 역량

Social communication(사회적 소통)

Originality(자신만의 끼 창출)

Morality(도덕적 인성 함양)

Experience(경험을 통한 유의미한 학습)

② 공간 활용 사례

- 도서관 활용 수업
- 공강 시간 및 방과후에 자기주도학습 가능
- 동아리 활동, 세계시민 교육(SNS)
- 그림책과 함께하는 플라워 테라피, 북큐레이션, 글마루 마음 처방전 등 독서 프로그램

③ 공간 활용 사진



[그림 121] 북섬(BOOK-SOME) 활용

2023년 조성 | ●●교육청 꽃내음고등학교 공립 여고
주제: 우리들의 아지트, 만남과 어울림이 있는 문향

» 공간 이름: 문향

» 공간 종류: 도서관

① 공간 소개

- 수업이 가능한 좌석 배치로 구성하여 평소에는 독서 공간
- 서가, 수업, 독서 공간 등 원하는 용도로 선택이 가능
- 포켓과 다락 공간으로 학생들의 입장에서 휴식 제공
- 책꽂이를 중앙과 벽면, 복도에 설치, 책꽂이 중앙에 독서 테이블 설치
- 독서에 집중할 수 있도록 BGM 설치 및 빛 독서 공간 마련
- 테이블 설치로 e-Book, 자료 검색, 공강 시간 자기주도학습
- 평상에 편하게 앉아서 토의 학습, 발표 청취하기에 적합하도록 구성
- 진입 홀을 가운데로 왼쪽은 자유로운 독서 공간, 우측은 서가+독서 공간+수업 공간이 결합
- 필요에 따라 다양하게 사용할 수 있는 가변적 공간
- 아늑한 좌식 공간, 테이블, 스탠딩 좌식 공간, 창가 벤치 등 다양한 독서 공간을 제공하여 다양한 공간을 경험
- 큰 독서 테이블과 벽면을 따라 이어진 책장 사이에 한 겹의 레이어인 책장을 두어 독서에 집중할 수 있는 영역성을 두었음
- 학생들이 생각의 폭을 넓히는 독서와 창의적인 사고를 할 수 있도록 함
- 창가에 놓인 테이블, 친한 친구들끼리 모여있는 좌식 독서 공간 등 원하는 공간을 선택할 수 있도록 함

② 공간 활용 사례

- 독서 관련 행사 진행
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습
- 진로 직업인 특강

③ 공간 활용 사진



[그림 122] 문향 활용

2023년 조성 | ○○교육청 아스라이고등학교 사립 여고

주제: 모두가 부러워하는 우리의 도서관

» 공간 이름: 은빛 도서관

» 공간 종류: 도서관

① 공간 소개

- 일반 교실 3칸 크기
- 어항과 물고기를 보면서 느끼는 작은 힐링이 가능한 입구
- 프로젝션 설치 2곳으로 수업과 행사 진행 가능
- 창가에 있는 긴 의자로 독서 및 자기주도학습 가능
- 다양한 토의 진행이 가능한 긴 테이블 설치
- 학생이 편안하게 쉴 수 있는 1인용 소파 설치
- 30명 수업 진행이 가능한 구역 마련하여 수업 진행 가능
- 책을 편하게 볼 수 있는 좌석을 다양한 모습으로 곳곳에 배치

② 공간 활용 사례

- 감정 테마 북 큐레이션
- 여름 방학 영화 상영
- 북 콘서트 진행
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습
- 독서 활용 수업

③ 공간 활용 사진



도서관, 독서 융합 수업1



도서관 독서 융합 수업2



자기 주도 학습



감정 테마 북 큐레이션



작가 북 큐레이션



영화 상영(여름방학)



힐링을 제공하는 작은 어항



사서 체험



소규모 그룹 미팅 공간



책을 편하게 볼 수 있는 공간



소파 형태의 쉼터
[그림 123] 은빛 도서관 활용



도서관 전경

2023년 조성 | ♀♂교육청 꼬리별고등학교 공립 공학

주제: 서재의 바다를 유랑해

» 공간 이름: 서향원

» 공간 종류: 도서관

① 공간 소개

- 교실 5.5개 크기의 도서관을 다양한 학습의 장으로 조성
- 스탠딩, 바, 관람석, 테이블 형태 등 학생의 다양한 성향을 고려한 독서 환경 구축
- 1.3실 크기의 수업 가능 공간을 폴딩도어로 구분하여 도서 활용 수업이 가능
- 도서관 내부와 외부 복도는 소음에 취약한 액세스 플로어로 되어 있었음. 이를 시멘트 몰탈로 채워 소음을 없애 학생들이 더 나은 환경에서 독서할 수 있도록 함

② 공간 활용 사례

- 도서부원들이 매달 추천 도서를 학교의 다양한 구성원(교사, 학생)을 대상으로 조사하여 전시, 이에 따른 이벤트 진행
- 도서관 속 보물찾기 이벤트로 비교적 소외된 곳에 떨어진 도서관의 방문율을 높이고 다양한 책이 있음을 알게 함. 책 속에 다양한 상품 교환권, 책의 문구 찾아 빈칸 채우기 등 책을 활용한 행사로 책과 도서관 자체에 관심을 가지도록 운영
- 독서토론 소모임을 구성하여 정해진 기간에 책을 읽고 이를 토론하며 생각을 공유
- 점심시간, 공강 시간에 학생들이 자유롭게 찾아와 공부할 수 있는 밝고 쾌적한 분위기의 공간으로 사서 교사의 관리로 다양한 장서를 확보·관리하여 학생들이 즐겨 찾는 공간으로 변화

③ 공간 활용 사진



독서토론 소모임



이달의 추천 도서 전시



도서관 속 보물찾기

[그림 124] 서향원 활용

2023년 조성 | ●●교육청 또바기고등학교 사립 여고

주제: 도서관

» 공간 이름: 도서관

» 공간 종류: 도서실

① 공간 소개

- 조용한 학습 및 독서를 위한 환경 제공
- 학생의 자율학습 및 그룹 스터디가 가능한 공간
- 언제든지 이용이 가능한 무인 대출 시스템을 갖춘 도서관

② 공간 활용 사례

- 국어 교과 등 도서관과 관련한 수업이 가능한 공간
- 독서를 비롯한 자유로운 휴식을 취할 수 있는 공간
- 학생의 자율학습 및 그룹 스터디가 가능한 공간

③ 공간 활용 사진



[그림 125] 도서실 활용

(2) 강연 및 행사형

2020 ▶▶ 교육청 아람드리고등학교 사립 여고
주제: 지식과 창의성의 허브

» 공간 이름: 도서관

» 공간 종류: 도서관·복합문화공간


① 공간 소개

- 복합문화공간의 도서관
- 공연 관람 및 자기주도 학습이 가능한 긴 테이블 배치
- 다양한 주제와 분야의 도서를 열람할 수 있고, 또 읽을 수 있는 조용하고 쾌적한 환경
- 전자책, 온라인 데이터베이스, 멀티미디어 자료 이용 가능
- 독서 모임, 작가와의 만남, 인문학 콘서트 등 개최할 수 있는 대규모 공간 확보

② 공간 활용 사례

- 독서와 글쓰기 프로그램 운영
- 검색대를 설치하여 디지털 학습 및 정보 탐색을 지원
- 작가 초청 강연, 북 콘서트와 같은 인문학 행사 개최 및 학생 활동의 장으로 활용
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습 활용

③ 공간 활용 사진

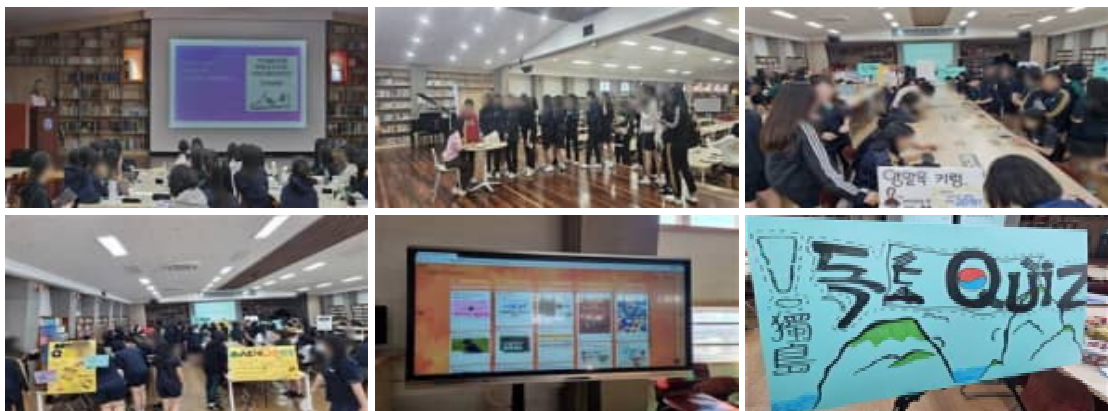

[그림 126] 지식과 창의의 허브

2022년 조성 | ○○교육청 초롱초롱고등학교 공립 공학
주제: 언제나 함께하는 독서·인문교육

» 공간 이름: 도서실

» 공간 종류: 도서실·복합문화공간

① 공간 소개

- 개방적이고 창의성을 발현할 수 있는 공간으로서의 도서관
- 교수·학습 활동, 교육 프로그램 등 운영이 가능한 공간

② 공간 활용 사례

- 초롱초롱고 공강 시간 활용 ‘독서 기반 리터러시 프로그램’ 운영
- 학교 자율 독서 인문교육 프로그램 ‘함께 책 읽기’ 운영
- 저자와 함께하는 토크 콘서트 운영

③ 공간 활용 사진



도서관 이용 교육



질문하는 책 읽기



독서 기반 리터러시 프로그램



사회문제 독서 활동

[그림 127] 독서 인문교육 활용

2023년 조성 | ▶▶ 교육청 새빛고등학교 공립 공학
주제: 모두의 문화센터 책마루

» 공간 이름: 책마루

» 공간 종류: 도서관·복합문화공간

① 공간 소개

- 일반교실 4칸 규모의 넓은 공간
- 1/2칸 규모의 작은 무대를 설치하여 작은 규모의 공연 가능
- 천장까지 한쪽 벽면 전체 서가 설치
- 1학년 주야간 자율학습이 가능하도록 12인용 큰 테이블 4조 배치
- 여러 개의 소그룹 활동이 동시에 가능하도록 작은 공간 여러 곳 마련

② 공간 활용 사례

- 도서 검색, 열람 및 대출
- 독서 기반의 일반교과 수업
- 전문가를 초청하여 학생과 학부모 대상 진로 진학 특강
- 작가 초청 북 콘서트 및 시낭송회 개최
- 1학년 일과 시작 전과 방과 후 자기주도학습
- 공강 시간 또래 멘토링 및 자율활동

③ 공간 활용 사진



학부모 진로 특강

독서 기반 교과수업

시낭송회



작가 초청 북 콘서트

1학년 야간자율학습

[그림 128] 책마루 활용

2023년 조성 | ○○교육청 까치놀고등학교 사립 남고

주제: 창의적 지식 창출의 복합 공간

» 공간 이름: 한솔지혜마루

» 공간 종류: 도서관·복합문화공간

① 공간 소개

- 후관 2층에 교실 3칸 반 규모의 대규모 복합문화 공간 마련
- 공연과 강연이 가능하도록 무대 및 이동 전자칠판 설치
- 모듈 수업과 학습이 가능한 6인 테이블 배치
- 중정으로 통할 수 있도록 기존의 벽을 철거하고 대형 폴딩도어 설치
- 중정을 바라보며 자기주도 학습 및 휴식을 취할 수 있는 카페형 테이블과 의자 설치
- 편안한 공간이 될 수 있도록 소파

② 공간 활용 사례

- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습
- 창의 융합 교육과정 전문 강사 강연회
- 학교 자율형 교육과정 기간 중 마켓 및 옥션 진행
- 교사 연수 및 강연 진행
- 대학수학능력시험 당일 시험 본부로 이용 예정

③ 공간 활용 사진



[그림 129] 한솔지혜마루(도서관) 전경



까치놀마켓



학생 자치 활동



창의융합의 날



교사 연수



방과후 자기주도학습
[그림 130] 한솔지혜마루 활용

(3) 교육 및 학습형

2021년 조성 | □□교육청 미쁨고등학교 공립 공학
주제: 모두를 위한 힐링도서관!

» 공간 이름: 도서관

» 공간 종류: 도서실·복합문화공간


① 공간 소개

- 독서 및 자기주도학습을 할 수 있는 긴 테이블 배치
- 가운데 서가를 중심으로 양옆에 수업이 가능한 공간과 학생 휴게공간 조성
- 수업 공간에는 30명 정도 학생 수용, 파티션이 설치되어 있어 서가와 공간 분리 가능
- 도서관 앞 복도에 긴 의자를 배치하여 휴게공간 마련

② 공간 활용 사례

- 인문 독서 관련 프로그램 운영 공간
- 1, 2, 3학년 학생용 교과서 전시 및 보관
- 도서관 활용 수업 및 각종 행사(동아리 활동, 전시, 회의 등) 공간 지원

③ 공간 활용 사진

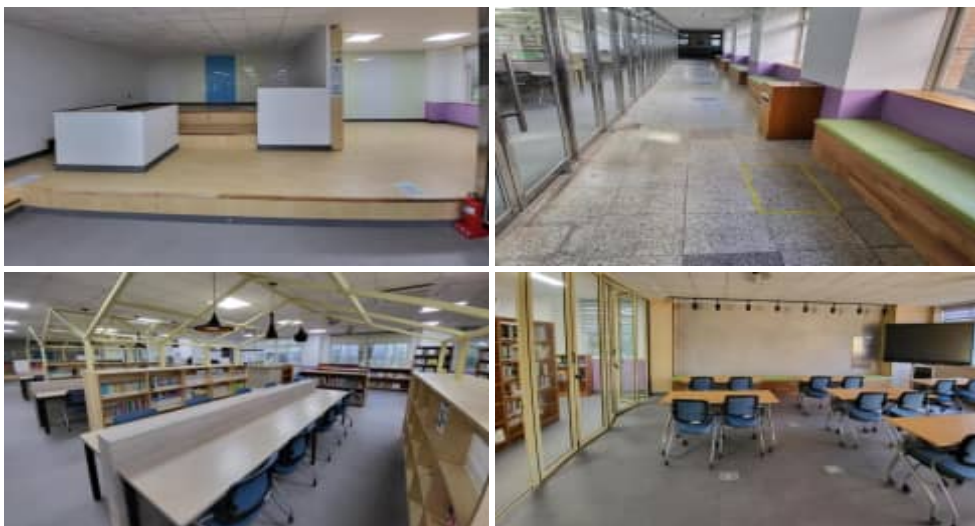

[그림 131] 힐링도서관 전경



[그림 132] 힐링도서관 활용

2022년 조성 | ○○교육청 띠앗고등학교 공립 남고
주제: 지혜의 바다

» 공간 이름: 지혜서가

» 공간 종류: 도서관

① 공간 소개

- 복합문화공간의 도서관
- 자기주도 학습이 가능한 긴 테이블 배치

② 공간 활용 사례

- 바테이블에서 자기 주도학습
- 각종 도서관 행사
- 도서관 활용 수업

③ 공간 활용 사진



[그림 133] 지혜서가 활용

2023년 조성 | ◆◆교육청 달보드레고등학교 공립 공학

주제: 열린 도서관, 아카데미아

» 공간 이름: 아카데미아

» 공간 종류: 도서관


① 공간 소개

- 교실 3칸을 터서 확보한 공간으로 교무실과 가깝고 여학생 교실과 인접하고 있으며 식당과 마주하고 있어 학생들의 접근성이 가장 좋은 공간임.
- 한쪽 벽면에 도서가 배치되어 있고 상시 문이 열려 있어 학생들이 쉽게 책을 접할 수 있도록 하였으며 도서를 활용한 교과 수업이 가능하도록 함.
- 자기주도 학습이 가능한 1인용 테이블을 배치하여 집중도를 높임. 창문 앞, 가운데, 복도 쪽 벽면의 가벽 테이블 등 3종류의 1인 테이블을 구성하여 개인의 학습 습관에 맞는 환경을 선택할 수 있도록 함.
- 아카데미아 앞의 복도에는 미술 작품과 명언을 배치하여 아카데미아로 오고 가는 동선 속에서 문학과 예술을 접할 수 있도록 조성
- 벽면의 주황색이 산뜻하면서도 따뜻한 분위기를 연출하여 편안함 속에서 학습이 이루어지도록 인테리어함.

② 공간 활용 사례

- 독서와 연계한 수업 활동
- 스터디 카페형의 세련된 인테리어로 자발적인 방과후 자기주도학습 참여
- 복도에 투명 유리 게시판을 설치하여 학생회의 각종 활동 결과를 공유
- 복도 이동 시 복도 창 쪽에 설치된 붙박이 의자에 앉아 미술 작품, 명언, 시 감상

③ 공간 활용 사진

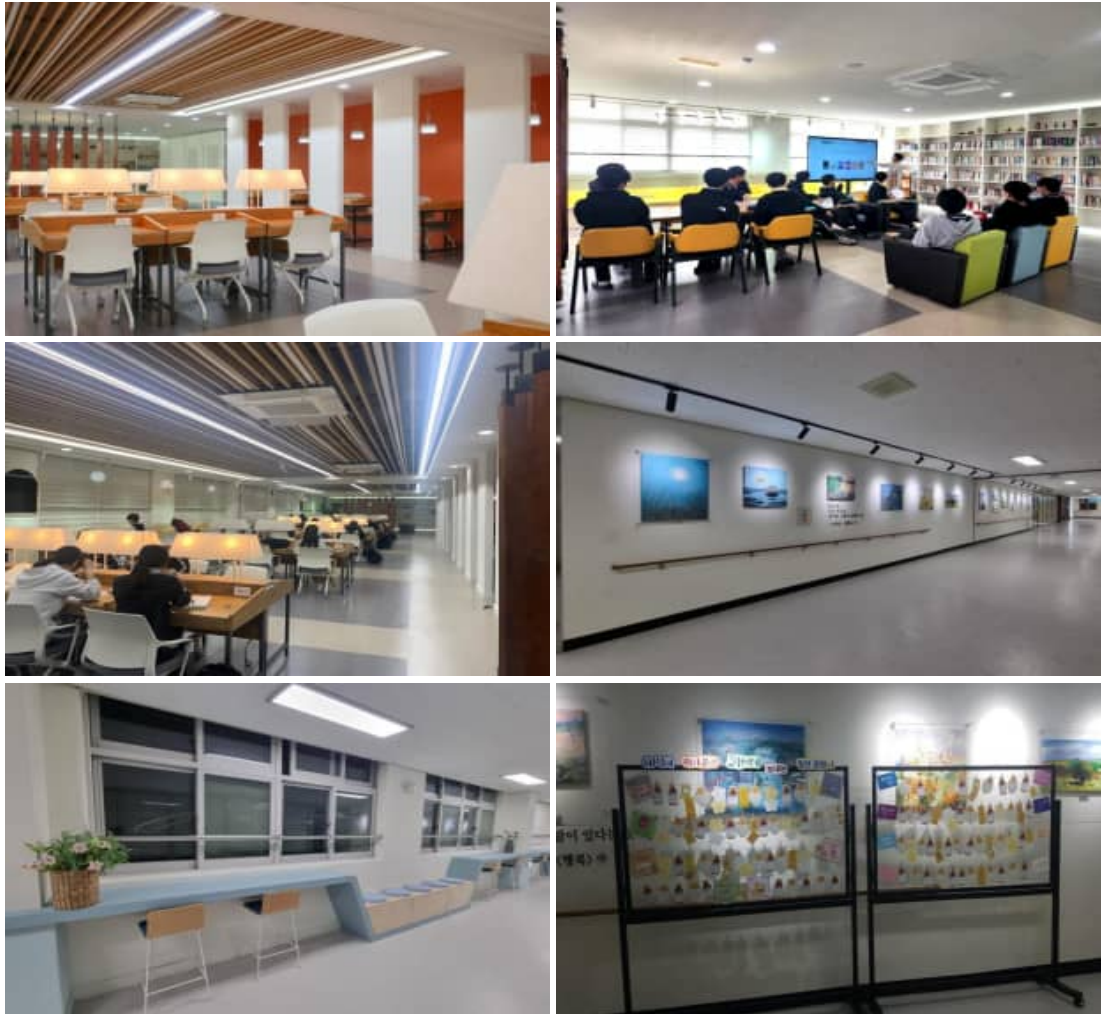

[그림 134] 아카데미 활용

2021년 조성 | ○○교육청 양증고등학교 사립 여고

주제: 책과 쉼이 있는 공간 북카페

» 공간 이름: 아단208

» 공간 종류: 도서실

① 공간 소개

- 기존의 도서 활동 수업이 가능했던 복합공간으로서의 도서관에서 학생들이 자유롭게 앉아 책을 읽거나 공부를 할 수 있는 공간으로 바꿈
- 도서 활용 수업은 한쪽 벽을 허물어 접근성이 가장 높은 일반교실(아단201)에서 운영
- 카페와 같이 자유롭게 탁자와 의자를 배치하고 콘센트를 설치해 스마트기기를 활용해 개인 시간을 보내거나 자기주도학습을 할 수 있음
- 북카페를 둘러싸고 있는 벽면이 외부를 볼 수 있는 유리 벽을 제외하고 책장으로 둘러싸여 어디에서나 책에 접근할 수 있는 구조를 만들
- 일반 교실 2칸 이상의 공간으로 책장을 파티션으로 활용해 자연스럽게 구획을 나눔

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습 공간
- 1학년 공강 독서 프로그램 운영, 3학년 공강 시간 학생 자율활동
- 16+1 수업량 유연화 주제 융합수업 공간
- 교사 학습공동체

③ 공간 활용 사진



오전 자기주도학습(조회 시간 이전)



오전 자기주도학습(조회 시간 이전)



수업량 유연화-주제융합프로젝트



교육과정 박람회



쉼



교사 학습공동체

[그림 135] 아단208 북카페 활용

라 공용 공간

1) 복도·로비

2019년 조성 | ♀♂교육청 해맑고등학교 공립 공학

주제: 열린 학습 환경을 갖춘 홈베이스형 복도

» 공간 이름: 연결 복도

» 공간 종류: 복도

① 공간 소개

- 2~5층에 전관과 후관을 연결하는 폭이 넓은 복도에 다양한 휴게공간 마련
- 창문 쪽에는 스탠드형 책상을 맞춤 제작하고 반대쪽에는 스터디 카페와 상담 공간 배치
- 연결 복도 양 끝에 문이 없는 개방형 학습실 설치
- 개방형 학습실 중 큰 학습실에는 전자칠판, 카페형 소파, 원형 테이블을 배치하고 작은 학습실에는 자기 주도적 학습을 할 수 있는 화이트보드, 사각 테이블, 의자 배치
- 스터디 카페의 한쪽 벽면에는 맞춤형 책장을 제작하고 맞은 편에는 게시판 설치
- 스터디 카페와 교무실 사이에 테이블과 의자가 있는 휴게공간이 있으며, 문을 추가로 설치하여 상담 공간으로 활용

② 공간 활용 사례

- 행사 부스 공간으로 활용(축제 체험 부스, 과학과 행사, 학년별 특색활동 등)
- 자료 전시 공간으로 활용(연구학교 보고회 자료, 수업산출물, 교육과정 박람회용 배너 자료, 학생 선택 교육과정 교과서, 대학별 입시 자료 등 전시)
- 동아리 활동(여러 명이 산출물을 제작할 때 활용)
- 포레 학습 공간으로 활용
- 각종 연수 활동(교과별 학습공동체 연수, 심폐소생술 연수 등)
- 스터디 카페형의 테이블 배치로 공강 및 방과후 자기주도학습

③ 공간 활용 사진



교육과정 박람회 자료 전시1



교육과정 박람회 자료 전시2



심폐소생술 연수



교과별 학습공동체 연수



연구학교 자료 전시(스팀교육)



연구학교 자료 전시(수업산출물)



축제 동아리 작품 전시



축제 수업 산출물 전시



학년 특색활동(할로윈 행사)



학년 특색활동(학급소개)



자율활동 자료 전시

[그림 136] 홈베이스형 복도 활용



또래 학습 활동

2019년 조성 | ●●교육청 달무리고등학교 사립 공학
주제: 이동동선의 효율화! 능동장 복도

» 공간 이름: 능동장

» 공간 종류: 복도

① 공간 소개

- 이동동선의 효율성 확보를 위한 성과 공유 갤러리 운영
- 학교 구성원 수요에 따라 다변화하는 미니 부스(콘서트) 공간
- 기숙형 고등학교의 특색을 반영한 목적에 따라 변화 가능한 공간

② 공간 활용 사례

- 학생 휴게 및 온라인 수업 수강 장소
- 플립드 러닝 수업의 완성도 제고를 위한 영상 시청 공간
- 수행평가 성과 전시회 활용을 통한 갤러리 전시 공간 활용

③ 공간 활용 사진



온라인 학습 공간 활용 사례(비대면 면접 준비)



미니부스(플립드러닝 수업)
[그림 137] 능동장 복도 활용



복도의 쉼터 공간 활용 사례(학생 휴게)

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학

주제: 모두의 힐링 공간

» 공간 이름: 위로카페

» 공간 종류: 복도

① 공간 소개

- 위로카페는 2층 복도 한가운데 학생들의 접근도 높은 공간에 휴게시설을 마련함.

② 공간 활용 사례

- 위로카페는 휴게공간으로 매주 수요일 상담선생님 주관으로 다과행사를 진행함.

③ 공간 활용 사진



[그림 138] 위로카페

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학

주제: 모두의 힐링 공간

» 공간 이름: 청심홀

» 공간 종류: 로비

① 공간 소개

- 현관 청심홀은 본관 입구의 현관에 곡선형 층계를 만들어 전시나 공연을 할 수 있도록 설계

② 공간 활용 사례

- 현관 청심홀은 학생·학부모 작품 전시 및 동아리 공연 등의 행사로 다양하게 활용

③ 공간 활용 사진



현관을 활용한 전시



현관을 활용한 성탄절 축하 공연



현관을 활용한 음악 행사



현관을 활용한 전시

[그림 139] 청심홀 로비 활용

2023년 조성 | □□교육청 윤슬고등학교 공립 공학
주제: 꿈·끼 펼침 스페이스

» 공간 이름: 북카페

» 공간 종류: 복도

① 공간 소개

- 폭이 넓은 편 복도 한쪽 공간에 부스형 소파와 책상 설치
- 풍경이 보이는 창 쪽에 카페형 일자 테이블과 의자 설치

② 공간 활용 사례

- 휴게공간 및 자기주도학습 공간으로 활용
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 소규모 프로젝트 학습, 모둠 토론 공간으로 활용

③ 공간 활용 사진



학년별 복도 모둠 학습 공간



개방형 북카페
[그림 140] 북카페 활용



또래 멘토링

2023년 조성 | ▶▶ 교육청 새빛고등학교 공립 공학
주제: 전교생의 아침 첫걸음은 여기서

» 공간 이름: 중앙 현관

» 공간 종류: 로비

① 공간 소개

- 화이트 톤의 밝은 바닥타일과 조명을 설치하여 넓고 환한 공간으로 구성
- 대형 모니터 4대를 설치
- 한 칸에 소파와 테이블을 구비하여 휴게공간 마련

② 공간 활용 사례

- 대형 모니터를 통해 학교 행사 및 공지 사항 안내
- 전교생 등교 출석 체크
- 학생 휴게공간
- 동아리 활동 우수 결과물 전시

③ 공간 활용 사진



학교 행사 안내



휴게공간



동아리 우수 결과물 전시



전교생 등교 체크

[그림 141] 중앙 현관 활용

2022~23년 조성 | △△교육청 토랑토랑고등학교 공립 공학
주제: 학교 애착 형성을 위한 환경 조성

» 공간 이름: 아트 월

» 공간 종류: 복도

① 공간 소개

- 아트 월(Art Wall)을 조성하여 분기별로 교체되는 예술작품 감상 공간 구축

② 공간 활용 사례

- 휴게공간

③ 공간 활용 사진



[그림 142] 학생 예술 감수성 함양 프로젝트 : Art wall(토랑토랑의 사계(四季))

2) 홈베이스

2021년 조성 | □□교육청 미쁨고등학교 공립 공학
주제: 복합 문화&휴식 공간!

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 폭이 넓은 편복도 한쪽 공간에 스터디 카페형 책상 설치
- 2, 3, 4, 5층마다 홈베이스가 조성되어 있어 학년별 공간 활용
- 학습 공간과 휴게공간을 동시에 이용할 수 있도록 배치

② 공간 활용 사례

- 쉬는 시간, 공강 시간 학생 휴게공간
- 학생 사물함 배치, 방과후 자기 주도적 학습 공간
- 각종 행사·전시 공간 지원

③ 공간 활용 사진



[그림 143] 홈베이스 활용

2021년 조성 | ◆◆교육청 햇살고등학교 공립 여고

주제: **쉽과 배움이 공존하는 공간 페스티벌 클래스, 예다움터, 다운터, 도담터, 헤움터**

» **공간 이름:** 페스티벌 클래스, 예다움터, 다운터, 도담터, 헤움터

» **공간 종류:** 홈베이스

① 공간 소개

가) 페스티벌 클래스

- 가운데 복도를 기준을 오른쪽은 홈베이스, 왼쪽은 음악실로 구성
- 홈베이스는 복층구조로 위층은 다락방, 아래층은 6개의 쉼터로 구성
- 음악실은 앞쪽은 수업 공간, 뒤쪽은 공연 공간, 가운데는 이동식 책걸상 설치
- 홈베이스와 음악실은 폴딩도어 설치로 구분

나) 예다움터

- 2학년 홈베이스로 편안한 소파와 의자, 파라솔 책상, 피아노 설치
- 책꽂이로 복도와 공간 구분, 철제 가림막 설치로 실내 수도 공간과 구분

다) 다운터

- 3학년 홈베이스로 계단형 학습·쉽 공간, 벽면과 창가 쪽 높은 책상, 가운데 소파 설치
- 높은 책걸상 위에 펜던트 조명 설치

라) 도담터

- 1·2학년 공용 홈베이스로 학생들이 목공 수업으로 직접 만든 나무 책상과 의자 설치
- 벽면은 나무색 텀바 보드, 책상 위에 다운 라이트 조명 설치
- 나무 루바로 복도와 공간 구분

마) 헤움터

- 전 학년 공용 홈베이스로 편안한 소파와 의자, 회전형 서가 설치
- 벽면에 흰색 타공판과 레일식 펜던트 조명 설치
- 학생들이 목공 수업을 통해 직접 제작한 책꽂이 설치

② 공간 활용 사례

- 페스티벌 클래스: 휴게, 동아리 활동, 수업, 공연, 자기 주도적 학습
- 다운터: 자기 주도적 학습, 휴게
- 예다움터, 도담터: 휴게, 자기 주도적 학습, 멘토링 학습
- 헤움터: 북카페, 휴게, 자기 주도적 학습, 멘토링

③ 공간 활용 사진



[그림 144] 페스티벌 클래스(구조관)



[그림 145] 헤움터(창의관)



[그림 146] 예다움터(지성관)·다운터(창의관)·도담터(창의관)

2021년 조성 | △△교육청 동살고등학교 사립 여고
주제: 다양성이 아름다움으로 승화하는 무지개 홈베이스

» 공간 이름: 무지개 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 이동수업을 하는 2학년 전체 학생들의 사물함을 한 곳으로 이동 및 보관
- 공간의 문은 아치형으로 설계, 학급별로 사물함의 색을 달리하여 쉽게 식별토록 함
- 학급별 아치 기둥을 무지개색으로 구분하여 전체적인 조화와 심미적인 기능 부여
- 홈베이스 맞은편에 있는 하늘공원(옥외공간)과 연계하여 학생들에게 휴식 제공
- 하늘공원은 텃밭이 있으며 바로 옆에 시민 공원이 있어 맑은 공기와 나무 뷰 제공

② 공간 활용 사례

- 2학년 사물함 보관 공간
- 사물함 사용 시 맞은편의 옥외공간에서 간단한 산보 및 휴식
- 그림 액자를 벽면에 부착하여 학생들의 정서 순화

③ 공간 활용 사진



[그림 147] 무지개 홈베이스

2022년 조성 | ○○교육청 띠앗고등학교 공립 남고

주제: 모두의 터전

» 공간 이름: 가온터전, 라온터전, 이든터전

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 홈베이스 공간 명: 학생 당선작 - 라온(1)·가온(2)·이든(3) 터전
- 복도 한쪽 공간에 기다란 나무 의자 설치(콘센트 함께 설치)
- 1인용, 4인용, 6인용 등 다양한 테이블 설치(3곳 모두)
- 창문 쪽 바 테이블 설치(3곳 모두)
- 기둥을 둘러싼 너른 소파 공간 (콘센트 함께 설치)
- 학년별 특색있는 공간으로
- 1학년 홈베이스에 계단식 공간을 만들어 발표나 개인 공부가 가능한 1인용 탁자 설치
- 2학년 홈베이스 대청마루처럼 넓은 휴게공간과 스터디 공간
- 3학년 홈베이스 1인용 공부 공간과 다인용 스터디 공간
- 홈베이스 공간에 사물함을 두지 않고, 각 교실 복도에 사물함 설치
- 홈베이스 공간 출입구 쪽 DID 게시로 각종 행사 안내 및 퀴즈 게시
- 본관과 후관을 잇는 복도 공간에 홈베이스 위치하여 공간 사용률 높음

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 교내 토크 콘서트
- 대학 진학 박람회
- 선택과목 박람회
- 학년 별 각종 행사
- 동아리 발표회
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 스터디 공간

③ 공간 활용 사진



[그림 148] 가온터전, 라온터전, 이든터전 활용

2022년 조성 | ○○교육청 하늬고등학교 공립 여고
주제: 학생들이 찾아오는 휴식 공간 홈베이스

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 벽면으로 2개 학급 사물함 설치
- 가운데 휴식 공간 배치
- 전자칠판 및 테이블 비치

② 공간 활용 사례

- 학생 휴게공간으로 활용
- 소규모 수업 공간으로 활용
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 야간 온라인 공동교육과정 학생 수업 공간으로 활용
- 탈의실로 활용

③ 공간 활용 사진



학생 휴식



소인수 수업



탈의 부스



온라인 공동교육과정 수업 참여

[그림 149] 홈베이스 활용

2023년 조성 | ●●교육청 꽃내음고등학교 공립 여고
주제: 깊은 생각과 창의적 발견을 위한 인사이트 공간

» 공간 이름: 심마루

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 2, 3학년 홈베이스는 교실 1.5실 크기, 1학년은 1실 크기
- 복도를 사이에 두고 수업 공간과 홈베이스 영역을 완전히 분리
- 선생님들과 면담이나 상담을 할 수 있는 작은 부스 설치
- 홈베이스는 아이들의 사용에 따라 달라지는 공간이기 때문에 다양한 활동을 할 수 있도록 가변성을 고려함.
- 홈베이스 양쪽 끝에는 자습 부스와 좌식 공간을 마련하고 가운데는 이동이 가능한 가구들을 배치하여 필요한 경우에는 공간을 비우거나 채울 수 있도록 고려함.
- 2학년 홈베이스는 단차로 공간의 성격을 분리하고 휴식을 취하는 좌식 공간으로 학생들이 쉽게 볼 수 있는 위치에 게시판 배치
- 벤치 형태의 휴식 공간으로 아이들은 여기에서 휴식과 친목, 꿈을 함께 그리는 공간
- 2학년 홈베이스는 가운데는 이동이 가능한 가구들을 배치하여 필요한 경우에는 공간을 비우거나 채울 수 있도록 하였음.
- 3학년 홈베이스는 기대거나 누워서 이야기할 수 있도록 좌식 공간 비율을 높임.

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 멘토링 학습
- 동아리 활동 공간
- 면접 준비
- 학생 상담과 학부모 상담
- 교과 협의회
- 과목설명회

③ 공간 활용 사진



[그림 150] 심마루 활용

2023년 조성 | ○○교육청 안다미로고등학교 공립 여고

주제: **쉽과 여유가 있는 나눔터**

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 카페형 공간 조성 및 부스 공간, 대형 테이블, 계단식 휴식 공간 등을 설치
- 권장 도서 비치로 자율 대출 운영
- 학생의 휴식, 모둠활동, 자기주도학습, 자율활동 등 다기능 복합문화공간으로 활용

② 공간 활용 사례

- 학생 휴게공간 및 방과후 자기주도학습
- 꿈 나눔 활동과 같은 소규모 그룹 활동
- 교내 소규모 행사장으로 활용

③ 공간 활용 사진



부스 공간



대형 테이블 및 계단식 공간



교육과정 박람회



독서토론 활동

[그림 151] 홈베이스 활용

2023년 조성 | ○○교육청 아스라이고등학교 사립 여고
주제: 휴게공간, 홈베이스

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 벽면을 활용하여 게시글을 편하게 부착할 수 있는 공간 확보
- 학생들이 자유롭게 먹고, 마실 수 있는 공간 확보
- 자유로운 토론이 가능하고, 한 반 학생이 모여서 쉴 수 있는 벽면형 계단 의자 구축

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 교사와 학생의 소규모 그룹 만남 가능

③ 공간 활용 사진



[그림 152] 교육과정 박람회 진행, 교사와 학생의 소규모 미팅 가능



공간 전경



벽면에 게시글 부착 용이, 계단형 의자 설치



이동이 용이한 테이블, 의자 배치



공간 확대가 가능한 접이식 문 설치

[그림 153] 홈베이스 활용

2023년 조성 | ♀♂교육청 꼬리별고등학교 공립 공학

주제: 모두의 무대

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 2층 홈베이스에 무대, 스탠드 관람석, 포켓 공간을 구성하여 학생 소통의 장 조성
- 각 공간은 아치형 통로로 이어지고 복도에서 어느 곳이든 접근할 수 있어 1학년 학생들의 소중한 쉼 공간으로 활용
- 복도와의 경계에는 쿠션형 벤치를 만들어 담소를 나눌 수 있도록 함

② 공간 활용 사례

- 무대가 있는 넓은 공간은 타공판 벽으로 축제나 행사 시 전시물이나 사진을 게시
- 스탠드 관람석은 소규모 역할극(연극)이 가능하며, 무대에서 실시간 촬영으로 영상을 띄우거나, 공강 시간에 뮤직비디오를 틀어 학생들이 모여 이야기를 할 수 있음
- 포켓 공간은 학생들이 가장 좋아하는 공간 중 하나로 독립성을 부여함
- 무대는 학생들의 숨겨진 끼를 발산하는 중요한 창구로 밴드부, 댄스 동아리 등이 자신들의 역량을 보여주는 곳으로 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 154] 홈베이스 내 학생 버스킹 무대와 스탠드



[그림 155] 포켓 공간

2022~23년 조성 | △△교육청 토랑토랑고등학교 공립 공학

주제: 학교 애착 형성을 위한 환경 조성

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 틈새 공간을 이용한 학생 휴식 공간 조성
- 복도, 연결 통로 등의 개방 공간을 활용하였으며 난방기 추가 설치 등 학생 휴식환경 조성

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 교사-학생 상담 공간으로 활용
- 사제동행 독서 프로그램 공간으로 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 156] 학생 휴식 및 애착 공간(홈베이스)

2023년 조성 | ○○교육청 까치놀고등학교 사립 남고

주제: 휴식과 자기주도학습의 메카 **홈베이스**

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 학년별 스터디룸을 3개씩 마련하여 모둠활동 및 집중적 자기주도학습 가능
- 넓은 공용 공간에는 소파와 테이블 의자를 마련하여 휴식 가능
- 스터디 카페용 긴 테이블과 키 큰 의자를 마련하여 자기주도학습 가능

② 공간 활용 사례

- 휴게공간
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 모둠 수업 및 모둠 학습 공간
- 학년별 마켓 운영
- 동아리 활동 공간

③ 공간 활용 사진



자기주도 학습 및 휴식 공간



학년별 스터디룸

[그림 157] 홈베이스 및 스터디룸 전경



스터디룸 모둠학습



동아리 활동



모둠 수업



학년 행사 진행

[그림 158] 홈베이스 활용

2023년 조성 | ●●교육청 너나들이고등학교 공립 공학
주제: 고교학점제 정착을 위한 휴식과 학습의 홈베이스

» 공간 이름: 홈베이스

» 공간 종류: 홈베이스

① 공간 소개

- 1~3학년의 학년별 홈베이스 구축
- 1학년은 담소를 나누기 위한 분위기로 조성
- 2학년은 휴식과 개방된 공간으로 조성
- 3학년은 다수의 스터디룸으로 구성


② 공간 활용 사례

- 이동 수업간 휴식을 위한 공간
- 공강 및 유휴시간을 이용한 담소 및 학습의 공간

③ 공간 활용 사진



1학년 홈베이스 조성



2학년 홈베이스 조성



3학년 홈베이스 조성

[그림 159] 학년별 홈베이스

2023년 조성 | ●●교육청 또바기고등학교 사립 여고

주제: 홈베이스(바다, 땅, 하늘)

» 공간 이름: 바다, 땅, 하늘

» 공간 종류: 홈베이스


① 공간 소개

- 1~3학년별 테마를 갖춘 학년 홈베이스
- 바다(1학년)에서 땅(2학년)으로 올라와 하늘(3학년)에 올라 별이 되자는 테마로 작명
- 개방적이고 자연 친화적인 인테리어 디자인으로 학생 만족도 높음

② 공간 활용 사례

- 자기주도학습, 소그룹 토의 활동
- 포레 멘토링 학습 공간으로 활용
- 휴식 및 친목을 도모할 수 있는 공간

③ 공간 활용 사진

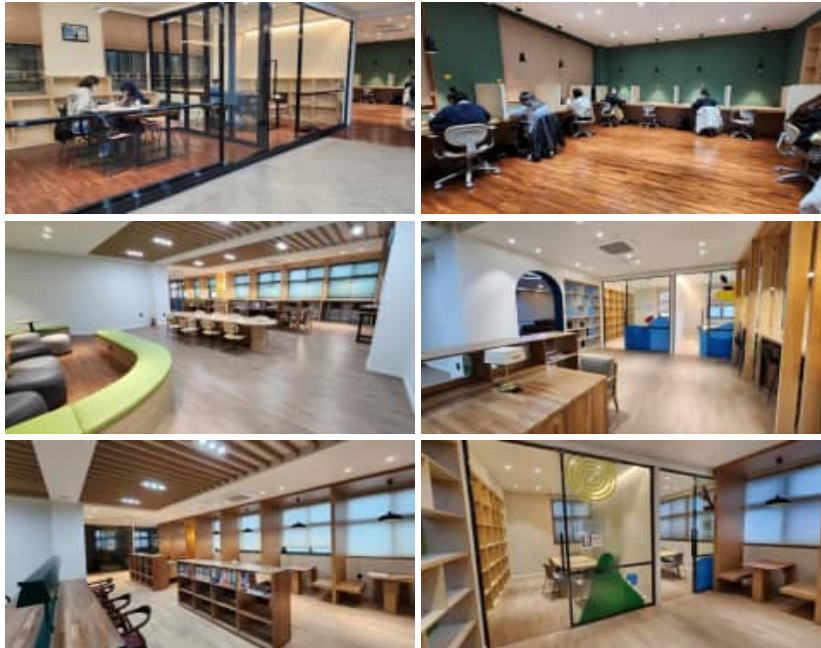

[그림 160] 바다, 땅, 하늘 홈베이스

3) 자율활동·휴식 공간

2022년 조성 | ■■■교육청 도란도란고등학교 공립 공학

주제: 학습과 소통의 허브 '도란실록'

» 공간 이름: 도란실록

» 공간 종류: 자율활동공간

① 공간 소개

- 조용하고 집중할 수 있는 개인 학습용 독서실용 테이블과 의자 배치
- 그룹 활동을 위한 테이블 배치
- 소규모 상담이나 모듈별 활동이 가능한 별도의 공간 마련

② 공간 활용 사례

- 개인학습: 학생이 자율적으로 학습할 수 있는 공간으로 각자 학습 스타일에 맞추어 조용한 환경에서 집중할 수 있도록 지원
- 그룹스터디와 협력적 학습을 통해 공유하고 문제를 해결할 수 있는 교육 활동 가능
- 소규모의 외부 강사 초청이나 교사가 진행하는 특강 개최 및 학생들이 직접 참여하고 질문할 기회 제공 등

③ 공간 활용 사진



진로학업 설계지도 (교원 스터디)



교육활동 평가회
[그림 161] 도란실록 활용



SDGs English camp

2023년 조성 | ●●교육청 송골송골고등학교 공립 여고
주제: 누구나 만나고 생활하는 산들마루 Cafe

» 공간 이름: 산들마루 Cafe

» 공간 종류: 자율활동공간·휴식 공간

① 공간 소개

- 학생과 교사 모두가 쉴 수 있는 공간으로 구축
- 학생들과 교사들이 자유롭게 쉬고 담소를 나눌 수 있도록 구현

② 공간 활용 사례

- 학생들과 교사들이 자유롭게 쉬는 공간으로 활용
- 학생들의 다양한 동아리 활동에 이용
- 교사들의 디배움 공동체 활동에 이용
- 교사와 학생 간 교육 활동에도 적극적으로 활용
- 학부모 휴게공간이나 외부 손님 접대 공간으로도 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 162] 산들마루 Cafe 활용

2023년 조성 | ○○교육청 포로니고등학교 사립 공학
주제: **침과 교류, 아이디어가 넘치는 러닝허브 하루**

» **공간 이름:** 러닝허브 하루

» **공간 종류:** 자율활동·휴식 공간

① 공간 소개

- 하루는 가장 오래된 건물 1층의 교실 한 칸 반을 리모델링한 공간으로, 과거 학생 생활지원부와 상담실로 사용되며 다소 무거운 분위기를 풍기던 공간을 현대적이고 개방적인 학습 및 소통의 중심지로 탈바꿈시켰습니다.

가) 공간 구성

- 반 칸: 대형 주방가구가 설치된 운영진 자리로, 캠페인 준비나 행사를 지원하며, 전동 블라인드를 내려 필요에 따라 독립적으로 활용 가능.
- 한 칸: 폴딩도어를 활용한 개방형 활동 공간으로, 다양한 활동과 휴식이 이루어지는 다목적 공간.

나) 특징: 외벽을 철거하고 폴딩도어를 설치해 자연 채광과 개방감을 극대화했으며, 학교 내 여러 건물 간 동선을 줄이는 연결 허브 역할을 수행. 트렌디한 카페처럼 꾸며진 디자인은 학생과 교직원 모두에게 편안함과 즐거움을 제공.

② 공간 활용 사례

- 학생들의 사랑방: 쉬는 시간에는 학생들이 자연스럽게 모여 대화하고, 점심시간에는 간단한 소모임이 이루어지며, 방과 후에는 공부와 휴식을 결합할 수 있는 공간으로 애용됩니다. 일찍 등교하는 학생들이 편히 머물며 하루를 준비할 수 있는 장소로도 활용됩니다.
- 교직원과 학부모의 공간: 공강 시간 동안 교사들이 머물며 차를 마시거나 업무를 정리하는 휴게공간으로 활용됩니다. 학부모와의 상담이나 설명회, 모임 장소로도 적합하여 교사와 학부모의 소통을 원활히 합니다.
- 다양한 프로그램과 행사 진행: 연구수업, 회의, 학생회 발표, 각종 캠페인 활동 등 학교 주요 행사가 진행되는 공간으로, 학생과 교직원이 협력하여 창의적인 활동을 전개하는 거점 역할을 합니다.

③ 공간 활용 사진



[그림 163] 러닝허브 하루 활용

2023년 조성 | ○○교육청 포로니고등학교 사립 공학

주제: **침과 교류, 아이디어가 넘치는 도란도란**

» **공간 이름:** 도란도란

» **공간 종류:** 자율활동·휴식 공간

① 공간 소개

- 도란도란은 교실 두 칸을 리모델링해, 학생들이 편안함을 느끼고 창의적인 활동에 몰입할 수 있는 다목적 학습 및 휴식 공간으로 재탄생했습니다.

가) 공간 구성

- 한 칸: 카펫, 스탠드 조명, 빈백을 배치해 신발을 벗고 편안히 누워 쉴 수 있는 공간으로 조성. 미디어파사드를 위한 3대의 프로젝터를 설치해 감각적이고 몰입감 있는 시청각 경험 제공.
- 한 칸: 대형 테이블과 주방가구를 배치해 협업과 소통이 가능한 공간. 방음 부스 2개를 설치해 입시 상담, 개별 면담, 발표 연습 등 집중이 필요한 활동 지원.

나) 특징: 편안하고 아늑한 분위기로 꾸며져 학생들의 스트레스를 해소하고 창의적 사고를 자극. 미디어파사드는 학생들이 직접 콘텐츠를 제작하거나 체험할 수 있는 매력적인 요소로 작용.

② 공간 활용 사례

- 휴식과 여가 활동: 학생들이 신발을 벗고 빈백에 누워 영상 콘텐츠를 감상하거나 친구들과 이야기를 나누며 에너지를 재충전하는 공간으로 활용. 미디어파사드를 통해 학생들이 자기 작품을 발표하거나, 다채로운 미디어를 체험할 기회 제공.
- 학습과 소통의 장: 큰 테이블에서는 학생들이 팀 프로젝트를 수행하거나 교직원이 워크숍 진행, 방음 부스는 집중이 필요한 학습과 상담을 위한 최적의 장소로 활용.
- 특별 활동과 프로그램: 학교 내 다양한 행사와 캠페인 활동이 열리는 중심지로, 학생들의 발표, 공연, 창의적 모임이 활발히 이루어지는 공간. 입시를 준비하는 학생들을 위한 심층 상담, 발표 연습 등 맞춤형 활동 지원.
- 단순한 공간을 넘어 학생과 교직원의 학습, 휴식, 창의적 활동을 모두 지원하며, 학교 생활의 질을 높이는 핵심 허브로 자리 잡고 있습니다.

③ 공간 활용 사진



[그림 164] 도란도란 활용

2023년 조성 | ◆◆교육청 달보드레고등학교 공립 공학

주제: **쉽터이자 학습터**

» **공간 이름:** 휴스테이션

» **공간 종류:** 자율활동공간·휴식 공간

① 공간 소개

- 교무실 바로 옆 로비에 유리 벽을 설치하여 조성된 공간으로 냉난방 시설이 되어 있어 사계절 모두 사용 가능
- 밝은 색 가죽으로 포인트를 준 벽 아래 붙박이 소파를 설치하여 편하게 수다를 떨며 친구들과 휴식할 수 있도록 조성
- 다른 한쪽 벽에는 부스형 나무 가벽을 설치하여 아늑한 분위기에서 그룹별 스터디가 가능하도록 조성
- 블랙 보드를 설치하여 문제 풀이를 공유하며 지식 나눔이 가능하도록 조성
- 3학년의 동아리 활동실로도 활용

② 공간 활용 사례

- 휴게공간(수다, 낮잠, 음악감상 등)
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 3학년 동아리 활동
- 특별 이벤트 장소(헬리원, 크리스마스 등)

③ 공간 활용 사진



[그림 165] 휴스테이션 활용

2023년 조성 | ◆◆교육청 달보드레고등학교 공립 공학
주제: **쉽터이자 학습터**

» 공간 이름: G라운지

» 공간 종류: 휴식 공간

① 공간 소개

- 여학생 교실 바로 앞 여유 공간에 개방형으로 조성된 휴게공간
- 교실 바로 앞에 있어 학생들의 접근성이 좋고 빈백, 방석, 쿠션들을 배치하여 언제든지 편안한 자세로 쉴 수 있도록 조성
- 예쁜 조명 등을 설치한 나무 구조물과 인형들로 여학생들의 감성을 터치하고 다양한 식물을 배치하여 공부로 인한 스트레스를 잠시나마 잊을 수 있도록 인테리어함.

② 공간 활용 사례

- 휴게공간(수다, 낮잠, 음악감상 등)



[그림 166] G라운지 활용

2023년 조성 | ○○교육청 너울가지고등학교 사립 여고
주제: 학생 주도적 활동의 중심공간 '복합문화공간'

» 공간 이름: 복합문화공간

» 공간 종류: 자율활동·휴식 공간

① 공간 소개

- 휴식 및 소규모 프로젝트 활동이 가능한 2.5실 규모의 공용 공간
- 개방형 공간과 소규모 모임 공간이 복합된 공간
- 일부 공간을 소규모 강의실로 활용할 수 있도록 조성

② 공간 활용 사례

- 학생 선택형 교육과정 운영에 따른 공강 시간에 활용
- 학생 소모임 활동(동아리, 멘토-멘티)에 활용
- 수강자 20명 이하 선택형 수업에 활용

③ 공간 활용 사진



[그림 167] 복합문화공간 활용

4) 야외 공간

2021~23년 조성 | ☆☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학
주제: 모두의 힐링 공간

» 공간 이름: 아고라

» 공간 종류: 야외무대

① 공간 소개

- 아고라는 야외 공연장으로 타원형 모형의 무대와 객석으로 구성됨.

② 공간 활용 사례

- 아고라는 다양한 동아리의 공연 및 플래시미 활동 등 교내 행사에 주요하게 활용됨.

③ 공간 활용 사진



자율동아리 활동 모습



플래시미 활동모습



아고라 공연



아고라 공연

[그림 168] 아고라 야외무대 활용

2020년 조성 | ▶▶ 교육청 아름드리고등학교 사립 여고
주제: 심신의 휴식과 성찰을 위한 공간 - 명상의 숲길

» 공간 이름: 명상의 숲길

» 공간 종류: 야외 쉼터

① 공간 소개

- 다양한 나무와 식물로 둘러싸인 자연 속 경로를 활용한 산책로
- 명상 또는 야외 수업이 가능한 데크 설치
- 곳곳에 배치된 벤치를 활용한 휴식 공간 제공
- 산책로를 따라 쉽게 걷을 수 있도록 야자수 매트 설치

② 공간 활용 사례

- 학생들의 스트레스 관리 및 긍정적 정서 유지를 위한 명상 수업 및 마음 챙김 활동
- 창의적 사고를 자극하는 자연스러운 학습 공간으로 활용
- 휴식과 회복의 공간
- 멘토링 학습 공간으로 활용
- 다양한 학습 활동 후의 예술 작품 또는 과제물을 활용한 전시회 개최

③ 공간 활용 사진



[그림 169] 명상의 숲길 활용

2023년 조성 | □□교육청 윤슬고등학교 공립 공학
주제: 꿈·끼 펼침 스페이스

» 공간 이름: 한별 아프리움

» 공간 종류: 야외 공연 공간

① 공간 소개

- ‘ㄷ’자형 건물 중앙 정원에 소규모 공연이 가능한 무대 설치

② 공간 활용 사례

- 학생 참여형 공연 프로그램 기획과 실제 공연을 통해 마음 회복 지원

③ 공간 활용 사진



한별 아프리움 모습



공연 관람 모습



학생 공연 모습

[그림 170] 한별 아프리움 활용

2022년 조성 | ○○교육청 초롱초롱고등학교 공립 공학
주제: 모두의 이야기, 모두의 무대

» 공간 이름: 대강의실3

» 공간 종류: 야외 공연·전시 공간


① 공간 소개

- 1층 필로티 공간을 활용한 복합문화공간
- 학생회 주관 버스킹, 작은 음악회 등 운영 가능한 무대 및 관람석 설치
- 전시회 및 행사 활동 가능한 전시 공간으로 운영
- 공간 활용 프로그램의 기획-실행-결과 환류 등 전 과정을 학생회가 주관하여 운영
- 학생들의 자율적인 공연 활동, 교류 및 소통 가능한 공간

② 공간 활용 사례

- 학생회 주관 버스킹 프로그램
- 초롱초롱고 문화예술의 날 '난장' 프로그램 운영
- 동아리 박람회 등 전시 및 행사 활동 운영

③ 공간 활용 사진

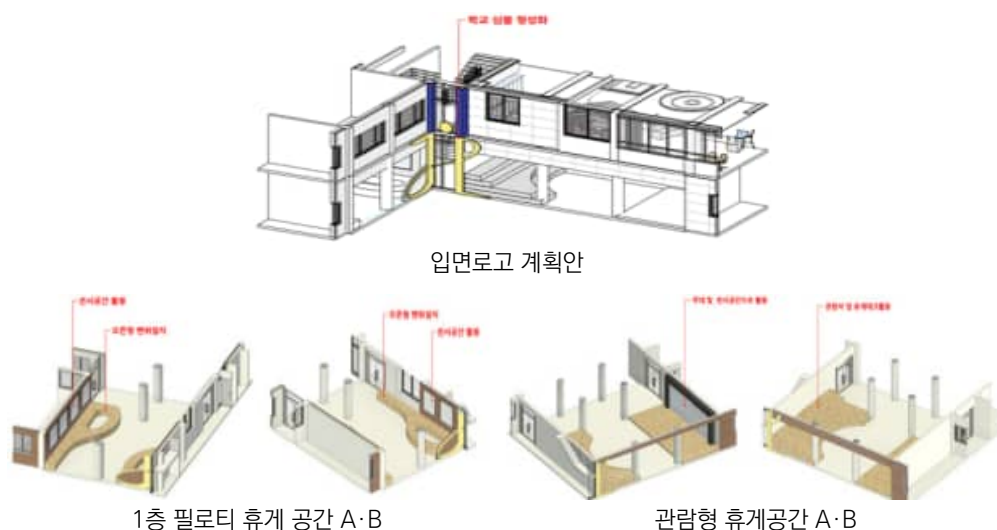

[그림 171] 필로티 공간 투시도



필로티 공간 및 학교 심볼 전경



휴게 및 전시 공간



무대 공간



관람석

[그림 172] 필로티 공간 조성 결과



동아리 박람회



버스킹



[그림 173] 필로티 공간 활용



[그림 174] 초롱초롱고 '난장' 운영

마 ▶ 기자재 활용 사례

2019년 조성 | ○○교육청 달무리고등학교 사립 공학
주제: 교실! 그 관념의 자유!

» 종류: (교실) 중앙 전자칠판, 좌우 모니터, 검색대, 벤치

① 기자재 소개

- 중앙 전자칠판 설치 및 좌우 측면 각 2개의 모니터 조성으로 중앙 화면 공유 가능
- 좌·우 측면 각각 2개의 모니터 앞에 강화 유리 부착으로 언제든지 자유롭게 판서 가능
- 교실 뒷면에 검색대 마련 및 수업 컨설팅과 수업 나눔이 자유로울 수 있도록 앞면에 벤치 조성

② 기자재 활용 사례

- 수학 교과목의 온라인화
- (전자칠판) 필요에 따라 스마트 뷰·미러링 시스템 활용으로 수업 참여
- 5대 학교 연합을 통한 비대면 ‘고교 모의 UN’ 개최

③ 기자재 활용 사진



수학 II 교과 수업



경제 부스 운영



학생 참여형 수업

[그림 175] 전자칠판, 모니터, 검색대, 벤치 활용

2021~23년 조성 | ☆☆교육청 모꼬지고등학교 공립 공학

주제: 어서와 뭐든지 소개해줄게

» 종류: (교실) 단초점 빔프로젝터, 전자칠판, (복도) 빔프로젝터, 홍보 모니터, 공기 질 측정기, 케이웨더 프로그램

① 기자재 소개

- 모든 교실마다 단초점 빔프로젝터, 전자칠판(23, 32, 음악실) 등을 설치함.
- 2층 복도 및 현관에 초대형 날씨 및 습도 온도를 알려주는 빔프로젝터를 설치함.
- 층마다 홍보용 모니터를 설치함.

② 기자재 활용 사례

- 교실 공간의 빔프로젝터는 수업 시간마다 중요하게 활용
- IOT 건강관리 프로그램 시스템 구축(실내외 공기 질 측정기)
- 케이웨더 프로그램(DID) (현재 관리의 어려움으로 활용을 중지)
- 홍보용 모니터를 활용하여 교내의 각종 행사와 알림을 손쉽게 접할 수 있도록 안내

③ 기자재 활용 사진



[그림 176] 공기 질 측정기



빔프로젝터



디스플레이

[그림 177] 케이웨더 프로그램

2020년 조성 | ▶▶ 교육청 아람드리고등학교 사립 여고

주제: 교실 내 에듀테크 수업

» 종류: (교실) 빔프로젝터, 광랜, (교사) 개인 태블릿 PC와 노트북

① 기자재 소개

- 모든 교실의 빔프로젝터 또는 전자칠판 설치
- 모든 교사 개인 태블릿 PC 또는 노트북
- 에듀테크 소프트웨어 활용을 위한 광랜 설치

② 기자재 활용 사례

- 미러링을 통한 실시간 수업 자료 공유
- 디지털 퀴즈, 방 탈출 게임 등을 활용한 학습 평가
- 교사와 학생, 학생과 학생 간의 협동을 기반으로 한 디지털 활동
- 영상, 지도 등을 활용한 시청각 자료 제공

③ 기자재 활용 사진



[그림 178] 에듀테크 수업

2021년 조성 | ◇◇교육청 꽃보라고등학교 사립 여고

주제: 학생 중심의 창의적 배움터: AR/VR로 미래를 설계하다

» 종류: (교실) AR/VR 장비

① 기자재 소개

- AR/VR 장비

② 기자재 활용 사례

- 과학: 가상 실험(물리학, 화학, 생명과학, 지구과학) 실험
- 영어: 가상의 공간에서 외국인과의 대화
- 보건: 응급처치 시뮬레이션
- 한국사: 역사적 장소를 직접 보면서 수업
- 지리: 다양한 장소를 직접 방문하면서 수업
- 음악: 다양한 악기를 연주하거나, 지휘 체험 수업
- 체육: 각종 스포츠 종목의 모범적인 자세와 모션을 즉각적으로 모방하여 학습

③ 기자재 활용 사진



[그림 179] 화학 수업



[그림 180] 교사 역량 강화 연수



[그림 181] 학술제 체험활동

2021년 조성 | □□교육청 미쁨고등학교 공립 공학
주제: 교실 UP! 수업 UP!

» 종류: (교실) 전자칠판, 물 칠판

① 기자재 소개

- 일반교실과 특별교실에 전자칠판 설치
- 전자칠판 양옆에는 일반칠판(물 칠판) 설치

② 기자재 활용 사례

- 전자펜의 화면 필기 및 터치 기능 활용하여 수업의 효과 증대
- 수업, 동아리 활동, 소규모 특강 등 각종 활동 시 전자칠판 활용
- 양옆에 있는 일반칠판을 이용하여 추가 판서 및 학급 게시물 안내 공간 지원

③ 기자재 활용 사진



[그림 182] 전자칠판 활용

2021년 조성 | ◆◆교육청 햇살고등학교 공립 여고
주제: 메타버스를 활용한 콘텐츠 제작 및 VR기기 연계 교육

» 종류: (교실) VR기기

① 기자재 소개

- 품목: VR기기 ‘ㄱ’
- 수량: 29대

② 기자재 활용 사례

- 메타버스 이해 수업
- 메타버스 친환경 미래도시 건설 및 체험(코딩 교육 및 VR기기 활용 교육)
 - 본교 1학년 정보 교과 수업 시 한 학급당 2시간 수업
 - 인근 중학교 인공지능 동아리 학생 대상 2시간 수업
- VR기기 연계 교육(정보 교과, 지리 교과, 미술 교과)
- VR존을 별도로 설치하여 공장 및 휴식 시간을 활용한 가상 세계 체험

③ 기자재 활용 사진



- 친환경 메타버스 도시 설계
 - 코딩 프로그램 활용
 - 메타버스 상의 친환경 미래도시 설계



- VR체험
 - 친환경 미래도시 VR 체험

[그림 183] VR기기 ‘ㄱ’ 활용 사례

2021년 조성 | △△교육청 동살고등학교 사립 여고
주제: 미래시대 수업을 앞당기다

» 종류: (교실) 전자칠판, 크롬북


① 기자재 소개

- 전자칠판 18대 구입
- 2022년 2학년 전체 및 3학년 절반 학급에 전자칠판 설치
- 전 교사 전자칠판 사용 연수 참가

② 기자재 활용 사례

- 본 수업 시 상시 사용
- 크롬북과 연결 사용 (전교생이 동시에 사용 가능한 크롬북 300여 대 보유)
- 디벗¹⁴⁾ 사용

③ 기자재 활용 사진

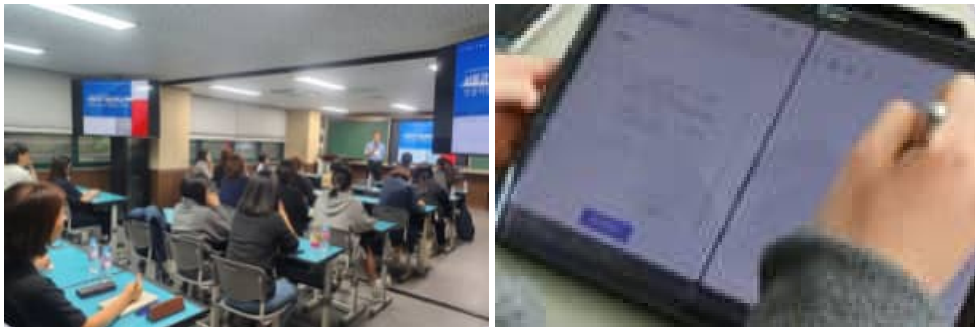

[그림 184] 전자칠판, 크롬북 연계 활용

14) 'Digital'과 '벗'의 줄임말로, 서울특별시교육청에서 온라인 학습 플랫폼과 교육용 스마트기기를 무상으로 지원하는 정책

2022년 조성 | ○○교육청 하늬고등학교 공립 여고

주제: 앞 뒤 안가리는 교실

» 종류: (교실) 전면 일반칠판, 후면 전자칠판

① 기자재 소개

- 교실 전면 전통적 칠판과 TV
- 교실 후면 전자칠판 설치

② 기자재 활용 사례

- 교사의 수업 방식 및 활용 기자재에 따라 교실 전면에서 수업 또는 후면에서 수업
- 매 교시 교사의 수업 방식에 따라 학생들은 책상을 전면 또는 후면으로 돌려 수업 준비

③ 기자재 활용 사진



교실 후면(전자칠판) 수업



교실 전면(칠판+TV) 수업

[그림 185] 전·후면 칠판 활용

2023년 조성 | ●●교육청 꽃내음고등학교 공립 여고

주제: 다른 공간에서 시간은 같이한다.

» 종류: (교실) 초단초점 빔프로젝터, 범람 칠판, 파워드 스피커, 'A' TV 설치


① 기자재 소개

- 초단초점 빔프로젝터, 범람 칠판, 파워드 스피커 설치
- 'A' TV 설치
- 기존에 일반 교실 28실에 실시간 스트리밍 구성
- 기존의 PTZ 카메라, 천정형 마이크, 비디오 스트리밍 장비, 노트북과 상호작용

② 기자재 활용 사례

- 감염성 질병이나 학생의 수업 결손이 생겼을 때 실시간 온라인 강의로 결손 최소화
- 학생들이 사용하는 기기의 미러링 기능을 사용하여 자유롭게 발표
- 수업이나 학급 활동에서의 활용

③ 기자재 활용 사진

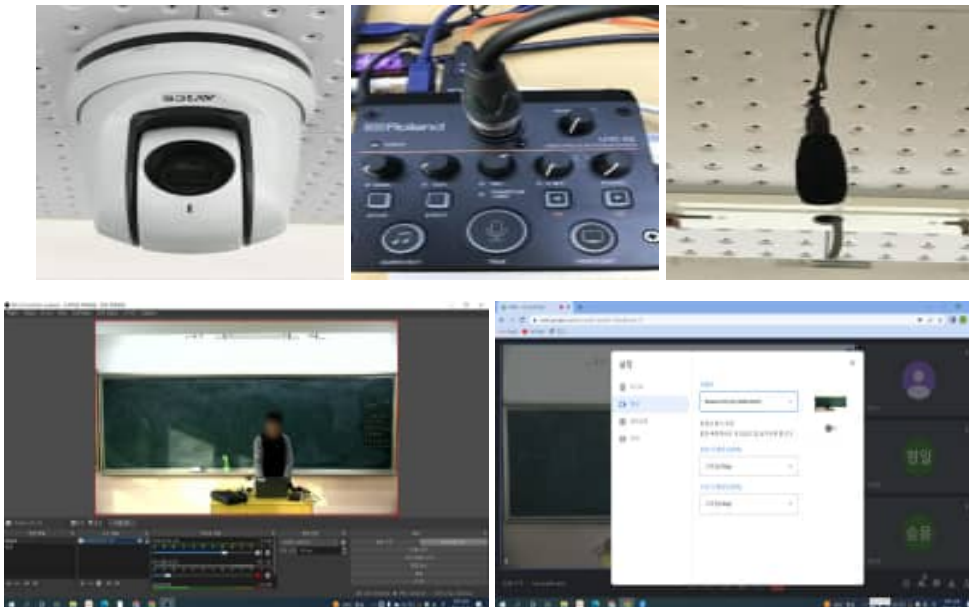

[그림 186] 실시간 스트리밍 수업

2023년 조성 | ●●교육청 송골송골고등학교 공립 여고
주제: 우리가 만드는 새로운 교육

» 종류: (스튜디오) 노트북, 촬영 스튜디오 장비

① 기자재 소개

- 40대의 노트북
- 누구나 활용하고 사용할 수 있는 영상 촬영 스튜디오

② 기자재 활용 사례

- 영상 촬영을 활용한 수행평가 활동에서 학생들이 스튜디오를 사용해 다양한 영상 촬영
- 방송부 동아리 학생들의 영상 촬영 지원
- 노트북을 활용한 다양한 형태의 수업 지원

③ 기자재 활용 사진



[그림 187] 노트북, 스튜디오 장비 활용

2023년 조성 | ○○교육청 안다미로고등학교 공립 여고
주제: 학습 자료를 자유자재로 구현하는 교수-학습 활동

» 종류: (스튜디오) 전자칠판

① 기자재 소개

- 86인치 전자칠판
- 화면 터치 및 전자 필기구로 직접적 내용 전달 가능
- 미러링, 인터넷 연결 등으로 다양한 매체를 활용한 멀티 수업 구현

② 기자재 활용 사례

- 전자칠판으로 교과 설명에 대한 집중도 높임.
- 전자책을 활용하여 수업에 몰입도를 높임.
- 다양한 영상자료를 시청하기 편리함.
- 전자칠판에 직접 판서할 수 있어 시청각 자료 활용이 용이함.

③ 기자재 활용 사진



최소 학업 성취 수준 미도달 예방 지도



ESG 경영과 지속가능한발전



교육과정 박람회 선택과목 안내

[그림 188] 전자칠판 활용

2023년 조성 | ○○교육청 쏘로니고등학교 사립 공학
주제: 뜨거운 열정에 균형을 주는 제빙기와 조명기기

» 종류: (하루·도란도란) 빌트인 제빙기, 스튜디오 조명

① 기자재 소개

- 제빙기: 하루와 도란도란에 각각 설치된 업소용 대형 제빙기는 주방가구에 빌트인된 형태로 학생과 교직원의 편의를 돕는 필수 장비입니다. 특히, 활동량이 많은 학생에게 얼음은 단순한 음료 보조재를 넘어 중요한 생활 아이템으로 자리 잡았습니다.
- 스튜디오 조명: 메타버스실에 설치된 300W 조명 4개는 실내 촬영을 위한 필수 기자재로, 풍부한 광량과 조명 연출로 콘텐츠 제작 시 영상 질을 한 단계 높여줍니다.

② 기자재 활용 사례

- 제빙기
 - 일상적인 음료 제공: 무더운 여름철 학생들의 음료와 간식을 위한 필수 장비로 활용되며, 공간 시간이나 방과 후 공부를 하는 학생들에게 청량감을 제공.
 - 특별 행사 활용: '쏘로니 카페쇼'와 같은 행사에서 음료 제조에 사용되며, 학생들이 직접 음료를 준비하며 다양한 경험을 쌓을 수 있는 도구로 활용.
 - 과학실험 보조 도구: 실험 활동에서 온도 조절이나 냉각이 필요한 경우 실습에 유용하게 사용되어 창의적 학습 활동을 지원.
- 스튜디오 조명
 - 콘텐츠 제작: 메타버스실에서 다양한 콘텐츠 촬영 시 풍부한 조명을 제공하여 영상의 품질을 극대화.
 - 학생 프로젝트 지원: 영상 제작 및 사진 촬영 프로젝트에 활용되어 학생들이 전문적인 결과물을 제작할 수 있도록 도움.
 - 행사와 발표 촬영: 발표 영상 제작, 학생회 활동 기록 등 중요한 순간을 기록하고 공유하는 데 활용.
- 제빙기와 스튜디오 조명은 각각의 공간에서 단순한 도구를 넘어 다양한 방식으로 활용되어 학생과 교직원의 활동에 큰 도움을 주고 있습니다.

2023년 조성 | ▶▶ 교육청 새빛고등학교 공립 공학
주제: 모든 소식은 중앙현관 이곳에서

» 종류: (중앙현관) LED TV

① 기자재 소개

- 98" UHD 사이니지, 'ㅇ' LED TV, 2,191.8×1,246.8×83.8, 밝기:500Nit 1대
- 75" UHD 사이니지, 'ㅇ' LED TV, 1682.4×960.3×57.9, 밝기:500Nit 1대
- 43" UHD 사이니지, 'ㅇ' LED TV, 962.5×568.0×39.9, 밝기:500Nit 2대

② 기자재 활용 사례

- 학사일정 안내
- 진로특강 등 행사 안내
- 시험 유의 사항등 공지사항 안내
- 체육대회 대진표 등 대회 관련 사진 및 동영상 재생

③ 기자재 활용 사진



주간클래스 홍보

개학일 취임식 및 입학식 안내



진학특강 신청 안내

체육대회 대진표 및 설명회 장소 안내

[그림 189] 사이니지 활용

3. 용어 해설

㉠	
감리	⇒ 사후 설계관리
계획설계	기획설계에서 결정된 내용을 도면화하는 과정으로 사용자 요구 사항 반영 및 시공 도면 작성에 필요한 중요사항을 결정하기 위해 의뢰인과의 대화와 협의를 통해 건축, 구조, 재료, 설비, 색상 등 총체적인 디자인 결정
고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 원리	기존 고교학점제 학교 공간 조성 원리는 ‘학습 공간의 유연성’, ‘지원 공간의 복합성’, ‘공용 공간의 활용성’, ‘동선의 효율화’의 4가지로 제시됨. ‘공간과 교육과정 간의 연계성’을 추가한 5가지의 원리들은 학점제 교육과정의 특성을 반영하고, 학점제 학교 공간 조성의 근간이 됨
공간 재구조화	고교학점제 학교 공간 조성 원리를 토대로 다양한 교수학습이 가능한 공간을 조성하기 위해 학교 전체 교실을 재배치하는 것
공정표	[계획 및 설계] 각 공사의 착공부터 완성까지의 일정. 작업량 등 시공 계획을 미리 예정하여 표시한 관리 도표 서식. 건설공사를 실시할 때 대상 건물을 기간 내에 완성시키기 위해서 실시하는 것을 공정관리라고 함
공종	공사의 종류로, 철골공사, 철근콘크리트공사, 조적공사, 미장공사, 도장공사, 타일공사, 수장공사, 석공사, 방수공사 등
교과교실제	교과마다 특성화된 전용 교실을 갖추고, 학생들이 수업 시간에 교과교실로 이동하여 선택한 수업을 하는 학교 운영 방식. 교과와 전문성 심화, 학생 수준에 맞는 수업 선택 가능, 능동적 수업 참여, 유연한 조직 편성 등의 기대 효과가 나타남
기획업무	디자인을 위한 기본적인 정보를 확인할 수 있는 도면을 작성하는 과정으로 이 과정은 공간 조성 방향 설정에 중요한 과정
㉡	
대수선	건축물의 주요 구조부에 대한 수선 또는 변경으로 대통령령으로 정하는 것으로 수선이란 낡은 것을 원상태로 고친다는 뜻이며, 대수선은 구조의 안전상, 형태상 변화를 가져올 수 있는 정도의 수선으로 증축 또는 개축에 해당하지 않는 것

㉠	
사용자 참여 설계	구축하고자 하는 공간에 대해 학교 사용자(학생, 학부모, 교사 등)가 주도적으로 참여하여 조성 희망 공간에 대한 아이디어와 요구 사항을 건축 디자인에 반영하는 설계 진행 과정
사용자 참여 수업	교육과정과 연계된 학습활동으로 학생들이 중심이 되어 학교 공간을 바꾸는 것을 의미, 학생의 의사와 선택권을 중시하고, 학생들이 주도적으로 참여하여 '공간 주권'을 실천하는 프로젝트 수업
사용자 협의회	상황에 따라 학교 공간의 사용자인 학생, 학부모, 교사 등이 협의회를 구성하여 다양한 교육공동체의 의견 수렴(학생 협의회, 학부모 협의회, 교사 협의회 등)
사전기획	초·중등교육법 제2조에 따른 학교의 교육시설을 건축하거나 리모델링하는 사업으로서 그 설계비 추정 가격이 1억 원 이상인 사업인 교육 시설 사업을 대상으로 교육시설의 설계 전에 교육과정 운영 및 교수·학습 방법에 따른 공간구성, 교육시설과 지역사회 연계에 관한 사항, 사업의 규모, 내용 및 사업비 등 사업의 추진에 관한 사항, 사용자 참여를 통한 디자인 계획 및 안전에 관한 사항, 발주 방식에 관한 사항, 에너지 효율화 등 지속가능성 제고 방안 등에 관한 사전 전략 수립 등을 하는 것(「교육시설의 사전기획 등 업무수행지침」(2023.4.21.) 참고.)
사후 설계관리 (감리)	건축설계가 완료된 후 시공 과정에서의 설계감리 [계획 및 설계] 감독과 관리의 준말이며, 건물 설계와 시공 내용이 법령이나 규정에 따라 잘 하는지, 공사나 안전 혹은 품질 등에 대해 감독하고 지도하는 것 [재료 및 시공] 발주자의 위임을 받아 공사가 진행되는 단계에서 공사 계약의 체결에 협력하여 설계 의도를 적절하게 실현시켜, 공사가 설계 도서에 합치하는지를 확인하는 업무
시공 단계	고교학점제 학교 공간 조성 사업의 대상 공간에 대한 실시설계에 따라 시공회사가 결정되어 공사를 진행하는 단계로 시·도교육청의 사업 추진 절차에 따라 시공회사에 대한 입찰·계약 등을 교육지원청 또는 단위 학교(사립의 경우 학교에서 진행)에서 진행
실시설계	이미 이루어진 기본설계 후에 건축물을 정확히 시공하기 위해 모든 건축 요소를 결정하여 도면으로 작성하는 과정으로 구조, 설비, 냉난방, 배관, 방화계획도면에 반영하고, 공사비 산출에 필요한 내역서가 산출되며, 도면에 표현하기 어려운 내용은 시방서 등 관계 도서를 작성하는 업무
㉡	
인사이트 투어 (insight tour)	공간 기획 단계에서 영감을 얻고, 다양한 아이디어를 창출하기 위해 선도 학교를 돌아보며 배우는 것. 공간을 그대로 복제하거나 모방하는 것이 아니라 선도 학교가 조성한 공간들의 장단점을 비교 분석하고 필요한 부분만을 선별하여 한층 더 개선된 최적의 학교 공간으로 구성

㉠	
자가진단도구	학교 현황 파악을 돕기 위해 구안. 각 학교의 상황을 자가 진단하여 학교 공간 조성 방안 도출
준공 검사	[재료 및 시공] ① 건물의 완성 후 감독자가 건물을 검사할 때 손질·조작과 기능·능력 등을 검사하는 것. ② 중간검사. ③ 신고를 접수한 날로부터 7일 이내에 실시하고 검사필증을 교부해야 함(시장·군수). 7일 이내에 건축주가 신고해야 하고, 준공 검사필증은 당해 건축물 내에 항상 비치함(출처:건축용어사전)
중간설계	계획설계를 더욱 심화하는 과정으로 계획도면을 구체화하여 구조계획과 설비계획 등의 치수를 정확히 결정하고 표현
증축	기존 건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축 면적, 연면적 또는 높이를 증가시키는 것으로서 기존 건축물에 붙여서 건축하는 것뿐만 아니라 별동으로 건축하는 것 모두 증축에 포함
㉡	
컨설팅 (consulting)	컨설턴트의 전문적 시각에서 의견을 반영하기 위한 학교 밖 지원. 교육 및 건축 분야 전문가의 컨설팅을 통해 학교 상황에 따른 과제를 분석하고 공통의 탐구 과정을 통해 해결 방안 모색. 학교의 실정과 특성에 적합한 학점제형 공간 조성을 통해 교육 공동체의 학교 교육 만족도 제고에 기여
II	
퍼실리테이터 (facilitator)	건축가나 학교분야 전문가가 고교학점제 공간 조성 사업의 원활한 진행을 돕는 조력자로 사용자 참여 설계 추진 과정에서 사용자 참여 수업, 기본계획안 작성 후 디자인 워크숍 진행, 실시설계와 감리단계에서 자문 및 지원하는 역할이며 시도교육청 및 단위 학교 상황에 따라 위촉 여부가 달라짐. 시도교육청 및 학교 상황과 여건에 따라 위촉과 비위촉 결정
III	
학교 공간 조성 TFT (Task Force Team)	고교학점제 대비 학교 공간 조성 추진을 위한 실질적 협의 기구 구성. 유관 업무 담당자 참여 및 다양한 구성원들의 의견이 반영될 수 있도록 구성
학점제형 공간	학습 공간, 지원 공간, 공용 공간, 이동 동선, 교육 과정 등을 고려하여 조성. 다양한 형태의 교과 수업이 가능하고, 에듀테크 기술을 활용한 다양한 교수학습 공간 구축. 다양한 수업 및 학생 자율활동이 가능한 지원 공간 조성. 공강 및 쉬는 시간에 휴식과 자율활동 등이 가능한 공용 공간의 활용성 제고, 선택과목 확대에 따른 학생 이동 동선 최소화를 위한 사용자 입장에서 공간 배치

4. 자료 안내

가. 안내서

고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서(2024.02.)



- 에듀넷 홈페이지(www.edunet.net) > 교육정책 > 고교학점제 > 자료실
- 내용
 - 고교학점제 학교 공간 조성 사업 개요 및 방향
 - 고교학점제 학교 공간 조성 사업 담당자의 시기별 역할
 - 학점제형 공간 조성의 단계별 운영 가이드
- 부록




[그림 190] 안내서 다운로드 방법

- ① 에듀넷 홈페이지 접속(www.edunet.net)
- ② 상단 메뉴의 '교육정책' 클릭
- ③ 상단 하위 메뉴의 '고교학점제' 클릭
- ④ 왼쪽 세부 메뉴의 '자료실' 클릭
- ⑤ '고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서[2024]' 게시물 클릭
- ⑥ 게시물 하단의 '첨부파일' 클릭하여 다운로드

나. 학교 공간 조성 사진 자료 찾아가기

- 에듀넷 홈페이지 (<https://www.edunet.net>)
 - 교육정책 > 고교학점제 > 정책 안내 > 학교 공간 조성·활용
 - 바로가기: <https://www.edunet.net/schlSpaceUtlz/list/109>
- 사진은 고교학점제 학교 공간 활용 조사를 통해 제공받음

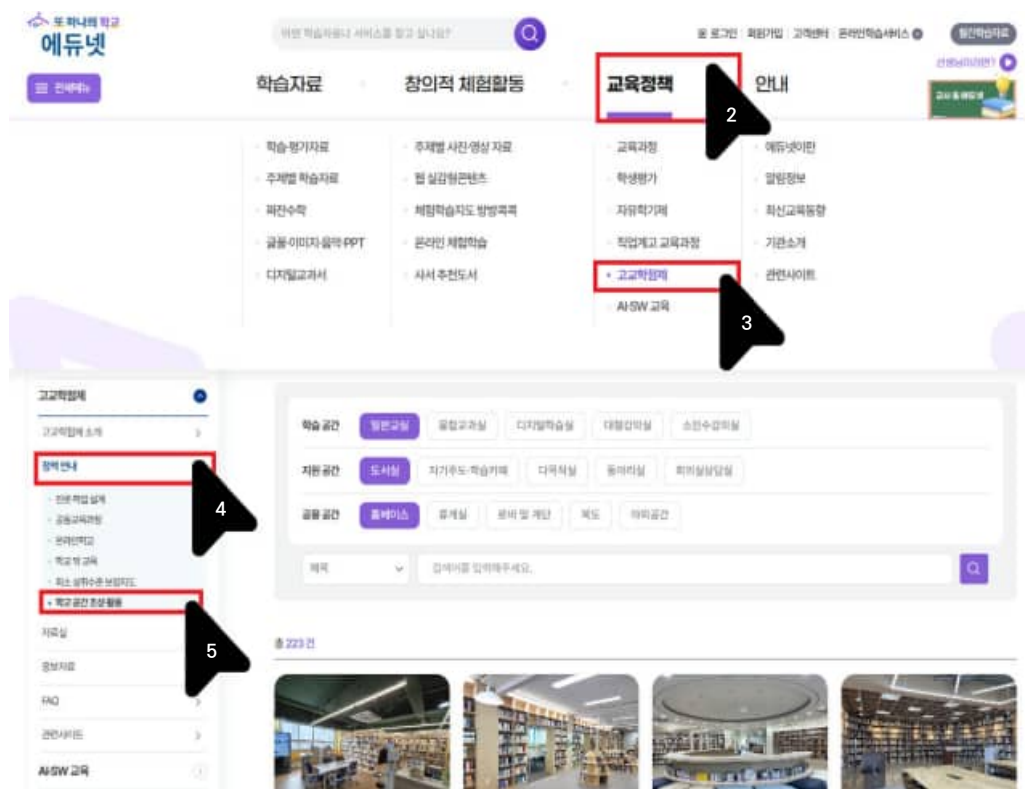

[그림 191] 학교 공간 조성 사진 자료 접속 방법

- ① 에듀넷 홈페이지 접속(www.edunet.net)
- ② 상단 메뉴의 '교육정책' 클릭
- ③ 상단 하위 메뉴의 '고교학점제' 클릭
- ④ 왼쪽 세부 메뉴의 '정책 안내' 클릭
- ⑤ 왼쪽 세부 하위 메뉴의 '학교 공간 조성·활용' 클릭



사업협력관

신진걸(교육부)

검토진

권영(㈜다보건축사무소)

김경탁(광주경신여자고등학교)

이정호(대전성모여자고등학교)

사업협력진

이범수, 박주희(서울특별시교육청)

김동진(부산광역시교육청)

이정희, 이수예(대구광역시교육청)

이수진, 현규진(인천광역시교육청)

김재희(광주광역시교육청)

최명희, 이응룡(대전광역시교육청)

장성종(울산광역시교육청)

조찬준, 김응겸(경기도교육청)

조영남(강원특별자치도교육청)

임현진(충청북도교육청)

신은지(충청남도교육청)

강영기, 이남훈(전북특별자치도교육청)

최미랑, 김현희(전라남도교육청)

손기화(경상북도교육청)

장소영(경상남도교육청)

양철휴(제주특별자치도교육청)

수탁연구자료 CRM 2025-11

고교학점제 학교 공간 조성 및 활용 안내서

발 행 일 2025년 2월

발 행 인 고 영 선

발 행 처 한국교육개발원

주 소 (27873) 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 7(한국교육개발원)

전 화 (043) 530-9114

F A X (043) 530-9819

홈 페이지 <https://www.kedi.re.kr>

등 록 번 호 1973. 6. 13. 제16-35호

인 쇄 처 디자인펌킨 (031) 893-8315

※ 본 내용의 무단 복제를 금함. <비매품>

2025
고교학점제 학교 공간
구성 및 활용 안내서
